

	EPUXUA	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
	Página: 1 de 1		

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000315

Nit: 901511522-4

jueves, 24 de abril de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000154	24-abr.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S.A. E.S.P.	CC o NIT	860063875	DV	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	TELEFONO	6015147000		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	6	VALOR PAGO	1,513,461,621.00		
DESCRIPCION					

FVE-037436 C-147-2024 CI-3071-2024 PERIODO NOVIEMBRE 15 A DICIEMBRE 06 DE 2024 PAGO 01 AVANCE 45% PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA CALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.

SON UN MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100651		CTA- 9821 CI-3071 DE 2024 GERENCIA INTEGRAL ALUMBRADO NAVIDEÑO	00.00	1,513,461,621.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	255,572,775.00	00.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	1,257,888,846.00	00.00			
SUMAS IGUALES			1,513,461,621.00	1,513,461,621.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000155	2025000138	2.4.5.02.08.010.004	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 004-Disponibilidad Inicial Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	255,572,775.00
2025000155	2025000138	2.4.5.02.08.010.004	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 004-Disponibilidad Inicial Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	1,345,119,870.00

TOTAL PRESUPUESTO 1,600,692,645.00

Elaboró: Adriana	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
HUGO ARMANDO CASTRO RINCON CONTADOR	 TESORERO	c.c ó Nit



EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO

COM-2025000154

FECHA

31 de marzo de 2025

NUMERO FACTURA FEV-37436 FECHA FACTURA 10 de marzo de 2025

NOMBRE ENEL COLOMBIA S.A E.S.P
NIT 860.063.875
PROVEEDOR ENEL COLOMBIA S.A E.S.P
ORDEN DE COMPRA FVE-037436 C-147-2024 PERIODO NOVIEMBRE 15 A DICIEMBRE 06 2024 PAGO 01 AVANCE 45% PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA - CUNDINAMARCA, EN MARCO DEL CI-3071 - 2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
FECHA INICIO 15 de noviembre de 2024
CONCEPTO CONTRATO No. CD-147-2024
CDP 2025000155 RP 2025000138

PAGO DE FC-FVE-037436 C-147-2024 PAGO 01 AVANCE 45%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
FC-FVE-037436 C-147-2024 PAGO 01 AVANCE 45%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN	1	1.345.119.870,00		
IVA	19%	255.572.775,00		
RETEIVA	0%		0,00	
RETEFUENTE	0,0%		0,00	
RETE ICA	0,0%		0,00	
Estampilla Pro Cultura (1,7%)	1,7%		22.867.038,00	
Estampilla Bienestar Adulto Mayor (3%)	3,00%		40.353.596,00	
TASA PRO DEPORTE (1,5%)	1,50%		24.010.390,00	
TOTAL		\$ 1.600.692.645,00	\$ 87.231.024,00	\$ 1.513.461.621,00

OBSERVACIONES:

Nota: La empresa según lo informado es:
Responsable de IVA
Actividad Economica 3514 - 3511 - 3513 - 4661

Contabilizó:
Luis Peñaloza Cuervo
Aux. Contable

Revisó:
Hugo Castro
Contador

	EPUXUA	Código: COM-2025000154	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000154

Nit: 901511522-4

lunes, 31 de marzo de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Enel Colombia S A E S P	CC o NIT	860063875	DV	8
DIRECCION	CALLE 93 13 45 PISO 1	TEL	6015147000		
DESCRIPCION	FVE-037436 C-147-2024 CI-3071-2024 PERIODO NOVIEMBRE 15 A DICIEMBRE 06 DE 2024 PAGO 01 AVANCE 45% PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA CALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
29020147	CI -3071 DE 2024 GERENCIA INTEGRAL ALUMBRADO NAVIDEÑO	1,345,119,870.00	00.00
29020147	CI -3071 DE 2024 GERENCIA INTEGRAL ALUMBRADO NAVIDEÑO	255,572,775.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	1,513,461,621.00
24072201	Estampilla pro cultura 1.7%	00.00	22,867,038.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	40,353,596.00
24072205	Tasa Prodeporte Soacha 1.5%	00.00	24,010,390.00
SUMAS IGUALES		1,600,692,645.00	1,600,692,645.00
Documento	37436	Valor a Girar	1,513,461,621.00


3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000155	2025000138	2.4.5.02.08.010.004	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 004-Disponibilidad Inicial Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	255,572,775.00
2025000155	2025000138	2.4.5.02.08.010.004	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 004-Disponibilidad Inicial Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	1,345,119,870.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,600,692,645.00
-------------------	------------------



HUGO CASTRO
CONTADOR


LUIS
Elaboró

Modificó



DAVIVIENDA

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO NO 01-CTO 147-2024- ENEL COLOMBIA SA-FACT FVE00037436-PER 15 NOV-06 DIC 2024-ALUMBRADO NAVIDEÑO	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	51273916		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300359821		
Fecha de Creacion	21/04/2025	Fecha de Pago	22/04/2025 15:56
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.513.461.621,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.513.461.621,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
860063875	0000000860063875	Ahorros	90060000410	GNB SUDAMERIS	\$ 1.513.461.621,00	Pago Exitoso	



DAVIVIENDA

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago									
Nombre Proceso de Pago		PAGO NO 01-CTO 147-2024-ENEL COLOMBIA SA-FACT FVE00037436- PER 15 NOV-06 DIC 2024-ALUMBRADO NAVIDENO Estado Proceso Pagado Parcial							
N° Proceso de Pago		51150450							
Origen de los Fondos		TRADICIONAL - 550002300359821							
Fecha de Creacion		03/04/2025		Fecha de Pago		08/04/2025		17:16	
Total de Registros		2		Monto Total		\$ 1.600.692.645,00			
Registros Ingresados		2		Monto Ingresado		\$ 1.600.692.645,00			
Detalle de Pagos									
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo		
9015115224	0562023901489780	Ahorros	550002300312895	DAVIVIENDA	\$ 87.231.024,00	Pago Exitoso			
860063875	0000000860063875	Ahorros	900600000410	GNB SUDAMERIS	\$ 1.513.461.621,00	Pago Rechazado	Cuenta no Habilitada 00020		

CT- 3071-2024

1
COM-2025000154



ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No 13 - 45 Piso 1 BOGOTÁ
Teléfono (601) 580 1000

FACTURA
ELECTRONICA
DE VENTA

Número	FVE00037436
Cliente	2000581102
Documento FI	1125001050
Fecha/hora Generación	10.03.2025 17:53:57
Fecha/hora Expedición	10.03.2025 11:58:13
Fecha Vencm.	09.04.2025
Número Interno	0008726809
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Transferencia
Página	1 de 2



CUFE: 8ca393ca737a465fdf192b1ea6524450230b561c33438707d2cfacbfd5f2a9d19af2d73c81ee9a4b6ae7f5d6ce7ee0b7

CLIENTE	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE	NIT	901.511.522 - 4
DIRECCIÓN	CALLE 12 No.8A-36	CIUDAD	SOACHA
TELEFONO	60 3112576723		
EMAIL	contabilidad@epuxua.gov.co	GESTOR	

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
71314000-2	ALUMBRADO NAVIDEÑO DISEÑO, MONTAJE Y ENCENDIDO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2024 EN SOACHA - CUNDINAMARCA	1,00	19,00	1.345.119.870,00	1.345.119.870,00

Número de Items: 1

SON: UN MIL MILLONES SEISCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL	1.345.119.870,00
	IVA GENERADO	255.572.775,00
	VALOR NETO	1.600.692.645,00
	PAGO ANTICIPO	0,00
	TOTAL A PAGAR	1.600.692.645,00
	SALDO CLIENTE	0,00

OBSERVACIONES:

EL COMPRADOR: Acepto expresamente el contenido de la presente Factura electrónica de venta, obligándonos a su pago en la forma y fechas aquí pactadas. En consecuencia de todo lo anterior, recibo la presente Factura electrónica de venta.


Firma:
Nombre: EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
Identificación: 90151522
Fecha de recibo:

EL VENDEDOR



ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 860.063.875-8
LA FIRMA SE SUSTITUYE POR EL PRESENTE SIGNO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 621 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Facturación Electrónica Resolución DIAN No. 18764089582149 del 2025-02-27, autorización facturas Nos. FVE 37373 a la 100000



(415)7707209914260(8020)00087268092000581102(3900)1600692645

Número	FVE00037436
Documento FI	1125001050
Cliente	2000581102
NIT	901.511.522 - 4
Número Interno	0008726809
Fecha Vencm.	09.04.2025
TOTAL	1.600.692.645,00

CTa 51112

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. ES PARTE DEL GRUPO ENEL - ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8 ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

CLIENTE
BANCO

BRINDAMOS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PARA TU EMPRESA.

Contamos con un amplio portafolio de productos y servicios con la energía para el crecimiento de tu negocio:



OBRAS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS

- Independizaciones, instalación de redes y aumentos de carga.
- Mantenimientos de infraestructura eléctrica.
- Fibra óptica y cableado estructurado.
- Equipos de respaldo.



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

- Sistemas fotovoltaicos con o sin batería de almacenamiento.



DEMANDA DESCONECTABLE VOLUNTARIA

- Representamos a tu empresa en el mercado mayorista, para que vendas tu energía disponible al generador que la necesite.



SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA (UPS)



GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA (CUSTOMER INSIGHTS)

- Utility Bill Management.
- Energy Management.
- Energy Consulting.


Para conocer nuestro portafolio de productos y servicios, llama al **601 580 1000** ó ingresa a la página **www.enelx.com.co**
Si tienes alguna inquietud con respecto a tu factura de productos y servicios, comunícate con tu gerente de cuenta.

Enel X, línea de negocios Enel.
www.enelx.com/co

Pagar tu factura ahora es más fácil, solo debes:

1. Ingresar a www.enel.com.co
2. Hacer clic en Empresas
3. Acceder a Enel Distribución
4. Ingresar a Botón de Pago

Paga fácilmente presentando tu factura con código de barras en el Banco de Bogotá.



enel x



enel x



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

INFORME DE ACTIVIDADES



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	147-2024	CDP RP	DIS-2025000155 RES-2025000138	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 3.557.094.768				
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENEL COLOMBIA				IDENTIFICACIÓN: 860.063.875-8					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado							
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDENO EN SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA				FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO			
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
				15	11	2024	30	01	2025
SUBGERENCIA	NO APLICA		Centro de Costo (área)			NO APLICA			
VALOR ADICIONES	NO APLICA		N° CDP -FECHA			NO APLICA			
PRORROGAS	I		FECHA			30/01/2025			
MODIFICACIONES:	NO APLICA		FECHA			NO APLICA			

INFORMACIÓN SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	Luis Camilo Torres Hernandez	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	Luis Camilo Torres Hernandez
CARGO	Subgerente Técnico	CARGO	Subgerente Técnico
CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de prestación de servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones y/o actividades contratadas y estipuladas en el objeto de contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.			

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	\$ 1.600.692.645	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	\$0.0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (15/11/2024)	CUENTA DE COBRO No.	1 de 3
	HASTA (6/12/2024) /	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	11/03/2025

ANEXO: FACTURA, COMPROBANTE DE AFILIACIONES SALUD, PENSIÓN, ARL, 0. Parafiscales febrero 2025 Firmada, 0.1. antecedentes Andrea Rodríguez Mur., 3.2. CC Andrea Rodríguez Mur, 0.3. TP Andrea Rodríguez Mur, 2. FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES NAV C1_CM, 4. FORMATO

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. INFORME DE ACTIVIDADES	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
---	---	--

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO NAV C1, 10. D4P - CO10 Banco Gnb Sudameris Cta. 410, 13. RUT ENEL COLOMBIA SA ESP, 14. Certificado_860063875-RIT-SOACHA, 14.1 Certificado_860063875-RIT, 16. FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL CONTRATO NAV C1, 24. ACTA DE INICIO - CONTRATO 147 - 2024, A. INFORME DE GESTION NOV-DIC NAVIDAD, 25. PARAFISCALES ANDRÉS TRIVIÑO, 26. PARAFISCALES CHRISTIAN CAMILO CUINTACO BARBOSA, 27. PARAFISCALES FREDY ALFONSO CASTRO CASTILLO, 28. PARAFISCALES FREDY QUIJANO, 29. PARAFISCALES GABRIEL ARBOLEDA PINZON, 30. PARAFISCALES GARCES VARGAS GUSTAVO WILSON, 31. PARAFISCALES JHEISON FERNANDO CASTILLO PARDO, 32. PARAFISCALES JOSE FERNANDO CIFUENTEZ PEREZ, 33. PARAFISCALES ROJAS SERRANO DIEGO ANDRES			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	\$ 1.600.692.645 ✓	SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.956.402.123 ✓


Observaciones:

INFORME DE ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Cumplir a cabalidad con el Anexo N°1 Anexo de condiciones técnicas, con las actividades contratadas en su cantidad y calidad acorde a la normatividad vigente incluyendo RETIE y RETILAP	Se ejecutaron las actividades de acuerdo con lo contractualmente pactado y de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo N°1, en cuando a cantidades y sectores definidos, detalle de la ejecución presentada en el desarrollo del presente Informe.
2. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al personal contratado para la ejecución integral del proyecto por causa o con ocasión del desarrollo del proyecto	A la fecha no se tienen reportes de daños o afectaciones a terceros
3. Adelantar bajo su autonomía y responsabilidad, todas las gestiones técnicas, administrativas, ambientales, contractuales y financieras necesarias para la gestión del proyecto	Cuando aplique se cumplirá con esto
4. Entregar los productos requeridos (Presentación presupuesto, cronogramas, plan de intervenciones, informes de seguimiento y control y demás requeridos)	Se entrego el cronograma al inicio de ejecución, se fueron realizando los reportes de avances de ejecución en línea y se retroalimentaba diariamente de los sitios y trabajos en los cuales se estaría realizando la ejecución.
5. Garantizar la realización de las intervenciones (Incluyendo los bienes y servicios que se requieran)	Se ejecutaron cada uno de los sitios declarados en el contrato garantizando el cuidado de estos.
6. Presentar los informes de gestión que requiera el supervisor del contrato de acuerdo a las directrices dadas por el mismo	Se adjunta informe de gestión del mes de Noviembre y diciembre adjunto a este documento.
7. Realizar la instalación, montaje, puesta en funcionamiento y desmonte de los elementos descritos en la ficha técnica en los sitios determinados, garantizando el personal suficiente que cumpla con las normas de seguridad industrial pertinentes y que conforme a la normativa vigente y a los requerimientos del contrato sean necesarios para la prestación del servicio, tales como: cascos, botas de seguridad, uniformes, guantes, amarres, carnets de identificación de uso visible, certificación vigente de trabajo en alturas, y demás	Se realizo todo el montaje como se detalla en el informe de gestión en los tiempos pactados, cumpliendo los procedimientos internos de Enel en términos de seguridad, Calidad y cuidado del medio ambiente
8. Garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas, del aporte a la seguridad social integral, de acuerdo con todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad Social Integral y Parafiscales y de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así mismo lo correspondiente a la seguridad industrial y salud	Se anexa el soporte de los pagos parafiscales del personal responsable de la ejecución del proyecto.

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES	

ocupacional, la reglamentación técnica para la industria de la construcción y el cumplimiento de los requerimientos ambientales, legales y contractuales vigentes	
9. Presentar los respectivos balances financieros y los informes de la ejecución del contrato cuando sea requerido por el supervisor, en el marco del plan o forma de pago establecido	Se adjunta documento en Excel con cantidades y costos de la instalación
10. Llevar un archivo periódico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del contrato y entregarlo al final del plazo contractual	Se realizaron los reportes de avance de ejecución de los diferentes sitios durante el mes de ejecución a los ingenieros de Epuxua a través de los canales acordados con el porcentaje de avance de los sitios.
11. En el transcurso de la ejecución el contratista se obliga a mantener operativamente el servicio del alumbrado navideño y cuidado de los bienes instalados para el alumbrado, además de la vigilancia para el show lumínico salto del Tequendama	Actualmente se cuenta con el recurso necesario para realizar los mantenimientos y atención de fallas presentadas durante la vigencia del funcionamiento y se cuenta con el personal necesario para el funcionamiento del show y la vigilancia de equipos.
12. Presentar un informe detallado y organizado de la ejecución del contrato, que contenga registro fotográfico y audiovisual en medio magnético del show salto del Tequendama, donde se soporte y evidencie el cumplimiento de cada uno de los ítems descritos en la ficha técnica, así como de las obligaciones contractuales	Se anexa informe de ejecución con el detalle de actividades, registro fotográfico y cantidades instaladas.
13. El componente social debe comprender la socialización, comunicación del proyecto a través de medios digitales y físicos con la finalidad de informar a la comunidad del municipio y a potenciales turistas del municipio. (Este componente no tendrá costo alguno en la ejecución del contrato)	No aplica
14. Proporcionar un plan de contingencias en caso de situaciones imprevistas	Cuando aplique se cumplirá con esto
15. Definir los procedimientos a ejecutar de conformidad con el cronograma de actividades, que será acorde a la priorización de los sectores que se establezca	Se presentó el plan de trabajo y se ejecutó en función de los compromisos a entregar donde se garantizaron los recursos los cuales llevaron al cumplimiento de las metas y superando las expectativas planteadas como se evidencia en el informe.
16. Establecer y realizar los trámites que se requieran a fin de obtener los permisos a que haya lugar para la intervención de la infraestructura de alumbrado existente en el Municipio de Soacha en coordinación con la Empresa Pública de Soacha y Alcaldía Municipal. Es única y exclusivamente responsabilidad del contratista la obtención de permisos, por tal motivo se compromete que mantendrá indemne a EPUXUA AVANZA E.I.C.E y al Municipio de Soacha, de cualquier afectación que se pueda generar por las actividades que realice en los sectores objeto de intervención	Se realizaron los trámites donde se necesitó para la ejecución de los trabajos que ya fueron realizados.
17. Contar con el personal mínimo requerido, que acredite la idoneidad y competencia para desarrollar adecuadamente el objeto contractual, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico	Al inicio del contrato se realizó la entrega de las hojas de vida que soportaban la experiencia del personal que ejecutaría los trabajos.
18. Garantizar la calidad y durabilidad de los materiales suministrados en la ejecución contractual.	Se garantiza esto, y en el caso de una falla y que no se pueda normalizar Enel, procederá a realizar el cambio de este para garantizar el funcionamiento, hasta el momento no se ha requerido algún cambio.
19. Realizar todas las pruebas y ensayos necesarios que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura de alumbrado navideño en el Municipio	Estas se realizaron el día 5 de diciembre previo al encendido y el cual se deja evidencia en el informe.

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. INFORME DE ACTIVIDADES	
---	---	---

20. Efectuar reparaciones o desmonte de los diferentes componentes para su inspección o mantenimiento cuando se requiera	Durante el periodo de funcionamiento de la navidad se realizó recorridos de nuestra parte para verificar el correcto funcionamiento y se contó con el recurso para realizar las correcciones de las fallas encontradas.
21. Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para la ejecución contractual en los lugares que corresponda	Cuando aplique se cumplirá con esto
22. Presentar ficha técnica con los costos ejecutados	Se adjunta documento en Excel con cantidades y costos de la instalación
23. Entregar al supervisor del contrato la paz y salvo de los proveedores en los cuales se evidencie la evolución del proyecto	Cuando aplique se cumplirá con esto
24. Cumplir con las normas y regulaciones en materia ambiental y de sostenibilidad incluyendo la correcta disposición de residuos y el uso sostenible de recursos	En el vela por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente
25. Designar a una persona encargada de realizar mesas técnicas periódicas para presentar el avance técnico, operativo y administrativo del contrato	Actualmente el Ing. Andres morales cumple con esta función y ha asistido a todas las reuniones citadas
26. Responder en un término inferior a 1 día hábil por cualquier falla técnica en los trabajos realizados, realizando las reparaciones o mejoras necesarios sin costo adicional para el contrato	Hasta el momento se está atendiendo de esta manera y se retroalimenta en función de las correcciones
27. Responder en un término inferior a 1 día hábil por actos de vandalismo o hurto en los trabajos realizados, realizando las reparaciones o mejoras necesarios sin costo adicional para el contrato hasta en un 5% al alumbrado y/o iluminación tradicional de valor total del contrato	Durante el periodo de funcionamiento no se presentaron hurtos de elementos, solo se presentaron afectaciones por terceros que fueron solucionadas una vez fueron evidenciados.
28. Deberá garantizar el montaje y funcionamiento total de los ítems descritos en el anexo técnico	Cuando aplique se cumplirá con esto
29. Las demás obligaciones necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual	Cuando aplique se cumplirá con esto
1. Sitios aprobados: ALCALDIA CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22 CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15 CASA DE LA CULTURA COLISEO LEON XIII GLORIETA CIUDAD VERDE GLORIETA HOGARES SOACHA IGLESIA PARQUE CAMPESTRE	2. Etapa Ejecución: Para dar cumplimiento a los cronogramas se inicia ejecución el día 15 de noviembre para entrega el 6 de diciembre como fecha de encendido, a continuación, se relaciona algún registro fotográfico el proceso de ejecución en los diferentes sitios ejecutados: 

PARQUE LA ARENOSA

PARQUE TIBANICA

PASEO DE SAN MATEO

SALTO DEL TEQUENDAMA

SAN CARLOS

SECRETARIA DE GOBIERNO

SOACHA PLAZA PRINCIPAL


SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO

SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO

SOACHA PUENTE 5 PEATONAL SAN HUMBERTO


SOCHA PUENTE 3 CURVO EL DORADO


SOACHA PUENTE 4 PEATONAL UNISUR



3. Proceso de Pruebas de Funcionamiento


Después de 20 días de ejecución para el día 5 de diciembre se contaba con un buen avance de ejecución donde se logró avanzar y finalizar la ejecución de 16 de los 21 sitios pactados previo al día de encendido, para lo cual se realizó recorrido en conjunto con personal de Epuxua entre ellos los supervisores del contrato Camilo Torres y Juan Pablo Hernandez entre otros, para la verificación del encendido y el cual se encontrara acorde a los render propuestos, este día se visitaron en conjunto los siguientes sitios, Parque Principal, carrera 7, las fachadas de Alcaldía, Iglesia, Secretaria de Gobierno y casa de la Cultura, Salto del Tequendama y Parque la Arenosa, a continuación se presentan algunas fotos de los sitios recorridos:







De acuerdo a lo anterior se cumple con los sitios pactados en los cronogramas y con varios sitios de más que estaban para encendidos en días posteriores dejando solo para la semana del 9 la entrega y finalización de los 5 puentes, dejando claro que hubo un par de modificaciones, el cual no se ejecutó el puente de San Mateo que Cambio por puente San Humberto y no se ejecutó puente de calle 22 y cambio por puente de Unisur, a continuación, se dejan evidencias de los puentes iluminados


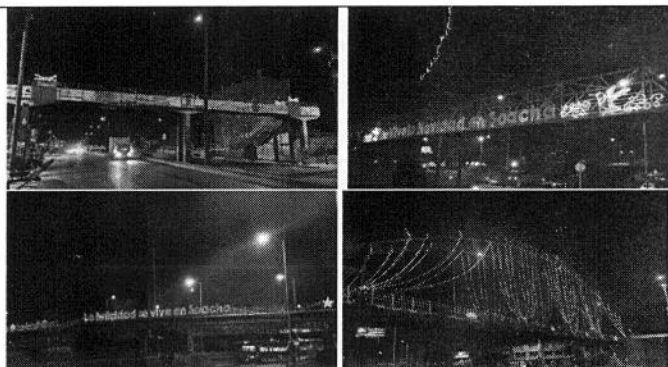


- **SHOW LASER 2024 EN SOACHA:**
El proyecto tiene como objetivo el diseño, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño / show laser 2024 en Soacha - Cundinamarca. Este proyecto se llevará a cabo con la instalación del alumbrado navideño en los puntos o sectores más emblemáticos del municipio dentro de los cuales se destaca el montaje del show laser en el salto del Tequendama. Este proyecto se llevará a cabo con la instalación de equipos de laser, sonido e iluminación en uno de los sectores más emblemáticos del municipio su energización.

- Localización del proyecto
El proyecto se realiza en el casco urbano del municipio de Soacha Cundinamarca.

- Alcance aprobado:
SHOW SALTO DEL TEQUENDAMA

Proyecto de show laser (en adelante el "Proyecto") Consiste en un show de proyección láser sobre los paredones del salto del Tequendama y cascada por un periodo de 24 días consecutivos durante la temporada decembrina del 2024, el show consta de:



diseño, producción y reproducción de una pieza audio visual, la cual encajara y coordinará con la estructura física del salto del Tequendama, esta pieza tendrá un espacio de introducción y menciones según lineamientos del cliente, así como una pieza temática con animaciones en vectores y líneas, texturas, de más o menos 8 minutos en su duración total, la edición y musicalización y diseño sonoro se realizan en función de la animación vectorial realizado a partir de una creación del guion con el cliente. Para el desarrollo de este se usarán 7 equipos de láser de 40 watts, los cuales se interconectarán con un sistema de audio con amplificación para un aforo aproximado de 200 personas por espectáculo, controlados desde una consola digital. Todo el montaje contará con un sistema de elevación en estructura scalfold o trust recubierto con poli sombra negra al 80%.


Este espectáculo incluye todos los técnicos de montaje, jefe de producción como los técnicos de soporte y reproducción, así como el servicio de seguridad privada durante 24 horas por la duración de todo el montaje y reproducción.

- **LOCACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS** (Ground support)
- **MONTAJE DE EQUIPOS**
- **MONTAJE RED SUMINISTRO ELÉCTRICO**
- **SETUP DE EQUIPOS Y PROGRAMACIÓN**
- **INSTALACION DE CABINAS DE SONIDO**
- **GROUND SUPPORT DEL SHOW (CENTRO DE MANDO)**
- **Planta electrica de respaldo día de lanzamiento**

- **Proceso de Pruebas de Funcionamiento:**

Después de 11 días de ejecución para el día 6 de diciembre se contaba con un buen avance de ejecución donde se logró realizar la primera prueba de funcionamiento previo al día de encendido, para lo cual se realizó recorrido en conjunto con personal de Epuxua entre ellos los supervisores del contrato Camilo Torres y Juan Pablo Hernandez entre otros, para la verificación del encendido y el cual se encontrará acorde a lo propuesto, Con presencia de entidades contratantes y alcalde de Soacha, este día se recibieron recomendaciones y solicitud de ajustes, los cuales se realizar para inaugurar a publico el evento a publico el 7 de diciembre de 2024

- **Primer día de show**
- **Lanzamiento oficial del show a prensa y medios.**




VI. Actividades y gestiones.

En el siguiente cuadro se relacionan las cantidades contratadas y las cantidades finalmente instaladas, teniendo en cuenta que hubo sobrantes de material en Cra 7 y los Árboles de Hogares de Soacha y San Matero y que se reubico a otros sitios como fueron San Carlos, Tibanica, Campestre y la Arenosa:

SITIO	Descripción	Cantidad Contratada	Cantidad Instalada
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	MINI LED IND. C:P 20 EXTENSIONES POR PERGOLA	80	80
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	120	120
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	STROBER LED C: W E27 6W 15 STROBERS POR FOLLAJE DE ARBOL PARA 10 ARBOLES	150	150
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	150	150
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	MINI LED IND. C:P 15 MINI LEDS POR ARBOL, PARA 10 ARBOLES	150	150
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	3D ANGEL TROMPETA C: WW 2X4,5X2M 33W	1	1
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 2,8M 83W	5	5
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W	5	5
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 5M 350W	5	5
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ARBOL MAPLE LED 5 M BLAN LED BLAN	5	5
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	16	16
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	TAPA CONCRETO 1.3X0.8M CAJA INSPECCION	12	12

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES	

SOACHA PLAZA PRINCIPAL	2D COLIBRÍ C:WW 2.1X1.46M	6	6
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	6	6
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	2	2
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	2500	2500
ALCALDIA	MINI LED IND. BRILLO C:P CASCADAS CON CAIDA DE 1M Y DE 0.8M DONDE 1 EXTENSION CUBRE 0.80 ML	32	32
ALCALDIA	MINI LED IND. BRILLO C:P	2	4
ALCALDIA	MINI LED IND. C:W	6	91
ALCALDIA	STROBER LED C:W E27 6W	40	46
ALCALDIA	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	40	46
ALCALDIA	2D COPITO C:W 1M 17W	4	4
ALCALDIA	2D SEMIARCO TRIANGULO C:W 5X1M	2	2
ALCALDIA	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	2	2
ALCALDIA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	0	1
ALCALDIA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	600	600
CASA DE LA CULTURA	MINI LED brillos IND. C:P	24	24
CASA DE LA CULTURA	ROPE LED C:W 21 A 50 M	220	220
CASA DE LA CULTURA	STROBER LED C:W E27 6W	150	150
CASA DE LA CULTURA	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	150	150
CASA DE LA CULTURA	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5	4	4

CASA DE LA CULTURA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, Distribución de circuitos y control de encendido	0	1
CASA DE LA CULTURA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	600	600
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	MINI LED IND. C:VW PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	18	18
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	MINI LED IND. BRILLO C:P PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	18	18
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	MINI LED IND. C:W PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	18	18
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	2D HOJA PETALOS C:W 0,6X1,2M UBICADOS EN 8 POSTES	9	9
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	6	6
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	1
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1200	1200
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	STROBER LED C:W E27 6W 10 STROBERS POR ARBOL PARA 49 ARBOLES	490	230
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	490	230
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	MINI LED IND. BRILLO C:P 9 EXTENSIONES POR ARBOL	441	110
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	MINI LED IND. C:VW 5 MINI LEDS POR ARBOL	245	127
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA PARA ARBOLES	294	294
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	2D SEMIARCO EN L C:VW 1,5X3M 210W 8 POR CUADRA	64	64

CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	1798	1798
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	1274	1274
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	64	64
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	16	16
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	6	6
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	3500	3500
IGLESIA	2D COPO DIAMANTES C:W 1,5M 21W	3	3
IGLESIA	STROBER LED C:W E27 6W	30	30
IGLESIA	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	30	30
IGLESIA	ROPE LED C:W 21 A 50 M	18	18
IGLESIA	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W FIJADOS EN COLOR FUCSIA	1	1
IGLESIA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	2
IGLESIA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
PARQUE LA ARENOSA	2D FILIGRANA 3 HONDAS C:WW 1,6M	15	15
PARQUE LA ARENOSA	2D RENO TIPO 1 C:W 2,5X1,5M 16W	3	3
PARQUE LA ARENOSA	2D Reno Tipo 3 Blanco 2,5x0,80m 110V 1	3	3
PARQUE LA ARENOSA	2D ESTRELLA 5 PUNTAS C:W 1,1X1,1M	5	5

PARQUE LA ARENOSA	2D MARCO LUZ ALTO C:W 3,7X2M	1	1
PARQUE LA ARENOSA	2D BASTON C:R 1,5X1M 8W	15	15
PARQUE LA ARENOSA	MINI LED IND. C:W	0	215
PARQUE LA ARENOSA	MINI LED IND. C:WW	0	215
PARQUE LA ARENOSA	2D ARCO MOSAICO C:B 3,11X3,33M	12	12
PARQUE LA ARENOSA	ROPE LED C:P PARA 2D ARCO MOSAICO C:B 3,11X3,33M	960	960
PARQUE LA ARENOSA	2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	2	2
PARQUE LA ARENOSA	ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA BASTON DE DULCE BLANCO ROJO 0,7x1,5x m 1 DOBLE RECORRIDO	92	92
PARQUE LA ARENOSA	MINI LED IND. BRILLO C:P ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	16	16
PARQUE LA ARENOSA	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT ROSADO PARA 2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	10	10
PARQUE LA ARENOSA	2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	2	2
PARQUE LA ARENOSA	ROPE LED C:W < 20 M PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M DOBLE RECORRIDO	148	148
PARQUE LA ARENOSA	MINI LED IND. BRILLO C:P PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	32	32
PARQUE LA ARENOSA	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT ROSADO PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	18	18
PARQUE LA ARENOSA	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	2	2
PARQUE LA ARENOSA	2D SEMIARCO DREAM C:W 4,57M 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	2	2
PARQUE LA ARENOSA	ROPE LED C:P 21 A 50 M PARA 2D SEMIARCO DREAM C:W 4,57M	232	232

PARQUE LA ARENOSA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	2	2
PARQUE LA ARENOSA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	2800	2800
SAN CARLOS	2D COPITO C:W 1M 17W	15	15
SAN CARLOS	TUBO REDONDO 2" 4M DIVIDIDO EN 2	10	10
SAN CARLOS	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	6	6
SAN CARLOS	2D ESTRELLA 5 PUNTAS C:W 1,1X1,1M	6	6
SAN CARLOS	2D COPITO C:W 1M 17W	6	6
SAN CARLOS	TUBO DE 2 PLGX3M GALVANIZADO	18	18
SAN CARLOS	MINI LED C:WW	0	32
SAN CARLOS	2D MODULO OLAS C:BCK 2X2M CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	28	28
SAN CARLOS	MINI LED IND. BRILLO C:P 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	50	50
SAN CARLOS	MINI LED IND. C:WW5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	45	45
SAN CARLOS	MINI LED IND. C:W 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	45	45
SAN CARLOS	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	12	12
SAN CARLOS	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	288	288
SAN CARLOS	ROPE LED C:P > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	288	288
SAN CARLOS	2D ESTRELLA C:W 0,5M 6 ESTRELLAS POR COSTADO DE CANCHA, PARA 2 CANCHAS UN TOTAL DE 4 COSTADOS	24	24

SAN CARLOS	2D ESTRELLA C:W 0,25M 10 ESTRELLAS POR COSTADO DE CANCHA, PARA 2 CANCHAS UN TOTAL DE 4 COSTADOS	40	40
SAN CARLOS	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	2	2
SAN CARLOS	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1900	1900
SALTO DEL TEQUENDAMA	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	16	16
SALTO DEL TEQUENDAMA	ROPE LED C:P 21 A 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W PARA 8 ARCOS	384	384
SALTO DEL TEQUENDAMA	ROPE LED C:W 21 A 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W PARA 8 ARCOS	384	384
SALTO DEL TEQUENDAMA	2D RENO TIPO 4 C:W 5X3,5M 102W	2	2
SALTO DEL TEQUENDAMA	2D RENO TIPO 6 C:W 5X2M 65W	1	1
SALTO DEL TEQUENDAMA	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	19	19
SALTO DEL TEQUENDAMA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	1
SALTO DEL TEQUENDAMA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	700	700
PARQUE CAMPESTRE	2D ARPA C:WW 2X0,86M 33W 10 ELEMENTOS POR CUADRA	30	30
PARQUE CAMPESTRE	2D HOJA PETALO C:W 2,2X1,3M 19W 3 ELEMENTOS POR CUADRA	9	9
PARQUE CAMPESTRE	2D ESTTELLA ARABESCO C:G 1,9X1,9M 3 ELEMENTOS POR CUADRA	9	9
PARQUE CAMPESTRE	ROPE LED C:P > 50 M PARA 2D ESTTELLA ARABESCO C:G 1,9X1,9M	396	396

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	INFORME DE ACTIVIDADES	

PARQUE CAMPESTRE	2D ARABESCO TIPO 1 C:W 2X1M 15W 5 ELEMENTOS POR CUADRA	15	15
PARQUE CAMPESTRE	ESTRELLA CON DESFASE DORADA BLANCO CÁLID 1 ELEMENTOS POR CUADRA	3	3
PARQUE CAMPESTRE	2D PESEBRE C:W 4X4M 250W UBICADO EN LA CUADRA CENTRAL DEL PARQUE	1	1
PARQUE CAMPESTRE	MINI LED IND. C:W	0	152
PARQUE CAMPESTRE	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W 2 POR CUADRA	3	3
PARQUE CAMPESTRE	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W 2 POR CUADRA	3	3
PARQUE CAMPESTRE	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	7	7
PARQUE CAMPESTRE	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	3	3
PARQUE CAMPESTRE	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	2800	2800
SECRETARIA DE GOBIERNO	STROBER LED C:W E27 6W	100	100
SECRETARIA DE GOBIERNO	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	100	100
SECRETARIA DE GOBIERNO	ROPE LED BRILLO C:P > 50 M	337	337
SECRETARIA DE GOBIERNO	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W	2	2
SECRETARIA DE GOBIERNO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	1
SECRETARIA DE GOBIERNO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	980	980
PARQUE TIBANICA	2D COLCHA RETAZOS C:M 0,25M	15	15
PARQUE TIBANICA	ROPE LED C:P 21 A 50 M PARA COLCHA	89	89

PARQUE TIBANICA	MINI LED IND. BRILLO C:P 3 MINI LEDS POR COLCHA	45	45
PARQUE TIBANICA	2D COLCHA RETAZOS C:B 0,6M	15	15
PARQUE TIBANICA	ROPE LED C:W 21 A 50 M	90	90
PARQUE TIBANICA	MINI LED IND. C:W 3 MINI LEDS POR COLCHA	45	45
PARQUE TIBANICA	3D ARBOL MODULO C:W	8	8
PARQUE TIBANICA	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	38	38
PARQUE TIBANICA	MINI LED IND. C:W	0	110
PARQUE TIBANICA	MINI LED IND. C:WW	0	30
PARQUE TIBANICA	ARBOL MAPLE LED 5 M BLAN LED BLAN	1	1
PARQUE TIBANICA	TAPA CONCRETO 1.3X0.8M CAJA INSPECCION	1	1
PARQUE TIBANICA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	1
PARQUE TIBANICA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1400	1400
PASEO DE SAN MATEO	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	4	4
PASEO DE SAN MATEO	EST. ÁRBOL ANILLOS MARCA 12M	1	1
PASEO DE SAN MATEO	3D ESTRELLA VOLUMÉTRICA CON NUC C:W 3M	1	1
PASEO DE SAN MATEO	ROPE LED C:P > 50 M	411	411
PASEO DE SAN MATEO	MINI LED IND. C:W	350	88
PASEO DE SAN MATEO	MINI LED IND. C:WW	150	97
PASEO DE SAN MATEO	MINI LED IND. C:P	0	78

PASEO DE SAN MATEO	STROBER LED C:W E27 6W	0	140
PASEO DE SAN MATEO	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	0	160
PASEO DE SAN MATEO	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL ARBOL HASTA UNA ALTURA DE 3 M	38	38
PASEO DE SAN MATEO	ROPE LED C:P 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	192	192
PASEO DE SAN MATEO	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W	2	2
PASEO DE SAN MATEO	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W	2	2
PASEO DE SAN MATEO	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	42	42
PASEO DE SAN MATEO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	1
PASEO DE SAN MATEO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1800	1800
COLISEO LEON XIII	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 2,8M 83W	2	2
COLISEO LEON XIII	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	5	5
COLISEO LEON XIII	2D PESEBRE C:W 4X4M 250W	1	1
COLISEO LEON XIII	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W 4 PROYECTORES FIJADOS EN COLOR MAGENTA (ROSADO)	4	4
COLISEO LEON XIII	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W 2 PROYECTORES FIJADOS EN COLOR BLANCO	2	2
COLISEO LEON XIII	MINI LED SILICON C:W	6	14
COLISEO LEON XIII	MINI LED SILICON C:W	0	6
COLISEO LEON XIII	2D RENO TIPO 1 C:W 2,5X1,5M 16W	2	2
COLISEO LEON XIII	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	1

COLISEO LEON XIII	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1200	1200
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Jose pesebre vol C:n/a 4,5 m F	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	MINI LED IND. C:WW	49	49
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Maria 4,5m	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	MINI LED IND. C:WW	49	49
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Niño Jesus 1,9m	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	MINI LED IND. C:WW	11	11
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D ANGEL 4.5M	3	3
GLORIETA CIUDAD VERDE	MINI LED IND. C:WW 50 EXTENSIONES POR CADA ANGEL	150	150
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Accesorios rey mago 1 Negro	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Accesorios rey mago 2 Negro	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Accesorios rey mago 3 Negro	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W	3	3
GLORIETA CIUDAD VERDE	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	3	3
GLORIETA CIUDAD VERDE	2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	4	4
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	80	80
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA ROSADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	20	20
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA DORADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	12	12

GLORIETA CIUDAD VERDE	2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	4	4
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	80	80
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA ROSADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	20	20
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA DORADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	60	60
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D RENO 1,2X2,5M 27W	4	4
GLORIETA CIUDAD VERDE	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1300	1300
GLORIETA HOGARES SOACHA	EST. ÁRBOL ANILLOS MARCA 12M	1	1
GLORIETA HOGARES SOACHA	3D ESTRELLA VOLUMÉTRICA CON NUC C:W 3M	1	1
GLORIETA HOGARES SOACHA	ROPE LED C:WW > 50 M	411	411
GLORIETA HOGARES SOACHA	MINI LED IND. C:W	350	111
GLORIETA HOGARES SOACHA	MINI LED IND. C:WW	150	15
GLORIETA HOGARES SOACHA	MINI LED IND. C:P	0	225
GLORIETA HOGARES SOACHA	STROBER LED C:W E27 6W	0	140
GLORIETA HOGARES SOACHA	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	0	160

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	INFORME DE ACTIVIDADES	

GLORIETA HOGARES SOACHA	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL ARBOL HASTA UNA ALTURA DE 3 M	38	38
GLORIETA HOGARES SOACHA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	1
GLORIETA HOGARES SOACHA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ELEMENTO 2D VIVE LA NAVIDAD EN SOACHA DE 32M	2	2
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ROPE LED C:P > 50 M < 20 M REMANUFACTURA PARA 2D FELICIDAD C:W 1,52X2,9M	460	460
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LETRERO FELIZ NAVIDAD TE DESEA SOACHA C:P C:W 14X1,2M	56	56
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	2D COLIBRÍ C:WW 2.1X1.46M	4	4
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	2D ARABESCO TIPO 3 C:W 2X1M 15W J	8	8
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	160	160
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	1
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500

SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA	2	2
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ROPE LED C:P > 50 M < 20 M REMANUFACTURA PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	480	480
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	50	50
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5	4	4
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	MINI LED IND. BRILLO C:P	48	48
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	160	160
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	1
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	2D REGALO PEQUEÑO C:R 1,66X1,6M 25W	4	4
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	MINI LED IND. BRILLO C:P	60	60
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	160	160
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja metálica con protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	1
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500

SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	2D HOJA PETALOS C:W 0,6X1,2M	8	8
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	MINI LED IND. BRILLO C:P	100	100
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	MINI LED IND. C:WW	64	64
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	MINI LED IND. C:W	64	64
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	1
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	2D ESTRELLA ARABESCO C:M 1,9X1,9M TODOS LOS ELEMENTOS EN POSTES VAN DISTRIBUIDOS EN UN RECORRIDO LINEAL DE 6.500 ML APROX. COMO CADA 160 M APROX.	4	4
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ELEMENTO 2D SOACHA COMPARTE LA NAVIDAD	2	2
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ROPE LED C:P > 50 M REMANUFACTURA PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	420	420
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	60	60
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	160	160
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, distribución de circuitos y control de encendido	1	1
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

INFORME DE ACTIVIDADES



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA

Se expide a los: 11 días del mes de marzo de 2025

Carlos Mario Restrepo Molina

Signed by Carlos
Mario Restrepo
Molina
Enel Colombia SA
ESP

Carlos Mario Restrepo Molina
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Cédula No. 79.148.785 de Bogotá
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P
NIT No. 8600638758

Luis Camilo Torres Hernandez
FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO
Cedula N°1.030.558.985
EPUXUA EICE
Nit N° 901511522-4

Diego Rolando Valderrama Acevedo

Approved by
Diego Rolando
Valderrama
Acevedo
Enel Colombia SA
ESP

Ricardo Carrero Padilla

Approved by
Ricardo Ivan
Carrero Padilla
Enel Colombia SA
ESP

Jhon Jairo Gonzalez Abril

Approved by Jhon
Jairo Gonzalez
Abril
Enel Colombia SA
ESP

enel

Approved by
Alvaro Humberto
Ladino Merchan
Enel Colombia SA
ESP

Approved by
Nubia Rocio
Lamprea Garcia
Enel Colombia SA
ESP

enel

Approved by Andres Felipe
Morales Marin
Enel Colombia SA ESP

XUA		EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA		ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA																	
		EPUXUA																			
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																					
FECHA:		viernes 28 de marzo de 2025		ESPACIO DE RADICACIÓN:																	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:		SUBGERENCIA TÉCNICA																			
Tipo de documento que origina el compromiso			INFORMACIÓN DEL COMPROMISO																		
<table border="1"><tr><td>Contrato</td><td>X</td></tr><tr><td>Convenio</td><td></td></tr><tr><td>Resolución</td><td></td></tr><tr><td>Servicio Público</td><td></td></tr><tr><td>Nomina</td><td></td></tr><tr><td>Otro</td><td></td></tr></table>			Contrato	X	Convenio		Resolución		Servicio Público		Nomina		Otro		<table border="1"><tr><td>BENEFICIARIO</td><td>CC - NIT</td></tr><tr><td>ENEL COLOMBIA SA ESP</td><td>860.063.875</td></tr></table>			BENEFICIARIO	CC - NIT	ENEL COLOMBIA SA ESP	860.063.875
Contrato	X																				
Convenio																					
Resolución																					
Servicio Público																					
Nomina																					
Otro																					
BENEFICIARIO	CC - NIT																				
ENEL COLOMBIA SA ESP	860.063.875																				
Cual?			<table border="1"><tr><td>DOCUMENTO SOPORTE</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>FVE00037436, FVE00037437, FVE00037438</td><td>10 de marzo de 2025</td></tr><tr><td>CDP</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>DIS-2625000155</td><td>27 de marzo de 2025</td></tr></table>			DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	FVE00037436, FVE00037437, FVE00037438	10 de marzo de 2025	CDP	FECHA	DIS-2625000155	27 de marzo de 2025								
DOCUMENTO SOPORTE	FECHA																				
FVE00037436, FVE00037437, FVE00037438	10 de marzo de 2025																				
CDP	FECHA																				
DIS-2625000155	27 de marzo de 2025																				
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL																					
CODIGO	CPE	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR																	
3.4.3.02.08.010.004		CI 3701/2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO 2024 SOACHA - CUNDINAMARCA	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DE INVERSIÓN - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$ 3.557.094.768.00																	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL				\$ 3.557.094.768.00																	
VALOR EN LETRAS:		TRES MIL QUINIE 4725 CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE																			
OBJETO DEL CRP																					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO 2024 SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA																					
OBSERVACIONES																					
																					
FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO																					
ESPACIO EXCLUSIVO PARA "RESPONSABLE DE EMITIR EL RP"																					
ESTADO DE LA SOLICITUD			CONSTANCIA DE ENTREGA																		
<table border="1"><tr><td>APROBADA</td></tr><tr><td>NÓ APROBADA</td></tr></table>			APROBADA	NÓ APROBADA	<table border="1"><tr><td>DEVOLUCION</td><td>CRP</td></tr><tr><td></td><td>RES-2025000138</td></tr></table>			DEVOLUCION	CRP		RES-2025000138										
APROBADA																					
NÓ APROBADA																					
DEVOLUCION	CRP																				
	RES-2025000138																				
FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO																					

		EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA			
		EPUXJA AVANZA			
		SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
FECHA	26/03/2025				
DEPENDENCIA SOLICITANTE:			ESPACIO DE RADICACIÓN:		
SUBGERENCIA TÉCNICA					
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO					
Funcionamiento					
Servicio de la deuda pública					
Inversión					
Gastos de operación comercial		X			
I. FICHA BPIN Y CLASIFICADOR PRESUPUESTAL: (EXCLUSIVO PARA RECURSOS DE INVERSIÓN)					
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:					
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:					
OBJETIVO (S) ESPECÍFICO DEL BPIN:					
ACTIVIDAD (ES) DEL BPIN A AFECTAR:					
II. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (EXCLUSIVO PARA RECURSOS DE OPERACIÓN)					
NOMBRE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		3071-2024			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR		
245.32.08.010.604	CI 3071/2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO 2024 SOACHA - CUNDINAMARCA	Disponibilidad Inicial Recursos de inversión - Transferencias Municipales	\$ 3.557.094.768,00		
TOTAL DISPONIBILIDAD		\$ 3.557.094.768,00			
VALOR EN LETRAS:		TRES MIL QUIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$3.557.094.768,00)			
OBJETO DEL CDP					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA					
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE		FIRMA ORDENADOR DE GASTO		Visto SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTIÓN HUMANA	
ESPACIO EXCLUSIVO PARA "RESPONSABLE DE EMITIR EL CDP"					
ESTADO DE LA SOLICITUD		CAUSAL DE DEVOLUCIÓN			
APROBADA		CODIGO DESCRIPCIÓN			
NO APROBADA					
INFORMACIÓN DEL CDP					
FECHA	27/03/2025				
NUMERO					
CONSTANCIA DE ENTREGA		DEVOLUCIÓN CDP			
		Dis-2025000165			

	EPUXUA	Código: RES-202500013	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2025000138

viernes, 28 de marzo de 2025

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA CALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.

A FAVOR DE Enel Colombia S A E S P NIT 860063875


DISPONIBILIDAD DIS 2025000155

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE: 004-Disponibilidad Inicial Recursos de Inversión - Transferencias Municipales		Enel Colombia S A E S P	3.557.094,768.00
2.4.5.02.08.010.004		CPC:	
Nombre CICP:	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		3,557,094,768.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

Se expide en SOACHA a los 28 días del mes de Marzo de 2025



RUBY MAGALI ESPAÑA-RUALES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

Elaboró: ERICK EN
Modificó:

 Nit:901511522-4	EPUXUA	Código: DIS-2025000155	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025000155

jueves, 27 de marzo de 2025

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA CALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.

CODIGO	NOMBRE	VALOR
010	CI 31071/2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISNEO MONTAJE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2024 SOACHA - CUNDINAMARCA	
2.4.5.02.08.010.004	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE: 004-Disponibilidad Inicial Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	3,557,094,768.00
TOTAL CDP		3,557,094,768.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA: GERENTE
RESPONSABLE: JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO
CARGO: GERENTE


RUBY MAGALI ESPAÑA RUALES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

Elaboró ERICK

Modificó:

Revisó:

EV

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
---	---	---

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DEL CONTRATO N° 147-2024

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato 147-2024 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDENO EN SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA., se suscribió el contrato de prestación de servicios que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
No. 147-2024	ENEL COLOMBIA SA ESP	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDENO EN SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la cuenta No. 01, certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre el 15 del mes de noviembre de 2024 y el 16 del mes de diciembre de 2024, relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite.

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
45%	N/A	\$ 1.600.692.645

Se factura el 45% según lo establecido en la cláusula de forma de pago del contrato.

Fuente: Recursos Ordinarios/Propios.


SUBTOTAL FACTURA	\$ 1.345.119.870
IVA	\$ 255.572.775
TOTAL, FACTURA	\$ 1.600.692.645

OBSERVACIONES

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Por lo anterior, se considera que el contratista cumple con los requisitos para efectuar el pago del contrato en mención.

En constancia se firma a los once (11) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).


LUIS CAMILO TORRES HERNÁNDEZ
 Supervisor Contrato N° 147-2024
 EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Revisó: Zandra Morales - Apoyo A La Supervisión - Componente Financiero



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/AUDM&BOG-CER2025-4223

**El Suscrito Revisor Fiscal de
Enel Colombia S.A. E.S.P.,
NIT. 860.063.875 - 8.,**

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 84072081, 84030510, 84022625, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicios Nacional de Aprendizaje "SENA" al 31 de enero de 2025.
- Entidades Promotoras de Salud al 28 de febrero de 2025.

En cumplimiento de artículo 2 de la ley 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 26 de febrero de 2025, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

 Digitally signed by
Andrea Rodríguez
Date: 2025.02.26
17:17:59 -05'00'


Andrea Rodríguez Mur
Revisor Fiscal de Enel Colombia S.A. E.S.P.
T.P. 14E083 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

Fecha de Entrega: 18 de diciembre de 2024.

Propósito. Complementar la certificación de parafiscales C.129/24-AUDM&SBOG-CER2024-29318

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 F B P A E 2 5 B A 4 1 B A 1 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANDREA RODRIGUEZ MUR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52744499 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 145083-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

52744499

NUMERO

RODRIGUEZ MUR

APELLIDOS

ANDREA

NOMBRES

Andrea Rodriguez Mur

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-OCT-1982
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

B+

G.S. RH


F

SEXO

14-DIC-2000 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1500106-47093421-F-0052744499-20011030

06510 01:95B 01 099479634

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

145083-T

ANDREA
RODRIGUEZ MUR
C.C. 52744499

RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/10/2009
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE *Leonardo Sanchez Garrido*
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 155595



69317

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Bogotá, 31 de enero de 2025

CERTIFICAMOS QUE:

El cliente ENEL COLOMBIA S.A. ESP identificado con NIT No. 860.063.875 se encuentra vinculado con el Banco GNB Sudameris, a través de la Cuenta de Ahorro No. 90060000410, abierta el 03 de marzo de 2005; tiempo durante el cual se ha observado un excelente manejo.

Cordial Saludo,



VIVIANA CORTES
DIRECTORA DE NEGOCIOS
BANCA INSTITUCIONAL

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141147635751



(415)7707212489984(8020) 000014114763575 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 6 3 8 7 5

8

Operativa de Grandes Contribuyentes

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Perscna jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ENE_ COLOMBIA S.A E.S.P

36. Nombre comercial

ENEL COLOMBIA S.A E.S.P.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL E3 13 45 P 1

42. Correo electrónico

asesoriafiscal@enel.com

43. Código postal

1 1 0 2 2 2 1

44. Teléfono 1

3 1 8 6 8 1 1 9 7 0

45. Teléfono 2

3 1 7 3 6 4 6 7 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

3 5 1 4

1 9 9 7 1 0 2 3

3 5 1 1

1 9 8 0 1 1 1 4

3 5 1 3 4 6 6 1

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

35. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8 1 9 2 6 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

18- Precios de transferencia

55 - Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

19- Productor de bienes y/o servicios exen

59 - Autorretención especial renta

10- Obligado aduanero

26- Declaración individual precios de tran

13- Gran contribuyente

41- Declaración anual de activos en el exte

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 8 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 3 56. Tipo 3 Servicio 1 2 3 57. Modo 2 58. CPC 8 4

¡IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BERTOLI FRANCESCO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147635751



(415)7707212489984(8020) 000014114763575 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 6 3 8 7 5 | 8

Operativa de Grandes Contribuyentes

3

1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 4 2 . 7 %
72. Número	3 4 8 0	1 8 2 7	
73. Fecha	1 9 8 0 1 0 1 5	2 0 2 3 0 7 1 2	83. Nacional público 9 9 . 5 3 %
74. Número de notaría	1 8	1 1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3	84. Nacional privado 0 . 4 7 %
76. Fecha de registro	1 9 8 0 1 1 1 4	2 0 2 3 0 7 2 1	
77. No. Matricula mercantil	1 8 3 5 8	1 7 3 0 3 3 3	
78. Departamento	4 1	1 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	85. Extranjero 5 7 . 3 %
Vigencia			86. Extranjero público 0 . 0 %
80. Desde	1 9 8 0 1 0 1 5	2 0 2 3 0 7 1 2	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	3 0 0 0 1 2 3 1	87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Servicios Públicos

4

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 0 7 0 8 3 1	8 3 0 0 3 7 2 5 0 - 6	
2	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		
3	2 0	2 0 2 2 0 3 0 1	8 3 0 0 3 7 2 4 8 - 0	
4	2 0	2 0 2 2 0 3 0 1	9 0 0 5 0 9 5 5 9 - 6	
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	ENEL SPA		0
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
ENEL SPA			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147635751



(415)7707212489984(8020) 000014114763575 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 6 3 8 7 5 | 8

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

Representación

93. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 4 0 2
130. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 9 8 4 8 5 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
134. Primer apellido BERTOLI	105. Segundo apellido	106. Primer nombre FRANCESCO
138. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
93. Representación REPRS LEGA_ SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 0 2
130. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 7 9 0 8 0 8 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
134. Primer apellido CATALDO	105. Segundo apellido	106. Primer nombre MONICA
138. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
93. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 3 0 7
130. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 1 4 8 7 8 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
134. Primer apellido RESTREPO	105. Segundo apellido MOLINA	106. Primer nombre CARLOS
138. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
93. Representación APOD. GENERAL	0 7	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 1 0 2 1
130. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 1 3 4 4 0 4 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
134. Primer apellido GONZALEZ	105. Segundo apellido FORERO	106. Primer nombre PUBLIO
138. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
93. Representación REPRS LEGA_ SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 1 0 0 3
130. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	101. Número de identificación 5 2 8 1 8 7 5 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
134. Primer apellido ULLOA	105. Segundo apellido RODRIGUEZ	106. Primer nombre ALEJANDRA
138. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147635751



(415)7707212489984(8020) 000014114763575 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 6 3 8 7 5 | 8

Operativa de Grandes Contribuyentes


Representación

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 4 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadani 1 3	101. Número de identificación 8 0 8 7 5 8 9 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido AMAYA	105. Segundo apellido CASTRILLON	106. Primer nombre ANDRES
107. Otros nombres FELIPE	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 3 2 6
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 8 0 0 7 5 6 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GRANDI	105. Segundo apellido	106. Primer nombre RAFFAELE
107. Otros nombres ENRICO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 3 2 6
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 7 9 9 8 1 1 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CRISOL	105. Segundo apellido PUERTAS	106. Primer nombre ANTONIO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 3 2 6
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 8 0 3 8 6 9 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MICELI	105. Segundo apellido	106. Primer nombre DARIO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147635751



(415)7707212489984(8020) 000014114763575 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 6 3 8 7 5 8

Operativa de Grandes Contribuyentes

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 0 2 0 7 6 5 6 5 3	113. DV 114. Nacionalidad ESPAÑA	2 4 5
115. Primer apellido RUBIO	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre LUCIO	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 3 0 3 2 0	123. Fecha de retiro 2 0 2 3 0 7 1 1
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 3 1 2 6 4 2	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido LLERAS	117. Primer nombre JOSE	118. Otros nombres ANTONIO
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 9 0 1 3 0	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 8 0 4 0 7 5 2 8	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CALDAS	116. Segundo apellido RICO	117. Primer nombre ANDRES	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 0	123. Fecha de retiro 2 0 2 4 0 3 2 1
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 2 0 4 5 1 7 9	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido SOTO	116. Segundo apellido LOSADA	117. Primer nombre CAROLINA	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 3 2 9	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 8 0 4 1 2 6 0 7	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ORTEGA	116. Segundo apellido LOPEZ	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres RICARDO
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 7 2 9	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147635751



(415)7707212489984(8020) 000014114763575 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 6 3

8

Operativa de Grandes Contribuyentes

3

1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 1 6 9 5 1 8 8	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido TABARES	116. Segundo apellido ANGEL	117. Primer nombre JORGE	118. Otros nombres ANDRES
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 3 2 9	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 1 5 8 7 8 3 8	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MARTINEZ	116. Segundo apellido ORTIZ	117. Primer nombre ASTRID	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 3 2 9	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	112. Número de identificación 9 8 4 8 5 8	113. DV 114. Nacionalidad ITALIA	3 8 6
115. Primer apellido BERTOLI	116. Segundo apellido	117. Primer nombre FRANCESCO	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 3 2 6	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 2 5 3 0 3 6 7	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido JIMENEZ	116. Segundo apellido RODRIGUEZ	117. Primer nombre DIANA	118. Otros nombres MARCELA
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 3 2 5	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 7 8 3 8 3 5	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido BARACALDO	116. Segundo apellido SARMIENTO	117. Primer nombre ANDRES	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 3 2 9	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147635751



(415)7707212489984(8020) 000014114763575 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 6 3 8 7 5 8

Operativa de Grandes Contribuyentes

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 1 7 8 6 7 9	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido FAGUA	116. Segundo apellido GUAUQUE	117. Primer nombre NESTOR	118. Otros nombres RAUL	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 3 2 9	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	112. Número de identificación 6 6 2 2 0 0 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido RASTELLI	116. Segundo apellido	117. Primer nombre MAURIZIO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 3 2 9	123. Fecha de retiro 2 0 2 4 0 3 0 1	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 9 4 7 2 3 9	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CASTRO	116. Segundo apellido PACHON	117. Primer nombre FELIPE	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 8 1 4	123. Fecha de retiro 2 0 2 3 1 2 2 9	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 9 3 8 2 3 7 9	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido TRUJILLO	116. Segundo apellido HERNANDEZ	117. Primer nombre MARIO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 8 1 4	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	112. Número de identificación 7 6 1 8 4 0 7	113. DV	114. Nacionalidad ITALIA	3 8 6
115. Primer apellido TOMMASI	116. Segundo apellido	117. Primer nombre LUCIANO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 7 1 2	123. Fecha de retiro 2 0 2 4 0 3 2 1	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147635751



(415)7707212489984(8020) 000014114763575 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 6 3

6. DV

8

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	112. Número de identificación 7 9 0 8 0 8 5	113. DV CHILE	114. Nacionalidad 2 1 1
115. Primer apellido CATALDO	116. Segundo apellido	117. Primer nombre MONICA	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 3 2 6	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 2 2 6 0 9 6 2	113. DV COLOMBIA	114. Nacionalidad 1 6 9
115. Primer apellido ORTIZ	116. Segundo apellido JARA	117. Primer nombre RUTTY	118. Otros nombres PAOLA
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 3 2 6	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento Pasaporte 4 1	112. Número de identificación Y C 3 0 5 1 3 5 9	113. DV ITALIA	114. Nacionalidad 3 8 6
115. Primer apellido GRANDI	116. Segundo apellido	117. Primer nombre RAFFAELE	118. Otros nombres ENRICO
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 3 2 6	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento Pasaporte 4 1	112. Número de identificación P A T 5 4 6 1 7 4	113. DV ESPAÑA	114. Nacionalidad 2 4 5
115. Primer apellido CRISOL	116. Segundo apellido PUERTAS	117. Primer nombre ANTONIO	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 3 2 6	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



Página 9 de 10 Hoja 5

4. Número de formulario

141147635751



(415)7707212489984(8020) 000014114763575 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 6 3 8 7 5 | 8

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 5 2 7 4 4 4 9 9	126. DV 127. Número de tarjeta profesional 1 4 5 0 8 3 T
	128. Primer apellido RODRIGUEZ	129. Segundo apellido MUR	130. Primer nombre ANDREA 131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 0 0 8 4 6 4	133. DV 134. Sociedad o firma designada KPMG S A S	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 6 1 5		
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3 1 0 5 7 5 8 9 1 5 3	138. DV 139. Número de tarjeta profesional 2 3 2 1 3 0 T
	140. Primer apellido TARAZONA	141. Segundo apellido BENITEZ	142. Primer nombre DARWIN 143. Otros nombres ALVEIRO
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 0 0 8 4 6 4	145. DV 146. Sociedad o firma designada KPMG S A S	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 8 2 9		
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 3 7 9 4 5 2 0 9	150. DV 151. Número de tarjeta profesional 2 6 5 4 5 0 T
	152. Primer apellido SARMIENTO	153. Segundo apellido QUINTERO	154. Primer nombre LUZ 155. Otros nombres DARY
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 2 4 0 9 0 1	157. DV 158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 0 9 0 1		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147635751



(415)7707212489984(8020) 0000141147635751

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 6 3 8 7 5 | 8

Operativa de Grandes Contribuyentes

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Comercialización de energía eléctrica	3 5 1 4
162. Nombre del establecimiento ENEL COLOMBIA S.A E.S.P			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 13 A 93 66			
166. Número de matrícula mercantil	0 1 0 0 4 8 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 0 0 4 0 3
168. Teléfono	6 0 1 6 0 1 5 4 3 2	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Otro tipo de establecimiento	9 9	161. Actividad económica Comercialización de energía eléctrica	3 5 1 4
162. Nombre del establecimiento ENEL COLOMBIA BODEGA PRINCIPAL			
163. Departamento Cundinamarca	2 5	164. Ciudad/Municipio Tenjo	7 9 9
165. Dirección LT EL RUBI CENTRO EMPRESARIAL LA FLORESTA			
166. Número de matrícula mercantil	2 0 6 7 8 8 9 4	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 2 0 7 3 0
168. Teléfono	6 0 1 6 0 1 6 0 6 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	



SOACHA
GOBIERNO MUNICIPAL
NIT. 800.094.756-7

Secretaría
de Hacienda

Dirección de Rentas

Código
01

FORMULARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

FORMULARIO No 221029295

Diligenciar sin tachones, borrones ni enmendaduras

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

1. Inscripción ☐		2. Novedades ☒		3. Cese de Actividades ☐	
1.1 Sujeto Pasivo ICAT ☒		1.2 Agente de retención ☒		1.3 Impuesto Publicidad Exterior Visual ☐	
1.4 Impuesto Delineación Urbana ☐		1.5 Otro ☐		Cual? _____	
2. Nombre de la Entidad				5. Fecha del Contrato Día Mes Año	
3. Dirección de la entidad		4. Número de contrato		5. Fecha del Contrato	
6. Tipo de Documento: CC ☐ NT ☒ CE ☐ No. 860063875 DV 8		7. Naturaleza Jurídica Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒ Sociedad de hecho ☐		8. Régimen Tributario Régimen Preferencial ☐ Régimen Común ☐ Régimen Simple de Tributación ☐ Gran contribuyente ☒	
9. Nombre y apellidos o Razón Social: ENEL COLOMBIA S.A E.S.P.					
10. Número de Registro Mercantil BOGOTA 1730333		11. Fecha de matrícula 17/08/2017		12. Estado del registro mercantil Inscripción ☐ Renovación ☒	
13. Dirección de notificación judicial		14. Departamento		15. Municipio	
16. Dirección de correo LO AREA 1		17. Municipio BOGOTA		18. Celular	
19. Celular u otro 2190373		20. Correo Electrónico		21. Correo Notificación	
22. Nombre del Establecimiento Comercial					
23. Dirección del Establecimiento Comercial					
24. Teléfono fijo o móvil					
25. Número de Registro Mercantil del Establecimiento					
26. Fecha de Matrícula del Establecimiento					
27. Teléfono celular					
28. Correo Electrónico					
29. Estado del Registro Mercantil Inscripción ☐ Renovación ☐					
30. Tipo de actividad Industrial ☐ Comercial ☒ Servicios ☐ Financiera ☐					
31. Fecha de inicio de Actividades en el Municipio de Soacha 01/01/2014					
32. Código y descripción de la Actividad Económica [Código CIIU que aparece en el RUT] Código Act. Principal 35114 Descripción Comercialización de energía eléctrica.					
33. Nombres y Apellidos 1. CARLOS MARIO RESTREPO MOLINA 2. ANDREA RODRIGUEZ MUR					
34. Tipo y Número de Identificación 1. CC 79148785 2. CC 52744499					
35. No. Tarjeta Profesional 1. _____ 2. 145083-T					
36. Tipo de Documento: CC ☐ NT ☐ CE ☐ No. _____ DV _____					
37. CR 1. _____ 2. _____					
38. No. Tarjeta Profesional 1. _____ 2. 145083-T					
39. Traspaso ☐ 40. Cambio razón Social ☐ 41. Cambio de dirección ☐ 42. Cambio de Régimen ☐ 43. Otros ☒ Cual? _____					
44. Nombres y Apellidos del Nuevo Propietario					
45. Tipo de Documento: CC ☐ NT ☐ CE ☐ No. _____ DV _____					
46. Nombre Razón Social ENEL COLOMBIA S.A E.S.P.					
47. Número de Registro Mercantil BOGOTA 1730333					
48. Fecha de Matrícula 17/08/2017					
49. Cambio de Régimen Régimen Preferencial ☐ Régimen Común ☐ Régimen Simple de tributación ☐ Gran Contribuyente ☒					
50. Nueva Dirección LO AREA 1					
51. Barrio					
52. Comuna					
53. Celular					
54. Si selecciono la casilla se diligencia este campo la información a actualizar					
55. Causal Fusión ☐ Escisión ☐ Liquidación ☐ Cese de actividades ☐ Clausura del establecimiento ☐ Otro ☐ Cual? _____					
56. Número de la cancelación del Establecimiento ante la Cámara de Comercio					
57. Fecha de Clausura del Establecimiento o servicios prestados en el Municipio de Soacha					
58. Contribuyente o representante legal CARLOS MARIO RESTREPO MOLINA Firma digitalmente por CARLOS MARIO RESTREPO MOLINA Fecha: 2024.06.04 11:08:42 -05'00'					
59. Nombre CARLOS MARIO RESTREPO MOLINA CC X CE OTRO No. 79.148.785					
Firma del Funcionario Autorizado					

**¡El pago oportuno de sus Impuestos
genera Bienestar para todos!**

Dirección de Rentas
Calle 13 # 8-40
Código Postal: 250051
Teléfono: 60 (1)7326900
Soacha- Cundinamarca
www.alcaldiasoacha.gov.co

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
 REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Página 1/2

Fecha: 13/06/2023

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 860063875

ENEL COLOMBIA SA ESP

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 93 13 45 PI 1 Teléfonos: 3165208946
 Dirección electrónica: asesoriafiscalmunicipales@en Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de Inscripción: 27/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 17/08/2007
 Matricula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 17/08/2007 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 3511 - Generación de energía eléctrica
 Actividad 2: 46611 - Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos (excepto combustibles derivados del petróleo)
 Actividad 3: 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo
 Actividad 4: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
 Actividad 5: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/01/2022	C.C.	1018418896	SANDRA MARCELA BARRAGAN CELLAMEN	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
24/01/2022	C.C.	1020765653	LUCIO RUBIO DIAZ	GERENTE
24/01/2022	C.C.	1049645571	MANUEL CAMILO SAAVEDRA MONROY	REVISOR FISCAL SUPLENTE
24/01/2022	C.C.	72150845	FERNANDO JAVIER GUTIERREZ MEDINA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
 Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 860063875

ENEL COLOMBIA SA ESP

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
23/08/2016	C.C.	80417414	CARLOS EDUARDO RUIZ DIAZ	APODERADO GENERAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD




CONTRATO N°:	CD-147-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR	TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$3.557.094.768) MCTE , incluye el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar con ocasión de su celebración, ejecución, y liquidación.
CONTRATISTA	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P IDENTIFICADA CON NIT 860.063.875-8
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 15 de noviembre de 2024, con fecha probable de terminación el 31 de diciembre de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el 15 de noviembre de 2024.

Por la Entidad:  LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ SUBGERENTE TÉCNICO SUPERVISOR	Por la Contratista:  Carlos Mario Restrepo Molina Signed by Carlos Mario Restrepo Molina Enel Colombia SA ESP ENEL COLOMBIA S.A E.S.P IDENTIFICADA CON NIT 860.063.875-8 RLS: CARLOS MARIO RESTREPO MOLINA C.C No. 79.148.785 DE BOGOTÁ
--	--


Proyectó: Yessica Katherine Obando Torres – Profesional Universitario II Secretaría General

Diego Esteban Valencia

Approved by Diego Esteban Valencia
Enel Colombia SA ESP

enel

Approved by Álvaro Humberto
López Martínez
Enel Colombia SA ESP



Approved by Nubia Rocio
Lamprea Garcia
Enel Colombia SA
ESP

enel

Approved by Dora Viana Perera
Enel Colombia SA ESP



aportes
en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que DELTEC S.A. identificado(a) con NI 800166199 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CESAR ANDRES TRIVIÑO POLANIA identificado(a) con CC 1012432354

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización
										ing	ret	tdc	tas	top	cap	vsp	cor	vsf	sin	lma	vac	avp	vct	tri		
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X							4%	\$140.600
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X							16%	\$562.400
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30									X								\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30									X								\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30									X							0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2024-10	30									X							0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X							6.96%	\$244.700
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X							4%	\$140.600

Este certificado se expide el día 2024-11-22 a las 09:45.

Se certifica que DELTEC S.A. identificado(a) con NI 800166199 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CHRISTIAN CAMILO CUINTACO BARBOSA identificado(a) con CC 1122119344

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	lri			vip
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X								4%	\$116,700
9477443325	1067175114	F	2024-11-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								10%	3,400,000
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30									X									\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30									X									\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30									X								0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2024-10	30									X								0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	ARL	14-11	ARI SIIRA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								4.35%	6127,000
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X								4%	\$116,700

Este certificado se expide el día 2024-11-22 a las 09:44.

Se certifica que DEL TEC S.A. identificado(a) con NI 800166199 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FREDY ALONSO CASTRO CASTILLO identificado(a) con CC 79831641


Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct			lri
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	20								X									4%	\$100,100
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	10											X						4%	\$44,100
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	20								X									16%	\$400,300
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	10										X							16%	\$176,200
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	20								X										\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	10											X							\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	20								X										\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	10											X							\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	20								X									0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	10												X					0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2024-10	20								X									0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2024-10	10												X					0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	ARL	14-11	ARL SUVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	20									X								6.96%	\$174,100
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	ARL	14-11	ARL SUVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	10											X						0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	20									X								4%	\$100,100
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	10													X				4%	\$42,200

Este certificado se expide el día 2024-11-22 a las 09:44.

Se certifica que DELTEC S.A. identificado(a) con NI 800166199 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FREDY MARTIN QUIJANO LEYTON identificado(a) con CC 79245662

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administrador	Concepto	Periodo	Días	Ing	ret	tdc	tao	tdp	sup	vap	cor	vst	sh	ise	lma	vae	avp	vst	irl	vip	Tarifa	Cotización
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30								X										4%	\$165,900
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30								X										16%	\$963,300
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30								X											\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30								X											\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30								X										0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2024-10	30								X										0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30								X										6.96%	\$288,600
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30								X										4%	\$165,900

Este certificado se expide el día 2024-11-22 a las 09:45.



aportes
en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que DELTEC S.A. identificado(a) con NI 800166199 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GABRIEL ARBOLEDA PINZON identificado(a) con CC 1096188104

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Tarifa	Cotización
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30								X									4%	\$153.600
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30								X									10%	\$914.400
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30									X									\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30									X									\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30									X								0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2024-10	30									X								0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								4.35%	\$187.100
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								4%	\$153.000

Este certificado se expide el día 2024-11-22 a las 09:44.



Certificados de Aportes

Se certifica que DELTEC S.A. identificado(a) con NI 800166199 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GUSTAVO WILSON GARCES VARGAS identificado(a) con CC 79974666

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									4%	\$135,000
9477443325	1007175114	C	2024-11-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION OBLIGATORIA	2024-10	30									X									10%	\$339,900
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD FENECIONAL	2024-10	30									X										\$0
9477443325	1007175114	E	2024-11-21	AFP	230201	SURCUENTA DE SUBSISTENCIA	SURCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30									X										\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30									X									0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA AFLADO	2024-10	30									X									0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACION OBLIGATORIA	2024-10	30									X									4.35%	\$146,800
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACION OBLIGATORIA	2024-10	30									X									4%	\$135,000

Este certificado se expide el día 2024-11-22 a las 09:44

Se certifica que DELTEC S.A. identificado(a) con NI 800166199 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHEISON FERNANDO CASTILLO PARDO identificado(a) con CC 1030570278

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades												Tarifa	Cotización					
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma			vac	avp	vct	lri	vip
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30								X										4%	\$153,600
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30								X										16%	\$914,400
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30								X											\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30								X											\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30								X										0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2024-10	30								X										0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30								X										4.35%	\$167,100
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30								X										4%	\$153,600

Este certificado se expide el día 2024-11-22 a las 09:44

Se certifica que DELTEC S.A. identificado(a) con NI 800166199 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE FERNANDO CIFUENTES PEREZ identificado(a) con CC 1090392595

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Ing	ret	tde	tae	tdp	kap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Tarifa	Cotización
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	21									X									4%	\$123.900
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	9												X						4%	\$36.500
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	21									X									16%	\$495.300
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	9												X						16%	\$145.900
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	21									X										\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	9												X							\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	21									X										\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	9													X						\$0
9477443325	1067175114	F	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	21									X									0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	9												X						0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2024-10	21									X									0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2024-10	9													X					0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	21									X									4.35%	\$134.700
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	9												X						0%	\$0
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	21									X									4%	\$123.900
9477443325	1067175114	E	2024-11-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	9													X					4%	\$35.300

Este certificado se expide el día 2024-11-22 a las 09:44.

●

Este certificado se expide el día 2024-11-22 a las 09:45:

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

EPUXUA E.I.C.E

**INFORME DE SUPERVISIÓN ENERO 2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024
CONTRATO 147-2024**

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO
NAVIDEÑO EN SOACHA – CUNDINAMARCA**

**15 DE NOVIEMBRE 2024 AL
06 DE DICIEMBRE 2024 
SOACHA,
CUNDINAMARCA**

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

Tabla de contenido

1. CONTRATOS.....	3
1.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.....	3
1.2 CONTRATO DERIVADO	4
1.3 ACTA DE INICI	6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	7
4. DESARROLLO Y AVANCE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES.....	8
4.1 SITIOS APROBADOS:.....	8
4.2 ETAPA EJECUCIÓN:.....	8
5. PROCESO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.....	12
6. PROBLEMAS PRESENTADOS Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS.....	26
7. ACTIVIDADES Y GESTIONES.....	26
8. ENTREGA DE PROYECTOS Y CONTEO DE MATERIALES.	44
9. CRONOGRAMA.....	45
10. PERSONAL INVOLUCRADO Y NOVEDADES.	45
11. ANEXOS.....	47

7

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2019 DE 2024

PERIODO DE INFORME: 15 NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE INFORME: 12 DE DICIEMBRE 2024

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3071-2024


OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.

CONTRATISTA: EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. NIT: 901.511.522-4.



1. CONTRATOS

1.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO: GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2024 EN SOACHA - CUNDINAMARCA	
Valor Inicial	\$ 3.699.378.558.00
Valor adición	NA
Prorrogas	NA
Valor Total	\$ 3.699.378.558.00
Contratista	EMPRESA PUBLICA DE SOACHA - EPUXUA E.I.C.E. NIT 901.511.522-4
Fecha de Inicio	15/11/2024



18 nov. 2024 5:28:52 p. m.
4°34'24"N 74°12'53"W
3-90 Calle 13
Soacha
Cundinamarca
Altitud:2601.0m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 194

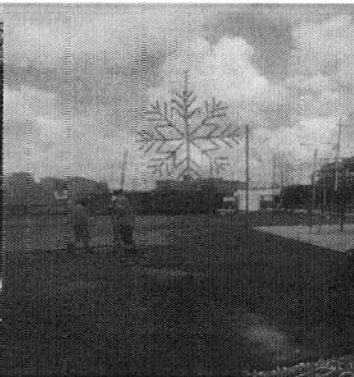

19 nov. 2024 10:33 33 a. m.
4.57357212N 74.21459642W
386 Calle 13
Soacha
Cundinamarca




19 nov. 2024 11:59:12 a. m.
4.58248725N 74.21581272W
16-93 Carrera 7
Soacha
Cundinamarca



19 nov. 2024 2:36:59 p. m.
4.58579591N 74.22636271W
17d32 Carrera 12
Soacha
Cundinamarca



18 nov. 2024 5:27:03 p. m.
4°34'25"N 74°12'53"W
3 Este - 37 Calle 13
Soacha
Cundinamarca
Altitud:2601.0m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 191

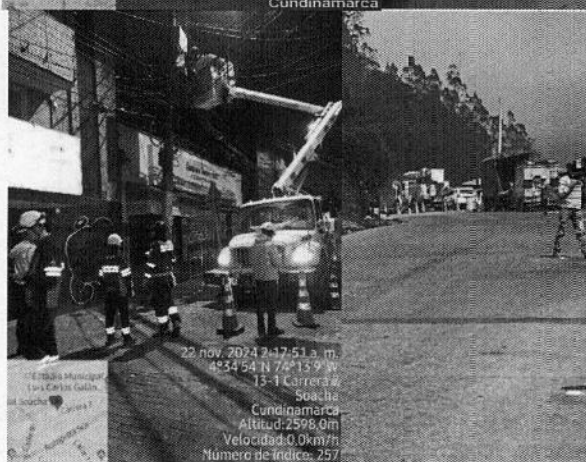

22 nov. 2024 2:17:51 a. m.
4°34'54"N 74°13'9"W
13-1 Carrera 7
Soacha
Cundinamarca
Altitud:2598.0m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 257






[Handwritten signature]

5. PROCESO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Después de 20 días de ejecución para el día 5 de diciembre se contaba con un buen avance de ejecución donde se logró avanzar y finalizar la ejecución de 16 de los 21 sitios pactados previo al día de encendido, para lo cual se realizó recorrido en conjunto con personal de Epuxua entre ellos los supervisores del contrato Camilo Torres y Juan Pablo Hernandez entre otros, para la verificación del encendido y el cual se encontrara acorde a los render propuestos, este día se visitaron en conjunto los siguientes sitios, Parque Principal, carrera 7, las fachadas de Alcaldía, Iglesia, Secretaria de Gobierno y casa de la Cultura, Salto del Tequendama y Parque la Arenosa, a continuación se presentan algunas fotos de los sitios recorridos:

- Parque Principal

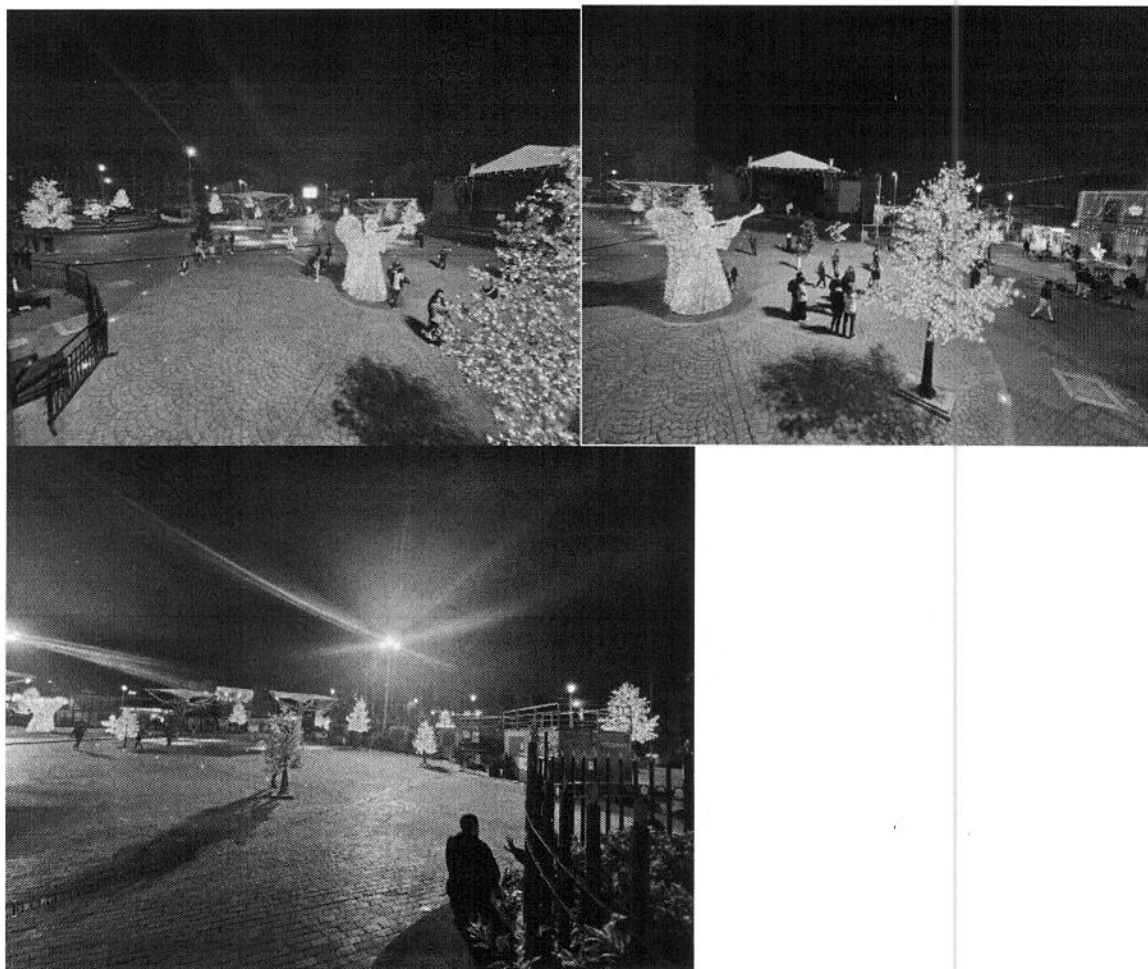


	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	


- Fachada Alcaldía




- Fachada Iglesia

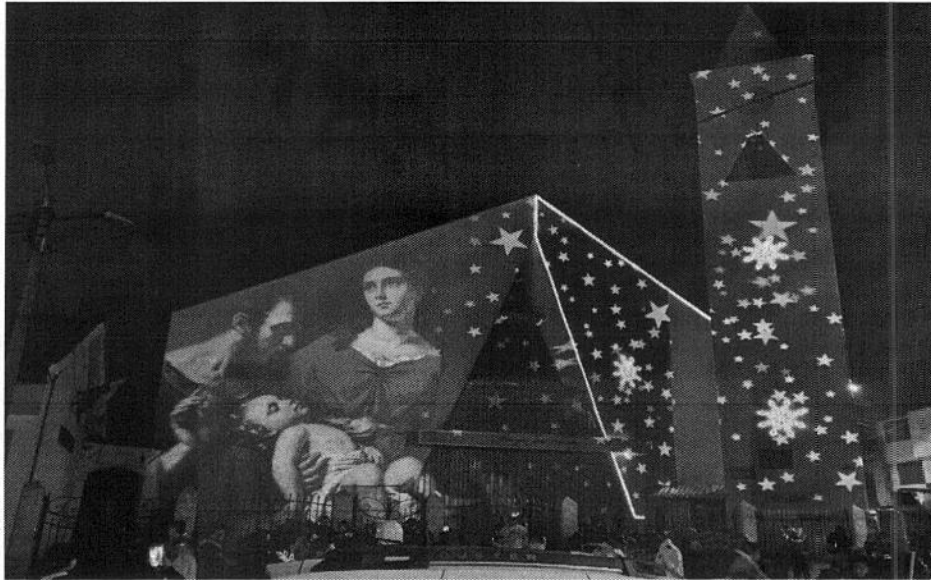

- Fachada secretaria de Gobierno

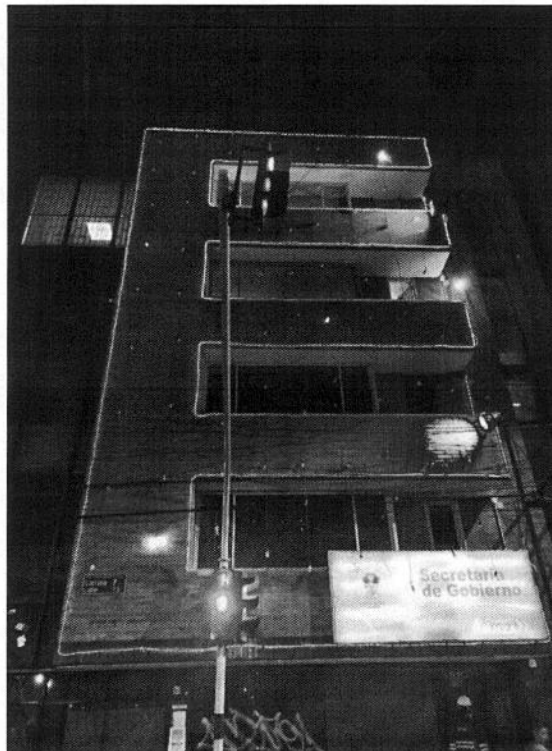



- Fachada Casa de la Cultura

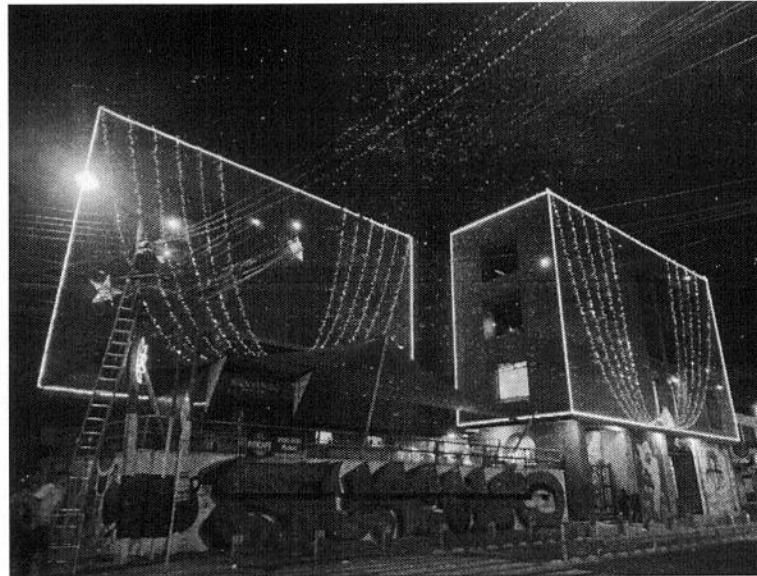

- Carrera 7
22

entre Cl 13 y

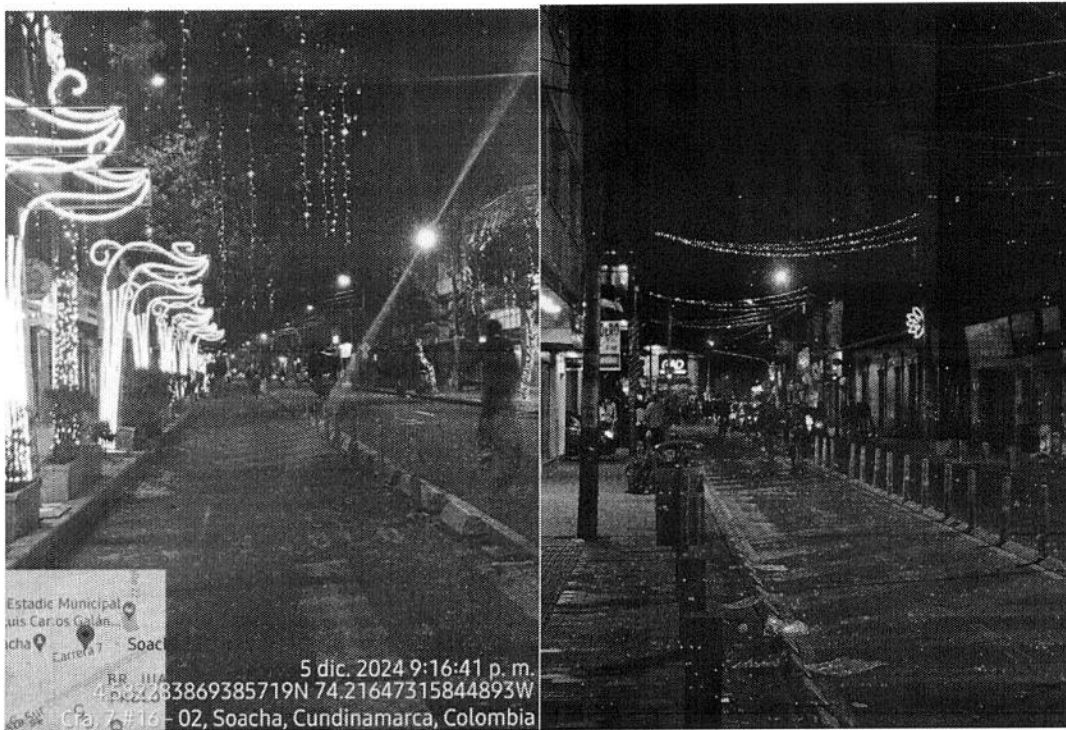


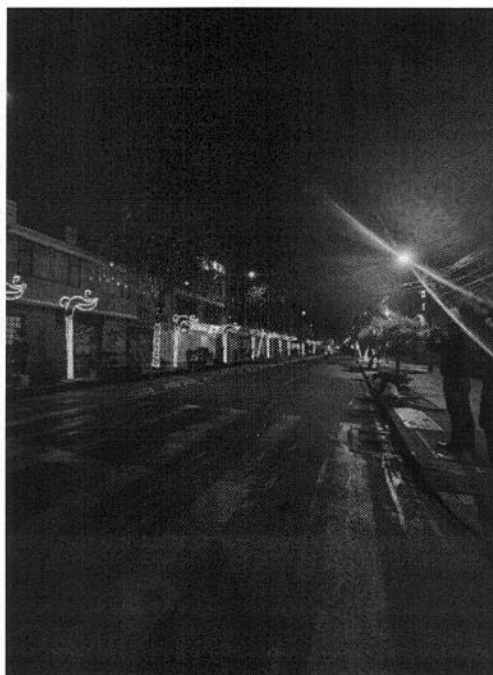


- Salto del Tequendama:



✓

 XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA E.I.C.E.	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

- Parque La Arenosa

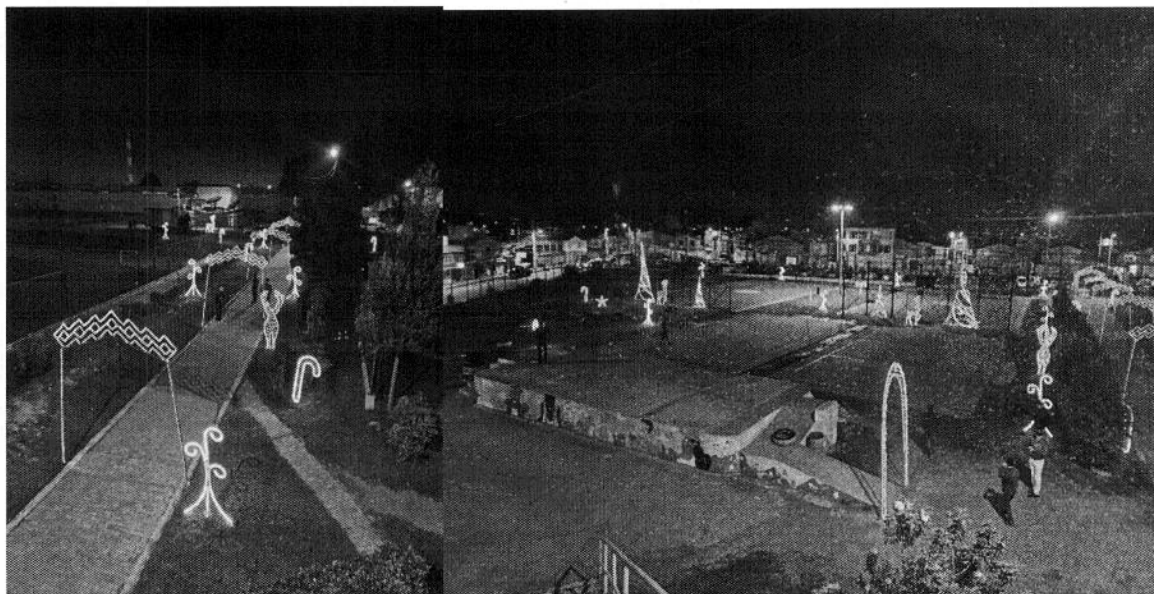

[Handwritten signature]

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

Por parte de Enel, se realizó la verificación de los sitios restantes y que fueron encendidos el día 6 sin novedad los cuales fueron, Coliseo Leon de XIII, Parque Tibanica, Parque San Carlos, Paseo San Mateo, Parque Campestre, Glorieta Hogares de Soacha y Glorieta Ciudad Jardín.

- Coliseo Leon XIII



- Parque Tibanica



②

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	


- Parque San Carlos




Q


	EPUXUA E.I.C.E.	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

- Paseo San Mateo

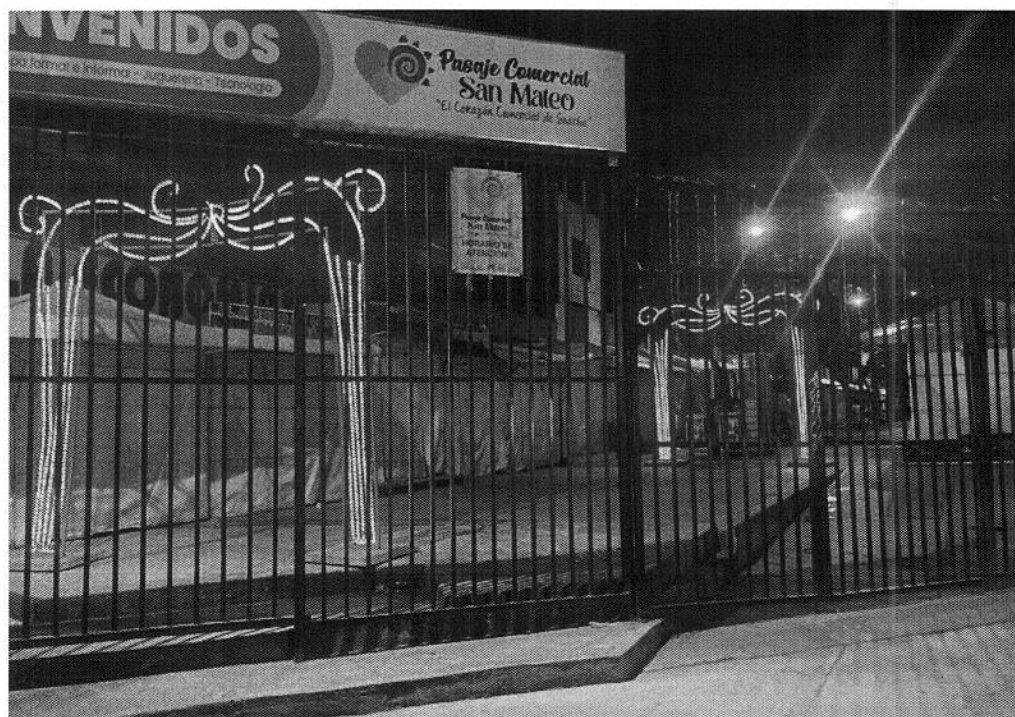

 XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA E.I.C.E. INFORME DE SUPERVISIÓN	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
---	---	---

- Parque Campestre

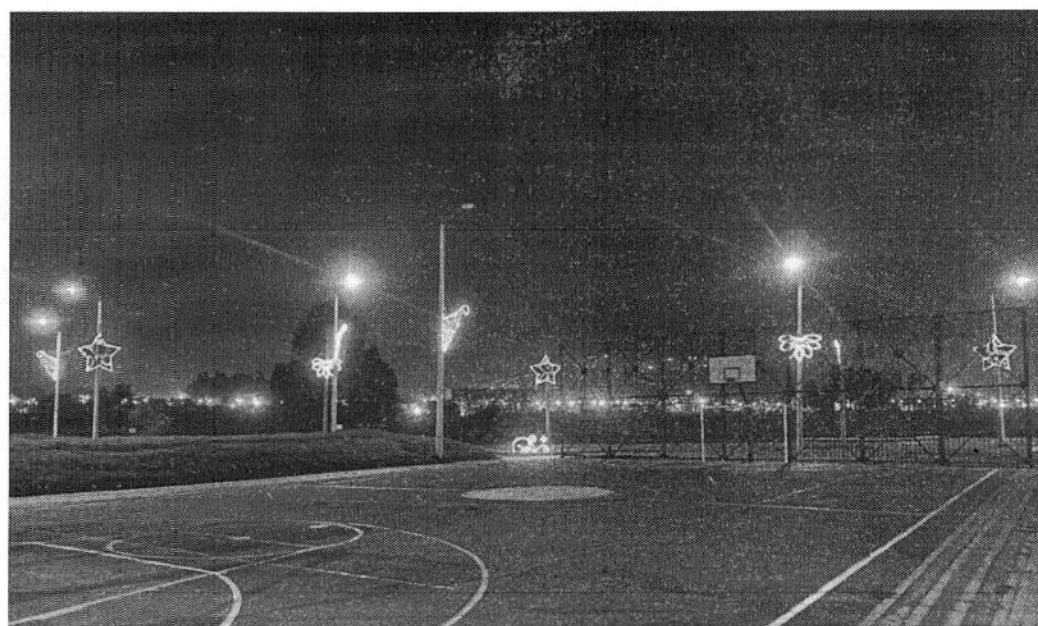

8

- Glorieta Hogares de Soacha




- Glorieta Ciudad Verde



	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

De acuerdo a lo anterior se cumple con los sitios pactados en los cronogramas y con varios sitios de más que estaban para encendidos en días posteriores dejando solo para la semana del 9 la entrega y finalización de los 5 puentes, dejando claro que hubo un par de modificaciones, el cual no se ejecutó el puente de San Mateo que Cambio por puente San Humberto y no se ejecutó puente de calle 22 y cambio por puente de Unisur, a continuación, se dejan evidencias de los puentes iluminados.

- Puente San Humberto

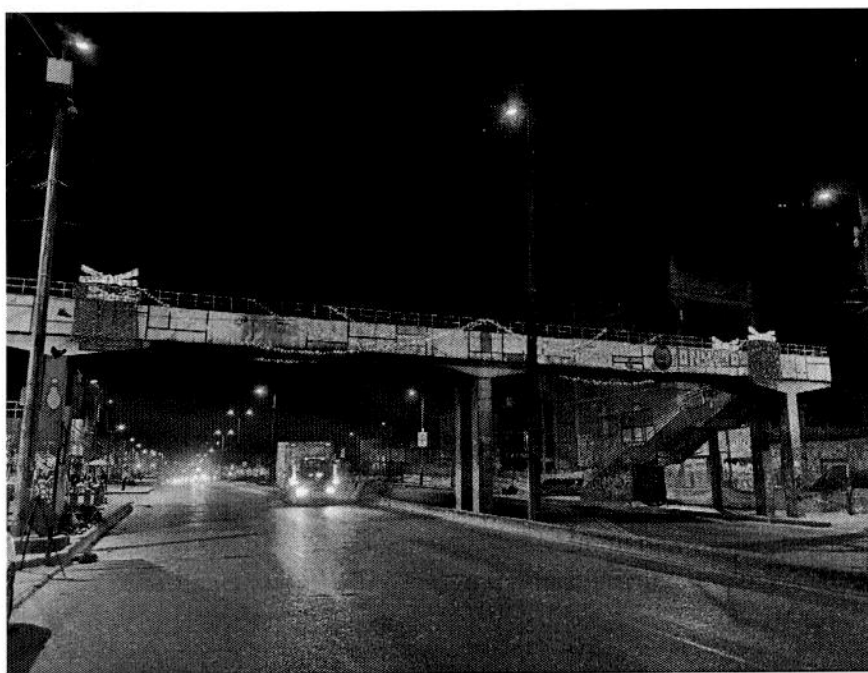

- Puente Ventura



EPUXUA E.I.C.E.


INFORME DE
SUPERVISIÓN



13/12/2024 11:53:27 p. m.
4,59053N 74,19702W
33 Carrera 7
Soacha
Cundinamarca
#Nodo 36

g

- Puente Mercurio

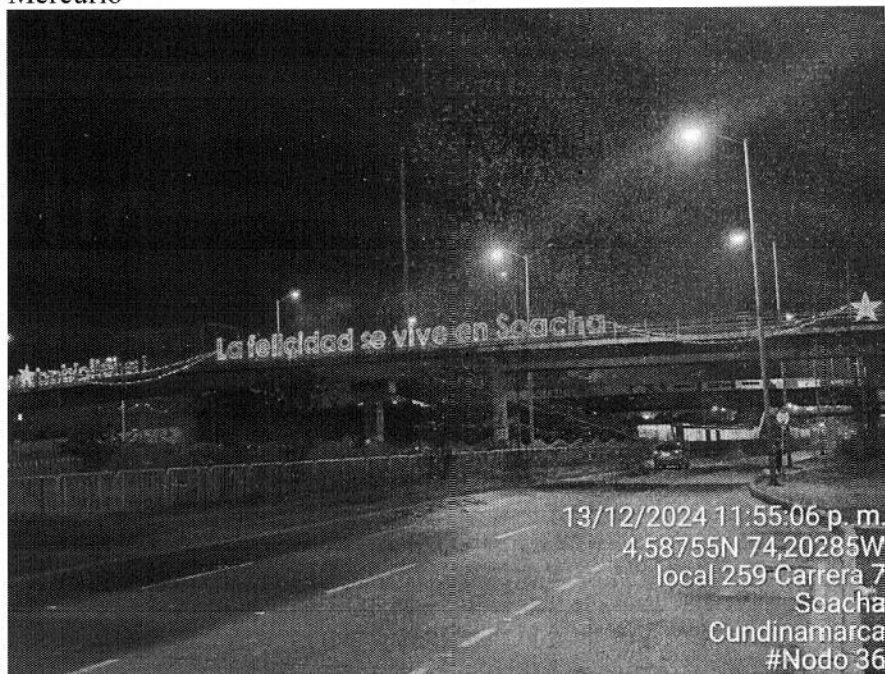

- Puente el Dorado



- Puente Unisur



6. PROBLEMAS PRESENTADOS Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS.

Durante la gestión no se presentaron dificultades relevantes para la ejecución del proyecto.

7. ACTIVIDADES Y GESTIONES.

En el siguiente cuadro se relacionan las cantidades contratadas y las cantidades finalmente instaladas, teniendo en cuenta que hubo sobrantes de material en Cra 7 y los Árboles de Hogares de Soacha y San Matero y que se reubico a otros sitios como fueron San Carlos, Tibanica, Campestre y la Arenosa:

SITIO	Descripción	Cantidad Contratada	Cantidad Instalada
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	MINI LED IND. C:P 20 EXTENSIONES POR PERGOLA	80	80
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	120	120
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	STROBER LED C: W E27 6W 15 STROBERS POR FOLLAJE DE ARBOL PARA 10 ARBOLES	150	150
SOACHA PLAZA	SOCKET BOMBILLO	150	150


PRINCIPAL	STROBER E27		
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	MINI LED IND. C:P 15 MINI LEDS POR ARBOL, PARA 10 ARBOLES	150	150
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	3D ANGEL TROMPETA C: WW 2X4,5X2M 33W	1	1
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 2,8M 83W	5	5
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W	5	5
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 5M 350W	5	5
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ARBOL MAPLE LED 5 M BLAN LED BLAN	5	5
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	16	16
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	TAPA CONCRETO 1.3X0.8M CAJA INSPECCION	12	12
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	2D COLIBRÍ C:WW 2.1X1.46M	6	6
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	6	6
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	2	2
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	Suministro en alquiler, Instalación Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	2500	2500
ALCALDIA	MINI LED IND. BRILLO C:P CASCADAS CON CAIDA DE 1M Y DE 0.8M DONDE 1 EXTENSION CUBRE 0.80 ML	32	32
ALCALDIA	MINI LED IND. BRILLO C:P	2	4
ALCALDIA	MINI LED IND. C:W	6	91
ALCALDIA	STROBER LED C:W E27 6W	40	46
ALCALDIA	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	40	46
ALCALDIA	2D COPITO C:W 1M 17W	4	4

		EPUXUA E.I.C.E. INFORME DE SUPERVISIÓN			
ALCALDIA	2D SEMIARCO TRIANGULO C:W 5X1M	2		2	
ALCALDIA	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	2		2	
ALCALDIA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	0		1	
ALCALDIA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	600		600	
CASA DE LA CULTURA	MINI LED brillos IND. C:P	24		24	
CASA DE LA CULTURA	ROPE LED C:W 21 A 50 M	220		220	
CASA DE LA CULTURA	STROBER LED C:W E27 6W	150		150	
CASA DE LA CULTURA	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	150		150	
CASA DE LA CULTURA	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5	4		4	
CASA DE LA CULTURA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	0		1	
CASA DE LA CULTURA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	600		600	
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	MINI LED IND. C:WW PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	18		18	
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	MINI LED IND. BRILLO C:P PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	18		18	

CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	MINI LED IND. C:W PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	18	18
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	2D HOJA PETALOS C:W 0,6X1,2M UBICADOS EN 8 POSTES	9	9
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	6	6
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1200	1200
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	STROBER LED C:W E27 6W 10 STROBERS POR ARBOL PARA 49 ARBOLES	490	230
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	490	230
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	MINI LED IND. BRILLO C:P 9 EXTENSIONES POR ARBOL	441	110
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	MINI LED IND. C:WW 5 MINI LEDS POR ARBOL	245	127
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA PARA ARBOLES	294	294
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W 8 POR CUADRA	64	64
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	1798	1798
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	1274	1274

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	64	64
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	16	16
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	6	6
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	3500	3500
IGLESIA	2D COPO DIAMANTES C:W 1,5M 21W	3	3
IGLESIA	STROBER LED C:W E27 6W	30	30
IGLESIA	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	30	30
IGLESIA	ROPE LED C:W 21 A 50 M	18	18
IGLESIA	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W FIJADOS EN COLOR FUCSIA	1	1
IGLESIA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	2
IGLESIA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
PARQUE LA ARENOSA	2D FILIGRANA 3 HONDAS C:WW 1,6M	15	15
PARQUE LA ARENOSA	2D RENO TIPO 1 C:W 2,5X1,5M 16W	3	3
PARQUE LA ARENOSA	2D Reno Tipo 3 Blanco 2,5x0,80m 110V 1	3	3
PARQUE LA ARENOSA	2D ESTRELLA 5 PUNTAS C:W 1,1X1,1M	5	5



XUÁ
Empresa Pública de Soacha

EPUXUA E.I.C.E.

**INFORME DE
SUPERVISIÓN**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA

PARQUE LA ARENOSA	2D MARCO LUZ ALTO C:W 3,7X2M	1	1
PARQUE LA ARENOSA	2D BASTON C:R 1,5X1M 8W	15	15
PARQUE LA ARENOSA	MINI LED IND. C:W	0	215
PARQUE LA ARENOSA	MINI LED IND. C:WW	0	215
PARQUE LA ARENOSA	2D ARCO MOSAICO C:B 3,11X3,33M	12	12
PARQUE LA ARENOSA	ROPE LED C:P PARA 2D ARCO MOSAICO C:B 3,11X3,33M	960	960
PARQUE LA ARENOSA	2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	2	2
PARQUE LA ARENOSA	ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA BASTON DE DULCE BLANCO ROJO 0,7x1,5x m 1 DOBLE RECORRIDO	92	92
PARQUE LA ARENOSA	MINI LED IND. BRILLO C:P ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	16	16
PARQUE LA ARENOSA	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT ROSADO PARA 2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	10	10
PARQUE LA ARENOSA	2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	2	2
PARQUE LA ARENOSA	ROPE LED C:W < 20 M PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M DOBLE RECORRIDO	148	148
PARQUE LA ARENOSA	MINI LED IND. BRILLO C:P PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	32	32
PARQUE LA ARENOSA	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT ROSADO PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	18	18
PARQUE LA ARENOSA	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	2	2
PARQUE LA ARENOSA	2D SEMIARCO DREAM C:W 4,57M 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	2	2

 XUA Empresa Pública de Soacha		EPUXUA E.I.C.E.	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	
		INFORME DE SUPERVISIÓN		
PARQUE LA ARENOSA	ROPE LED C:P 21 A 50 M PARA 2D SEMIARCO DREAM C:W 4,57M	232	232	
PARQUE LA ARENOSA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	2	2	
PARQUE LA ARENOSA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	2800	2800	
SAN CARLOS	2D COPITO C:W 1M 17W	15	15	
SAN CARLOS	TUBO REDONDO 2" 4M DIVIDIDO EN 2	10	10	
SAN CARLOS	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	6	6	
SAN CARLOS	2D ESTRELLA 5 PUNTAS C:W 1,1X1,1M	6	6	
SAN CARLOS	2D COPITO C:W 1M 17W	6	6	
SAN CARLOS	TUBO DE 2 PLGX3M GALVANIZADO	18	18	
SAN CARLOS	MINI LED C:WW	0	32	
SAN CARLOS	2D MODULO OLAS C:BCK 2X2M CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	28	28	
SAN CARLOS	MINI LED IND. BRILLO C:P 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	50	50	
SAN CARLOS	MINI LED IND. C:WW5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	45	45	
SAN CARLOS	MINI LED IND. C:W 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	45	45	
SAN CARLOS	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	12	12	

SAN CARLOS	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	288	288
SAN CARLOS	ROPE LED C:P > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	288	288
SAN CARLOS	2D ESTRELLA C:W 0,5M 6 ESTRELLAS POR COSTADO DE CANCHA, PARA 2 CANCHAS UN TOTAL DE 4 COSTADOS	24	24
SAN CARLOS	2D ESTRELLA C:W 0,25M 10 ESTRELLAS POR COSTADO DE CANCHA, PARA 2 CANCHAS UN TOTAL DE 4 COSTADOS	40	40
SAN CARLOS	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	2	2
SAN CARLOS	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1900	1900
SALTO DEL TEQUENDAMA	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	16	16
SALTO DEL TEQUENDAMA	ROPE LED C:P 21 A 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W PARA 8 ARCOS	384	384
SALTO DEL TEQUENDAMA	ROPE LED C:W 21 A 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W PARA 8 ARCOS	384	384
SALTO DEL TEQUENDAMA	2D RENO TIPO 4 C:W 5X3,5M 102W	2	2
SALTO DEL TEQUENDAMA	2D RENO TIPO 6 C:W 5X2M 65W	1	1

SALTO DEL TEQUENDAMA	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	19	19
SALTO DEL TEQUENDAMA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SALTO DEL TEQUENDAMA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	700	700
PARQUE CAMPESTRE	2D ARPA C:WW 2X0,86M 33W 10 ELEMENTOS POR CUADRA	30	30
PARQUE CAMPESTRE	2D HOJA PETALO C:W 2,2X1,3M 19W 3 ELEMENTOS POR CUADRA	9	9
PARQUE CAMPESTRE	2D ESTTELLA ARABESCO C:G 1,9X1,9M 3 ELEMENTOS POR CUADRA	9	9
PARQUE CAMPESTRE	ROPE LED C:P > 50 M PARA 2D ESTTELLA ARABESCO C:G 1,9X1,9M	396	396
PARQUE CAMPESTRE	2D ARABESCO TIPO 1 C:W 2X1M 15W 5 ELEMENTOS POR CUADRA	15	15
PARQUE CAMPESTRE	ESTRELLA CON DESFASE DORADA BLANCO CÁLID 1 ELEMENTOS POR CUADRA	3	3
PARQUE CAMPESTRE	2D PESEBRE C:W 4X4M 250W UBICADO EN LA CUADRA CENTRAL DEL PARQUE	1	1
PARQUE CAMPESTRE	MINI LED IND. C:W	0	152
PARQUE CAMPESTRE	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W 2 POR CUADRA	3	3
PARQUE CAMPESTRE	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W 2 POR CUADRA	3	3
PARQUE CAMPESTRE	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	7	7

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

PARQUE CAMPESTRE	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	3	3
PARQUE CAMPESTRE	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	2800	2800
SECRETARIA DE GOBIERNO	STROBER LED C:W E27 6W	100	100
SECRETARIA DE GOBIERNO	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	100	100
SECRETARIA DE GOBIERNO	ROPE LED BRILLO C:P > 50 M	337	337
SECRETARIA DE GOBIERNO	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W	2	2
SECRETARIA DE GOBIERNO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SECRETARIA DE GOBIERNO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	980	980
PARQUE TIBANICA	2D COLCHA RETAZOS C:M 0,25M	15	15
PARQUE TIBANICA	ROPE LED C:P 21 A 50 M PARA COLCHA	89	89
PARQUE TIBANICA	MINI LED IND. BRILLO C:P 3 MINI LEDS POR COLCHA	45	45
PARQUE TIBANICA	2D COLCHA RETAZOS C:B 0,6M	15	15
PARQUE TIBANICA	ROPE LED C:W 21 A 50 M	90	90
PARQUE TIBANICA	MINI LED IND. C:W 3 MINI LEDS POR COLCHA	45	45
PARQUE TIBANICA	3D ARBOL MODULO C:W	8	8

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

PARQUE TIBANICA	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	38	38
PARQUE TIBANICA	MINI LED IND. C:W	0	110
PARQUE TIBANICA	MINI LED IND. C:WW	0	30
PARQUE TIBANICA	ARBOL MAPLE LED 5 M BLAN LED BLAN	1	1
PARQUE TIBANICA	TAPA CONCRETO 1.3X0.8M CAJA INSPECCION	1	1
PARQUE TIBANICA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
PARQUE TIBANICA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1400	1400
PASEO DE SAN MATEO	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	4	4
PASEO DE SAN MATEO	EST. ÁRBOL ANILLOS MARCA 12M	1	1
PASEO DE SAN MATEO	3D ESTRELLA VOLUMÉTRICA CON NUC C:W 3M	1	1
PASEO DE SAN MATEO	ROPE LED C:P > 50 M	411	411
PASEO DE SAN MATEO	MINI LED IND. C:W	350	88
PASEO DE SAN MATEO	MINI LED IND. C:WW	150	97
PASEO DE SAN MATEO	MINI LED IND. C:P	0	78
PASEO DE SAN MATEO	STROBER LED C:W E27 6W	0	140
PASEO DE SAN MATEO	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	0	160
PASEO DE SAN MATEO	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL ARBOL HASTA UNA ALTURA DE 3 M	38	38

PASEO DE SAN MATEO	ROPE LED C:P 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	192	192
PASEO DE SAN MATEO	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W	2	2
PASEO DE SAN MATEO	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W	2	2
PASEO DE SAN MATEO	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	42	42
PASEO DE SAN MATEO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
PASEO DE SAN MATEO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1800	1800
COLISEO LEON XIII	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 2,8M 83W	2	2
COLISEO LEON XIII	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	5	5
COLISEO LEON XIII	2D PESEBRE C:W 4X4M 250W	1	1
COLISEO LEON XIII	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W 4 PROYECTORES FIJADOS EN COLOR MAGENTA (ROSADO)	4	4
COLISEO LEON XIII	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W 2 PROYECTORES FIJADOS EN COLOR BLANCO	2	2
COLISEO LEON XIII	MINI LED SILICON C:W	6	14
COLISEO LEON XIII	MINI LED SILICON C:W	0	6
COLISEO LEON XIII	2D RENO TIPO 1 C:W 2,5X1,5M 16W	2	2
COLISEO LEON XIII	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja	1	1

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

	Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido		
COLISEO LEON XIII	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1200	1200
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Jose pesebre vol C:n/a 4,5 m F	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	MINI LED IND. C:WW	49	49
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Maria 4,5m	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	MINI LED IND. C:WW	49	49
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Niño Jesus 1,9m	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	MINI LED IND. C:WW	11	11
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D ANGEL 4.5M	3	3
GLORIETA CIUDAD VERDE	MINI LED IND. C:WW 50 EXTENSIONES POR CADA ANGEL	150	150
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Accesorios rey mago 1 Negro	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Accesorios rey mago 2 Negro	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Accesorios rey mago 3 Negro	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W	3	3
GLORIETA CIUDAD VERDE	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	3	3
GLORIETA CIUDAD VERDE	2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	4	4
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	80	80
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA ROSADO PARA 2D	20	20

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

	ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M		
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA DORADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	12	12
GLORIETA CIUDAD VERDE	2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	4	4
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	80	80
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA ROSADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	20	20
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA DORADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	60	60
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D RENO 1,2X2,5M 27W	4	4
GLORIETA CIUDAD VERDE	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1300	1300
GLORIETA HOGARES SOACHA	EST. ÁRBOL ANILLOS MARCA 12M	1	1
GLORIETA HOGARES SOACHA	3D ESTRELLA VOLUMÉTRICA CON NUC C:W 3M	1	1
GLORIETA HOGARES SOACHA	ROPE LED C:WW > 50 M	411	411

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

GLORIETA HOGARES SOACHA	MINI LED IND. C:W	350	111
GLORIETA HOGARES SOACHA	MINI LED IND. C:WW	150	15
GLORIETA HOGARES SOACHA	MINI LED IND. C:P	0	225
GLORIETA HOGARES SOACHA	STROBER LED C:W E27 6W	0	140
GLORIETA HOGARES SOACHA	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	0	160
GLORIETA HOGARES SOACHA	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL ARBOL HASTA UNA ALTURA DE 3 M	38	38
GLORIETA HOGARES SOACHA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
GLORIETA HOGARES SOACHA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ELEMENTO 2D VIVE LA NAVIDAD EN SOACHA DE 32M	2	2
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ROPE LED C:P > 50 M < 20 M REMANUFACTURA PARA 2D FELICIDAD C:W 1,52X2,9M	460	460
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LETRERO FELIZ NAVIDAD TE DESEA SOACHA C:P C:W 14X1,2M	56	56

&

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	2D COLIBRÍ C:WW 2.1X1.46M	4	4
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	2D ARABESCO TIPO 3 C:W 2X1M 15W J	8	8
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	160	160
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA	2	2
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ROPE LED C:P > 50 M < 20 M REMANUFACTURA PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	480	480
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	50	50
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5	4	4
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	MINI LED IND. BRILLO C:P	48	48
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	160	160

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	2D REGALO PEQUEÑO C:R 1,66X1,6M 25W	4	4
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	MINI LED IND. BRILLO C:P	60	60
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	160	160
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	2D HOJA PETALOS C:W 0,6X1,2M	8	8
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	MINI LED IND. BRILLO C:P	100	100
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	MINI LED IND. C:WW	64	64
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	MINI LED IND. C:W	64	64



XUÁ
Empresa Pública de Soacha

EPUXUA E.I.C.E.

**INFORME DE
SUPERVISIÓN**




ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA

SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	2D ESTRELLA ARABESCO C:M 1,9X1,9M TODOS LOS ELEMENTOS EN POSTES VAN DISTRIBUIDOS EN UN RECORRIDO LINEAL DE 6.500 ML APROX. COMO CADA 160 M APROX.	4	4
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ELEMENTO 2D SOACHA COMPARTE LA NAVIDAD	2	2
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ROPE LED C:P > 50 M REMANUFACTURA PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	420	420
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	60	60
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	160	160
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500

Se anexa cuadro en Excel con el detalle de cantidades y costos.

8. ENTREGA DE PROYECTOS Y CONTEO DE MATERIALES.

Por último se realizó el pasado 13 de Diciembre visita en conjunto con la persona designada por Epuxua, para realizar conteo de materiales en sitio de las cantidades contratadas vs las instaladas de 10 de los 21 sitios, encontrando en términos general las cantidades acordes, excepto con unas pequeñas observaciones de movimientos adicionales solicitados, o pendientes como los del parque que se ejecutaran una vez desmonten la tarima, también estaba pendiente la instalación de 12 cajas de publicidad que se ejecutarían el fin de semana y la instalación de las miniled que fueron reubicadas de sitio, puntualmente del parque campestre. A continuación, se muestran las notas del acta de recorrido realizada este día

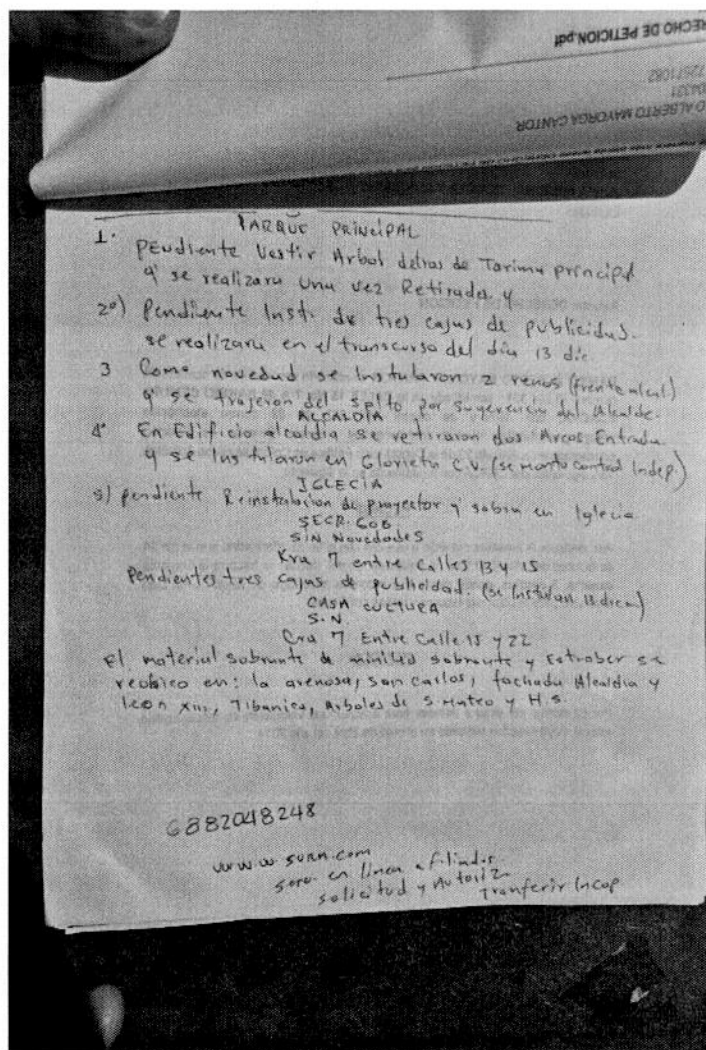

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

9. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA PROPUESTO SOACHA Ver. Nov 13			
ITEM	SITIO	Fecha Encendido	Notas aclaratorias
1	FACHADA ALCALDIA	6/12/2024	
2	SECRETARIA DE GOBIERNO	6/12/2024	
3	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	7/12/2024	
4	CARRERA 7 DE CLL 13 A CLL 22	7/12/2024	Se realiza ejecución con entrega parcial de encendido en un mínimo del 70%. El 30% restante se encendera a mas tardar el 10-12-24
5	CASA DE LA CULTURA	7/12/2024	
6	IGLESIA	6/12/2024	
7	GLORIETA CIUDAD VERDE	7/12/2024	
8	SALTO DEL TEQUENDAMA	7/12/2024	Se realiza ejecución con entrega parcial de encendido en un mínimo del 70%. El 30% restante se encendera a mas tardar el 9-12-24
9	PASEO DE SAN MATEO	7/12/2024	Se realiza ejecución con entrega parcial de encendido en un mínimo del 70%. El 30% restante se encendera a mas tardar el 10-12-24
10	PARQUE TIBANICA	8/12/2024	
11	GLORIETA HOGARES SOACHA	8/12/2024	
12	CCLISEO LEON XIII	9/12/2024	
13	PARQUE CAMPESTRE	9/12/2024	
14	SAN CARLOS	12/12/2024	
15	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA / COMANDO	11/12/2024	
16	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	11/12/2024	
17	SOCHA PUENTE 3 CURVO EL DORADO	11/12/2024	
18	SOACHA PUENTE 4 PEATONAL CALLE 22	11/12/2024	
19	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL SAN HUMBERTO	11/12/2024	
20	PARQUE LA ARENOSA	12/12/2024	

8

10.PERSONAL INVOLUCRADO Y NOVEDADES.

El recurso utilizado para la ejecución del proyecto cumplió con lo definido del contrato y en las condiciones indicadas a continuación, se relaciona el personal dispuesto para la ejecución del proyecto, con la relación de vehículos y se anexan los pagos de los parafiscales respectivos.

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	



CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	# MOVIL	VEHICULO	TURN O	TIPO
79974666	GARCES VARGAS GUSTAVO WILSON	Líder	M51	WLT691	TURN O A	LIVIANO
7723182	ROJAS SERRANO DIEGO ANDRES	Operario				
1030570278	JHEISON FERNANDO CASTILLO PARDO	Líder	M130	GKV789	TURN O A	CANASTA
79831641	FREDY ALFONSO CASTRO CASTILLO	Operario				
80145451	OTALORA PORRAS JIMMY ANGEL	Líder	M30	WNS597	TURN O C	LIVIANO
1122119344	CHRISTIAN CAMILO CUINTACO BARBOSA	Operario				
1096188104	GABRIEL ARBOLEDA PINZON	Líder	M55	GKV789	TURN O C	CANASTA
1090392595	JOSE FERNANDO CIFUENTEZ PEREZ	Operario				
79245662	FREDY QUIJANO	Líder	M35	WCU301	TURN O C	LIVIANO

74

	EPUXUA E.I.C.E.	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

11. ANEXOS

- Parafiscales
- Cuadro Excel cantidades y precios

ELABORADO	APROBADO
	
JUAN HERNANDEZ Director AP CTO. 147-2024	LUIS CAMILO TORRES Supervisor del CTO 147-2024. 
