

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

EPUXUA E.I.C.E

**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL ALUMBRADO NAVIDEÑO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024
(CONTRATO DERIVADO 147 -2024)**

**GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO MONTAJE PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO
PUBLICO NAVIDEÑO 2024 SOACHA - CUNDINAMARCA**

**FEBRERO DE 2025
SOACHA, CUNDINAMARCA** *yl*

Tabla de contenido

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3071 DE 2024..... 4

1. INFORMACION DE LOS CONTRATOS 4

1.1 Contrato Interadministrativo 4

1.2 Contrato Derivado 5

1.3 Acta De Inicio..... 7

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8

3.1 Alumbrado Tradicional 9

3.2 Show Laser Salto De Tequendama 9

4. DESARROLLO Y AVANCE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES..... 10

4.1 Alumbrado Tradicional. 10

4.2 Show Laser Salto Del Tequendama 10

5. CRONOGRAMA: 11

6. RECORRIDOS DE MANTENIMIENTO 12

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO..... 34

8. ETAPA DE PRUEBAS Y MONTAJE 40

8.1 Alumbrado Tradicional 40

8.2 Salto De Tequendama (Show Laser)..... 52

9. STORY BOARTH INICIAL DEL SHOW, PARA INICIAR LA FASE DE DISEÑO 55

10. PROCESO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 62

11. PROBLEMAS PRESENTADOS Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS. 68

12. ACTIVIDADES Y GESTIONES. 68

12.1 Navidad Tradicional 68

13. ILUMINACION SALTO DE TEQUENDAMA..... 87

14. PROYECCION LASER SALTO DE TEQUENDAMA 88

15. ILUMINACIÓN GRÁFICA Y DINÁMICA 93

16. ENTREGA DE PROYECTOS Y CONTEO DE MATERIALES..... 94

17. PERSONAL INVOLUCRADO Y NOVEDADES 95

17.1 Iluminacion Tradicional 96

17.2 Show Laser Salto De Tequendama 97

18. PROCESO DE DESMONTE. 97

2

19. ESTADO FINAL	118
20. POLIZAS.....	143
Como respaldo a la ejecución del contrato, se cuenta con las siguientes pólizas:	143
20.1 Póliza de Cump:imiento.....	143
20.2 Póliza de responsabilidad civil extracontractual.....	145
21. ANEXOS	146

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3071 DE 2024

PERIODO DE INFORME: 15/11/2024 AL 30/01/2025

FECHA DE INFORME: 21 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3071 DE 2024.

OBJETO: GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO MONTAJE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2024 SOACHA – CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: ENEL COLOMBIA S.A ESP. NIT: 860.063.875-8

1. INFORMACION DE LOS CONTRATOS

1.1 Contrato Interadministrativo

OBJETO: GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO MONTAJE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2024 SOACHA – CUNDINAMARCA.	
Valor Inicial	\$3.699.378.558
Valor adición	NA
Prorrogas	NA
Valor Total	\$3.699.378.558
Contratista	GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO MONTAJE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2024 SOACHA – CUNDINAMARCA.

Fecha de Inicio	25/10/2024
Fecha de terminación	31/12/2024
Prorrogas	30 días
Fecha de terminación	30-01-2025
Avance de obra o labor	99 días
Avance financiero	\$113,827,032.00
Suspensión	N/A
Actividades	Supervisión al contrato de alumbrado navideño No 147-2024 prestación de servicios para el diseño, montaje, y puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño en Soacha – Cundinamarca en el marco del contrato interadministrativo 3071-2024 suscrito con la alcaldía municipal de Soacha

Nota: El avance financiero solamente tiene el pago del 80% de la cuota de gerencia de secretaria de Infraestructura a Epuxua. El ultimo pago del 20% de la cuota de gerencia se completa contra acta de liquidación.

No se han hecho pagos al contratista Enel (bolsa de mandato) los cuales están en trámite. Los pagos parciales por el 80% equivalente a \$ 3,201,385,290.00 (45% + 45% primer y segundo pago) se encuentran en trámite en el área financiera de Epuxua. El 10% equivalente a \$ 355,709,478.00 se paga contra acta de liquidación.

1.2 Contrato Derivado

Para el desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 3071 de 2024, se da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el *Acuerdo No. 012 de 2023- Manual De Contratación De La Empresa Pública Del Municipio De Soacha - Epuxua E.I.C.E.*, y se realizó el proceso de contratación del contrato derivado: 121-2024

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	
Valor Inicial	\$ 3.557.094.768
Valor adición	NA
Prorrogas	NA
Valor Total	\$ 3.557.094.768
Contratista	ENEL COLOMBIA SA ESP IDENTIFICADA CON NIT 860.063.875 8
Fecha de Inicio	15/11/2024
Fecha de terminación	31/12/2024
Prorroga	30 días
Fecha de terminación	30/01/2025
Avance de obra o labor	78 días

Avance financiero	\$ 0
Suspensión	N/A
Actividades del último mes	supervisión al contrato de alumbrado navideño no 1472024 prestación de servicios para el diseño, montaje, y puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño en Soacha – Cundinamarca en el marco del contrato interadministrativo 3071-2024 suscrito con la alcaldía municipal de Soacha

Nota: No se han hecho pagos al contratista Enel (bolsa de mandato) los cuales están en trámite. Los pagos parciales por el 90% equivalente a \$ 3,201,385,290.00 (45% + 45% primer y segundo pago) se encuentran en trámite en el área financiera de Epuxua. El 10% equivalente a \$ 355,709,478.00 se paga contra acta de liquidación

1.3 Acta De Inicio

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Origen: GJPR-02
	ACTA DE INICIO	Versión: 4.0 Fecha: 2023/03/04

CONTRATO N° Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N°3071 de 2024 - 25/10/2024		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
OBJETO	"GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO 2024 SOACHA - CUNDINAMARCA"		
VALOR	\$1.899.378.558,00		
CONTRATISTA (nombre y cédula)	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA-EPUXUA AVANZA E.I.C.E. NR 901.511.522-4		
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE		
CDP	4313 de 21/09/2024	CDP	5253 de 28/10/2024
POLIZA	N/A	FECHA EXPIRACION	N/A
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA EN SECOP II	N/A		

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 26 de Octubre de 2024, el cual debe concluir el día 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Soacha - Cundinamarca el día 26 de Octubre de 2024.

Firma 	Firma 
NOMBRE: JUAN ESTEBAN OJEDA SALCEDO	NOMBRE: CARLOS ARTURO BELLO BONILLA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	en representación de la EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C.E
SUPERVISOR	CONTRATISTA

Proyecto: J.García/SuarezH - Abogado SI

Nota:
Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Origen: GJPR-02
	ACTA DE INICIO	Versión: 4.0 Fecha: 2023/03/04

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse aprobada por el MUNICIPIO.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplica, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte del MUNICIPIO en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y verificar el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato, formato que deberá estar anexo al Acta de Inicio.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENIOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, inclusive los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante EL MUNICIPIO, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, inclusive los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de designación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.





CONTRATO N°:	CD-147-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.
VALOR	TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$3.557.004.768) MCTE, incluye el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar con ocasión de su celebración, ejecución, y liquidación.
CONTRATISTA	ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P IDENTIFICADA CON NIT 866.063.875-8
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato antesmencionado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 15 de noviembre de 2024, con fecha probable de terminación el 31 de diciembre de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el 15 de noviembre de 2024.

Por la Entidad:	Por la Contratista:
 LUIS CAMILO TORRES HERNÁNDEZ SUBGERENTE TÉCNICO SUPERVISOR	 ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P IDENTIFICADA CON NIT 866.063.875-8 RLS: CARLOS MARIO RESTREPO MOLINA C.C No. 79.148.788 DE BOGOTÁ

Proyecto: Yassir Racheirino Obando Torres - Profesional Universitario 5 Secretaría General



www.epuxua.gov.co

Carretera P# 18 - 37 Soacha - Cundinamarca
epuxua@epuxua.gov.co
No. 400 5 1000

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo el diseño, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño 2024 en Soacha - Cundinamarca. Este proyecto se llevará a cabo con la instalación del alumbrado navideño en los puntos o sectores más emblemáticos del municipio. Este proyecto se llevará a cabo con la instalación del alumbrado navideño en los puntos o sectores más emblemáticos del municipio de BT y MT, a su vez el alumbrado de las luminarias existentes correspondientes a cada centro de distribución para su energización.

Paralelamente, se desarrolla el montaje del show laser en el salto del Tequendama. Este proyecto se llevará a cabo con la instalación de equipos de laser, sonido e iluminación en uno de los sectores más emblemáticos del municipio su energización.


3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se realiza en el casco urbano del municipio de Soacha Cundinamarca.

3.1 Alumbrado Tradicional



3.2 Show Laser Salto De Tequendama

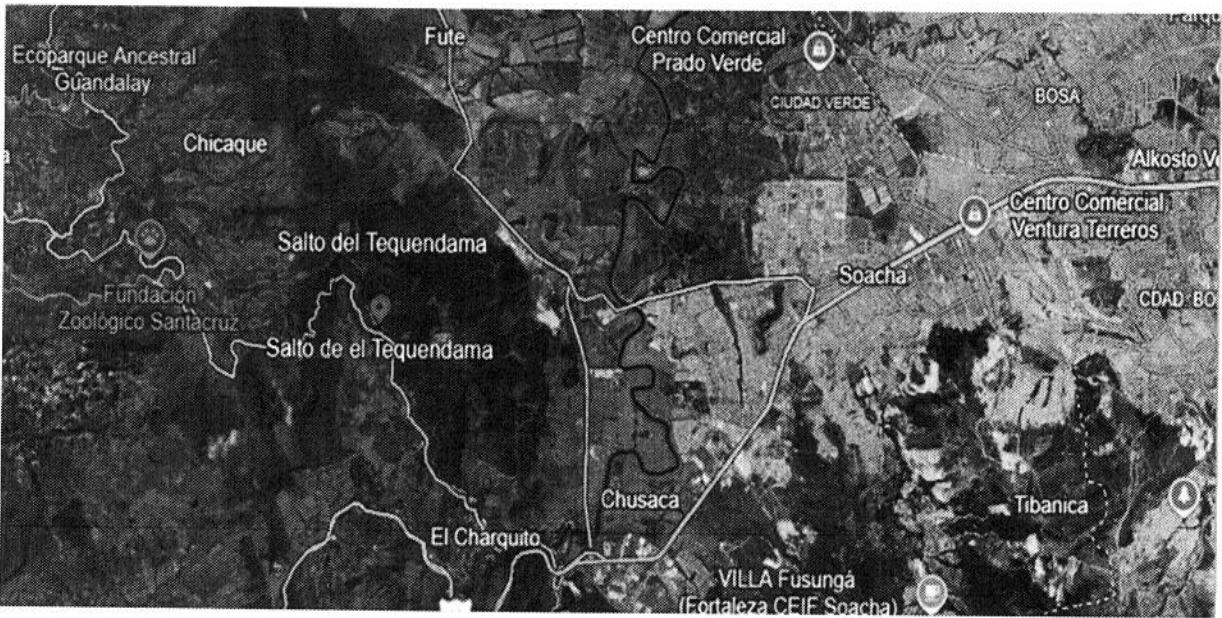

4. DESARROLLO Y AVANCE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

4.1 Alumbrado Tradicional.

Para este informe se realiza el reporte de actividades realizadas durante el periodo de funcionamiento de la Navidad en la cual se realizó recorrido por parte de la interventoría de navidad de parte de ENEL, que se hacía cada 48 horas para validar el correcto funcionamiento y posibles fallas y se reportaban internamente para la corrección de estas, la atención se realizó en todos los sitios construidos como se relacionan a continuación:

ITEM	SITIO
1	FACHADA ALCALDIA
2	SECRETARIA DE GOBIERNO
3	SOACHA PLAZA PRINCIPAL
4	CARRERA 7 DE CLL 13 A CLL 22
5	CASA DE LA CULTURA
6	IGLESIA
7	GLORIETA CIUDAD VERDE
8	SALTO DEL TEQUENDAMA
9	PASEO DE SAN MATEO
10	PARQUE TIBANICA
11	GLORIETA HOGARES SOACHA
12	COLISEO LEON XIII
13	PARQUE CAMPESTRE
14	SAN CARLOS
15	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA / COMANDO
16	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO
17	SOCHA PUENTE 3 CURVO EL DORADO
18	SOACHA PUENTE 4 PEATONAL UNISUR
19	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL SAN HUMBERTO
20	PARQUE LA ARENOSA

4.2 Show Laser Salto Del Tequendama

- Alcance aprobado:

Proyecto de show laser (en adelante el “Proyecto”) Consiste en un show de proyección láser sobre los paredones del salto del Tequendama y cascada por un periodo de 24 días consecutivos durante la temporada decembrina del 2024, el show consta de: diseño, producción y reproducción de una pieza audio visual, la cual encajara y coordinará con la estructura física del salto del Tequendama , esta pieza tendrá un espacio de introducción y menciones según lineamientos del cliente,

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

así como una pieza temática con animaciones en vectores y líneas, texturas, de más o menos 8 minutos en su duración total, la edición y musicalización y diseño sonoro se realizan en función de la animación vectorial realizado a partir de una creación del guion con el cliente. Para el desarrollo de este se usarán 7 equipos de láser de 40 watts, los cuales se interconectarán con un sistema de audio con amplificación para un aforo aproximado de 200 personas por espectáculo, controlados desde una consola digital. Todo el montaje contará con un sistema de elevación en estructura scaffold o trust recubierto con poli sombra negra al 80%.

Este espectáculo incluye todos los técnicos de montaje, jefe de producción como los técnicos de soporte y reproducción, así como el servicio de seguridad privada durante 24 horas por la duración de todo el montaje y reproducción.

- El espectáculo tendrá un funcionamiento desde el 7 de diciembre hasta el 30 de diciembre con una frecuencia de un show aproximadamente cada 30 minutos con una duración aproximada de 10 minutos en programación y 20 minutos en tránsito de aforo de público entre shows, iniciando con la primera función desde las 6:30 pm y terminando los días entre semana a las 10 pm el último show y en fin de semana a las 11 pm el último show.

- Aunque la gestión y coordinación estarán en cabeza del contratista, el alcance del contratista no incluye trámite de permisos, plan de control logístico o plan de control de emergencias o aforo, el cual deberá estar a cargo de la administración de Soacha. Sin embargo, desde el contratista se realizará las coordinaciones y seguimiento al trámite y disposición por parte de la administración de Soacha de la realización de las acciones logísticas de control y manejo para este espectáculo.

- Para el montaje de los equipos como punto de ubicación se estableció entre las partes se puedan ubicar en la terraza inferior de una de las casetas como punto de proyección y ubicación de los equipos.

- **Etapas Ejecución:**

Para dar cumplimiento a los cronogramas se inicia ejecución el día 15 de noviembre para entrega el 7 de diciembre como fecha de encendido, a continuación, se relaciona algún registro fotográfico el proceso de ejecución, así como hitos del desarrollo del show:

5. CRONOGRAMA:

ITEM	SITIO	Fecha Encendido	Notas aclaratorias
1	FACHADA ALCALDIA	6/12/2024	
2	SECRETARIA DE GOBIERNO	6/12/2024	
3	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	7/12/2024	
4	CARRERA 7 DE CLL 13 A CLL 22	7/12/2024	Se realiza ejecución con entrega parcial de encendido en un minimo
5	CASA DE LA CULTURA	7/12/2024	
6	IGLESIA	6/12/2024	
7	GLORIETA CIUDAD VERDE	7/12/2024	
8	SALTO DEL TEQUENADAMA	7/12/2024	Se realiza ejecución con entrega parcial de encendido en un minimo
9	PASEO DE SAN MATEO	7/12/2024	Se realiza ejecución con entrega parcial de encendido en un minimo
10	PARQUE TIBANICA	8/12/2024	
11	GLORIETA HOGARES SOACHA	8/12/2024	
12	COLISEO LEON XIII	9/12/2024	
13	PARQUE CAMPESTRE	9/12/2024	
14	SAN CARLOS	12/12/2024	
15	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA / COMANDO	11/12/2024	
16	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	11/12/2024	
17	SOACHA PUENTE 3 CURVO EL DORADO	11/12/2024	
18	SOACHA PUENTE 4 PEATONAL UNISUR	11/12/2024	SE TRASLADA ILUMINACION DE PEATONAL CLL 22 A PEATONAL UNISUR
19	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL SAN HUMBERTO	11/12/2024	
20	PARQUE LA ARENOSA	12/12/2024	

6. RECORRIDOS DE MANTENIMIENTO

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
COLISEO LEON XIII	SITIO NO ENCENDIO	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	CUBO CON MINILED MORADA APAGADA	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	COPO DE NIEVE CON TRAMOS DE MANGUERA APAGADA	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	COPO DE NIEVE CON SECCION APAGADA	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ARBOL DE 15 METROS APAGADO	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	4 MAPLES APAGADOS	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	SIN FALLAS	6/12/2024	6/12/2024	CERRADA

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
SALTO DE TEQUEDAMA	SIN FALLAS	6/12/2024	6/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	RENO CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	PISTILO CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ESTRELLA EN PISO CON MINILED APAGADA	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	SIN FALLAS	6/12/2024	6/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ELEMENTO BASTON EN PISO CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	8/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ELEMENTO ESPIRAL CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	8/12/2024	10/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
SECRETARIA DE GOBIERNO	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	MAPLE DE 5M CON RAMAS APAGADAS	8/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	MAPLE DE 2.8M MORADO CON RAMAS APAGADAS	8/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	MAPLE DE 5M CON RAMAS APAGADAS	8/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	NO ENCENDIO	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	NO ENCENDIO	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ELEMENTO RENO CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	NO ENCENDIO	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	ENCENDIO LA MITAD DE LA PLAZA	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	LIANAS DE MINILED APAGADAS AL COSTADO DE LAS LETRAS	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
PARQUE LA ARENOSA	RENO EN PISO APAGADO	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ARCO APAGADO ENTRADA AL CAMINO	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ELEMENTO ESPIRAL EN PISO APAGADO AL LADO DEL CAMINO	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	BASTON EN PISO APAGADO AL LADO DEL CAMINO	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ARCO A LA ENTRADA AL PARQUE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	NO ENCENDIO	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
SAN HUMBERTO				
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	PROYECTOR APAGADO PARTE ALTA DE LA FACHADA	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	TIRA DE MINILED APADADA EN FACHADA	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ESTRELLA EN POSTE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ELEMENTO FLOR EN POSTE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ELEMENTO ARPA EN POSTE CON TIRAS DE MINILED APAGADOS	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ELEMENTO ARPA EN POSTE CON TIRAS DE MINILED APAGADOS	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ELEMENTO ARABESCO EN PISO APAGADO	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	SEMIARCO EN PISO CON TRAMOS DE MANGUERA APAGADA FRENTE A 17-52	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	CAJA DE PUBLICIDAD EN POSTE APAGADA CR7 CALLE 18 ESQUINA	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	RENO CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA ENTRADA AL PARQUE	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ARCO CON TRAMO DE MANGUERA BLANCA APAGADA CONCHA ACUSTICA	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ESTRELLA EN POSTE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ELEMENTO FLOR EN POSTE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
PARQUE CAMPESTRE	ARPA EN POSTE CON TIRAS DE MINILED APAGADAS	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ARPA EN POSTE CON TIRAS DE MINILED APAGADAS	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ELEMENTO ARABESCO EN PISO APAGADO	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	FIGURA ANGEL 4.5m CON TIRAS DE MINILED APAGADAS	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	FIGURA ANGEL 4.5m CON TIRAS DE MINILED APAGADAS	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	RETIRO DE RENO DEL SITIO PARA ARREGLO CONTRATISTA	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	2 PROYECTORES APAGADOS EN FACHADA COLISEO	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	TIRA DE MINILED APADADA EN FACHADA	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ESTRELLA EN POSTE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
PARQUE SAN CARLOS	ESTRELLA EN POSTE APAGADA	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	COPO DE NIEVE APAGADO EN POSTE	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	COLIBRI EN PISO APAGADO REVISAR URGENTE FRENTE ALCALDIA	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	PASACALLE CON TRAMO DE MINILED APAGADA FRENTE A # 13-27	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ELEMENTO FLOR EN POSTE APAGADA FRENTE A #13-59	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ARBOL CON TIRAS DE MINILED APAGADAS FRENTE A #19-19	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	TIRA DE MINILED APADADA EN TRONCO DE ARBOL FRENTE A #15-54	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
PUENTE PEATONAL UNISUR	NO ENCENDIO	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	2 CAJAS DE PUBLICIDAD EN POSTE APAGADAS COSTADO SUR DEL PUENTE	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	FIGURA COLIBRI EN EL PUENTE APAGADA COSTADO SUR	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ELEMENTO OLAS CON TRAMOS DE MINILED APAGADAS	18/12/2024	19/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ELEMENTO OLAS EN PISO APAGADO	18/12/2024	19/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ESTRELLA EN POSTE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ESTRELLA EN POSTE APAGADA	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	COPO DE NIEVE APAGADO EN POSTE	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL UNISUR	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
PARQUE TIBANICA	ARBOL MODULO CON TRAMOS DE MANGUERA APAGADA	18/12/2024	19/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	ARBOL MODULO CON TRAMOS DE MANGUERA APAGADA LADO DE CASETA	18/12/2024	19/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	2 PROYECTORES APAGADOS FACHADA COLISEO	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	FIGURA ANGEL 4.5m CON TIRAS DE MINILED APAGADAS	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	FIGURA ANGEL 4.5m CON TIRAS DE MINILED APAGADAS	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	1 PROYECTOR APAGADO FACHADA COLISEO	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL UNISUR	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL UNISUR	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	TIRA DE MINILED BLANCA APAGADA EN LA PATRTE TRASERA DEL ARCO DE LA CANCHA DE FUTBOL	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
VENTURA COMANDO				
COLISEO LEON XIII	1 PROYECTOR APAGADO FACHADA COLISEO	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	TOTALMENTE APAGADA	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL LA DESPensa	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	CABLES EXPUESTOS EN ZONA VERDE DE CANCHA DE MICROFUTBOL	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	MITAD DE LA GLORIETA APAGADA	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL UNISUR	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA



SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	REFLECTOR APAGADO EN ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA DE MURO DE COLISEO	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	MAPLE 5 METROS APAGADO	25/12/2024	26/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	2 REFLECTORES EN LA PARTE SUPERIOR DE FACHADA DE COLISEO APAGADOS	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA



SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	RAMAS DE MAPLE DE 2.5, CAIDAS DIAGONAL A MONUMENTO SOACHA	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL UNISUR	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	MINILED EN COPA DE ARBOLES APAGADAS, AL COSTADO DEL PARQUE	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL UNISUR	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA

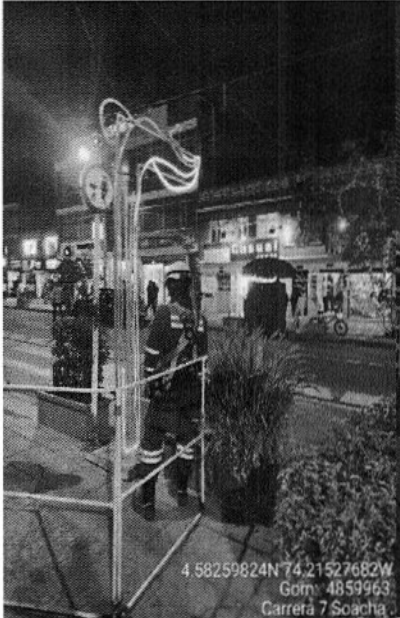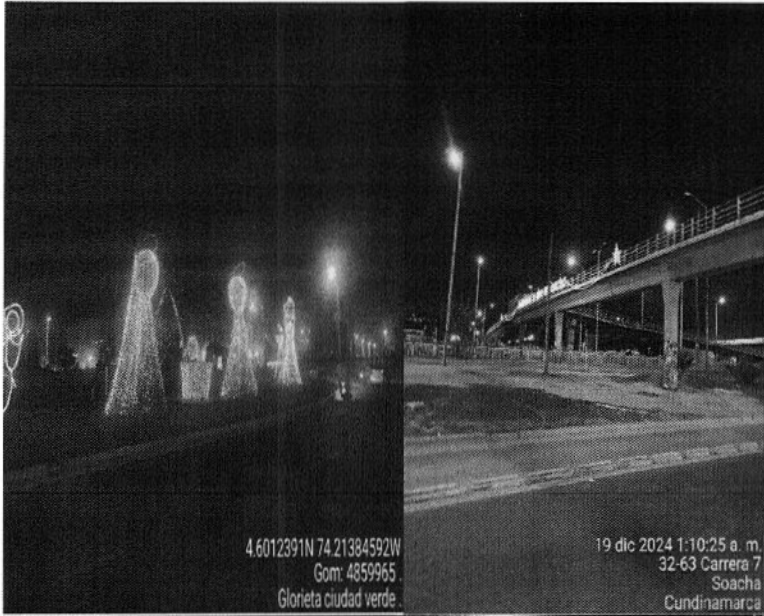

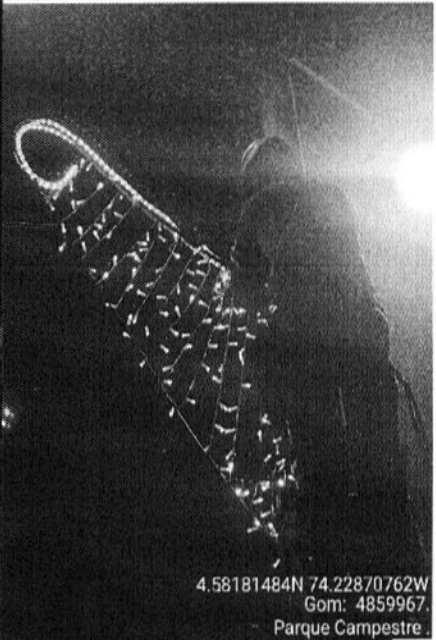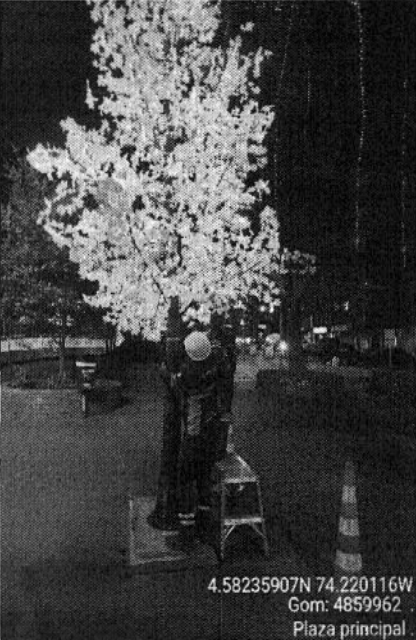



8. ETAPA DE PRUEBAS Y MONTAJE


8.1 Alumbrado Tradicional

Después de 20 días de ejecución para el día 5 de diciembre se contaba con un buen avance de ejecución donde se logró avanzar y finalizar la ejecución de 16 de los 21 sitios pactados previo al día de encendido, para lo cual se realizó recorrido en

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

conjunto con personal de Epuxua entre ellos los supervisores del contrato Camilo Torres y Juan Pablo Hernandez entre otros, para la verificación del encendido y el cual se encontrara acorde a los render propuestos, este día se visitaron en conjunto los siguientes sitios, Parque Principal, carrera 7, las fachadas de Alcaldía, Iglesia, Secretaria de Gobierno y casa de la Cultura, Salto del Tequendama y Parque la Arenosa, a continuación se presentan algunas fotos de los sitios recorridos:

- Parque Principal

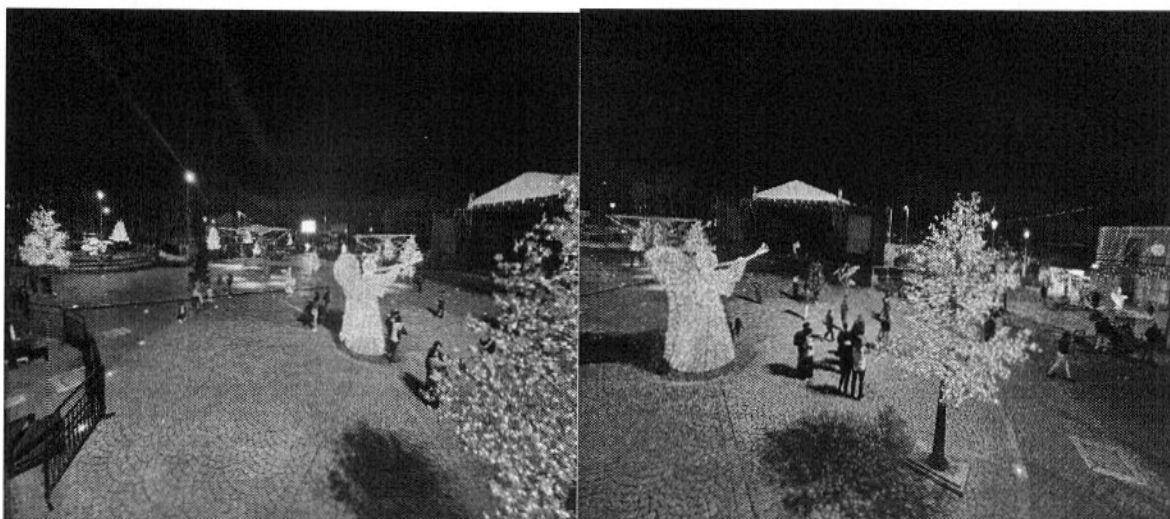


- Fachada Alcaldía




- Fachada Iglesia




- Fachada Secretaria de Gobierno

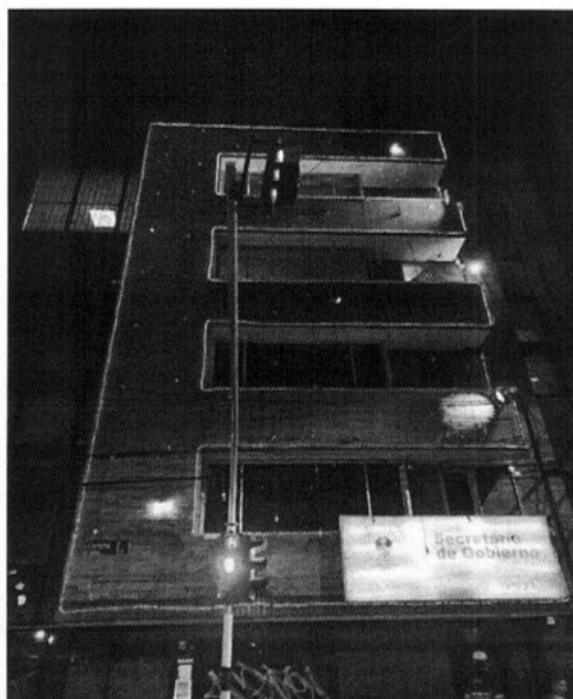

- Fachada Casa de la Cultura

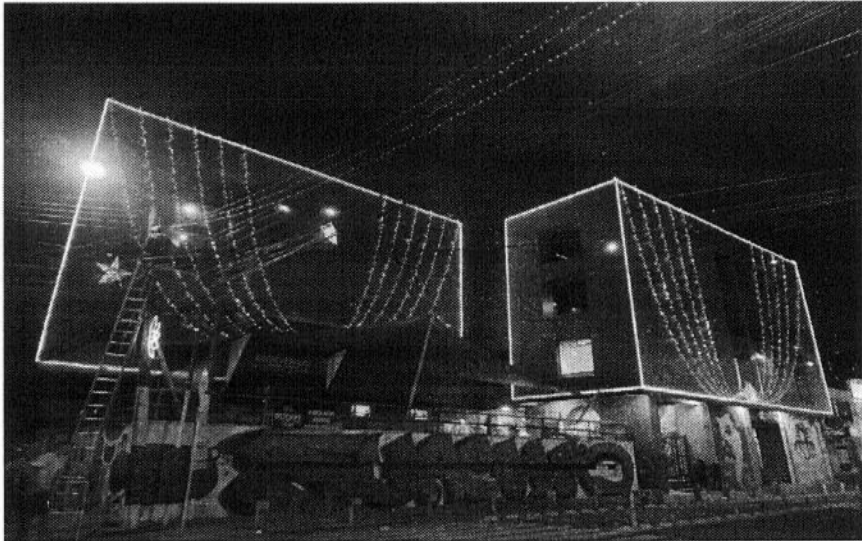


- Carrera 7 entre Cll 13 y 22

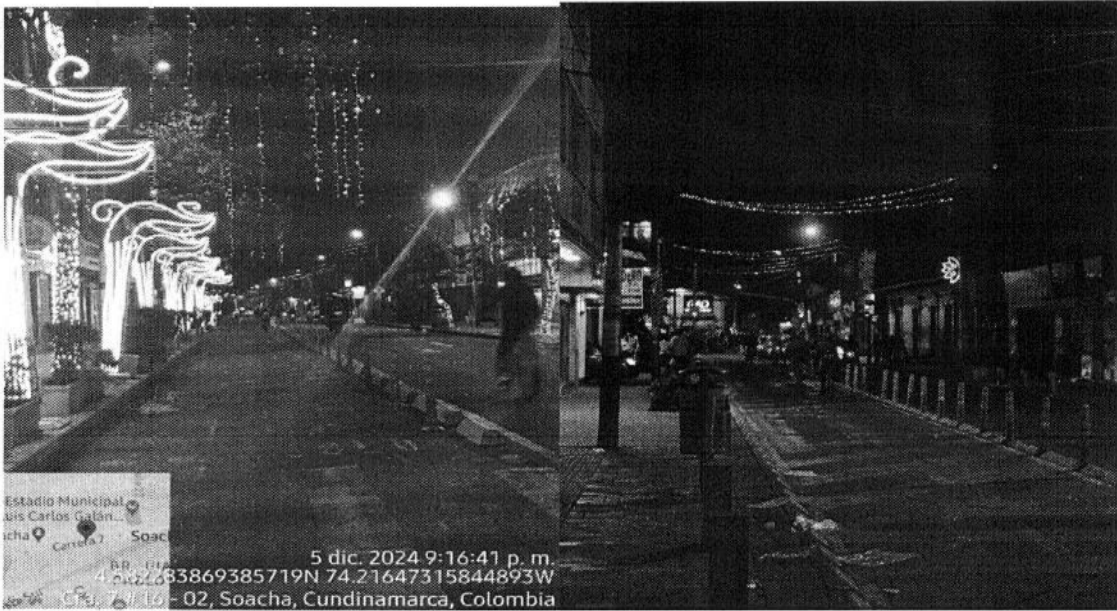

- Salto del Tequendama:



- Parque La Arenosa

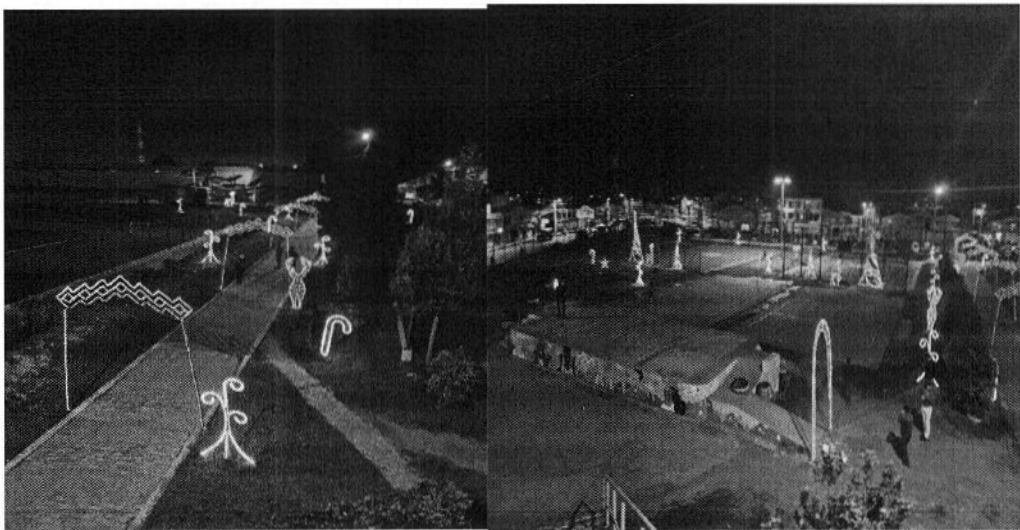

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

Por parte de Enel, se realizó la verificación de los sitios restantes y que fueron encendidos el día 6 sin novedad los cuales fueron, Coliseo Leon de XIII, Parque Tibanica, Parque San Carlos, Paseo San Mateo, Parque Campestre, Glorieta Hogares de Soacha y Glorieta Ciudad Jardín

- Coliseo León XIII



- Parque Tibanica



- Parque San Carlos





XUÁ
Empresa Pública de Soacha

EPUXUA E.I.C.E.

INFORME DE
SUPERVISIÓN



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA


- Paseo San Mateo



- Parque Campestre



- Glorieta Hogares de Soacha

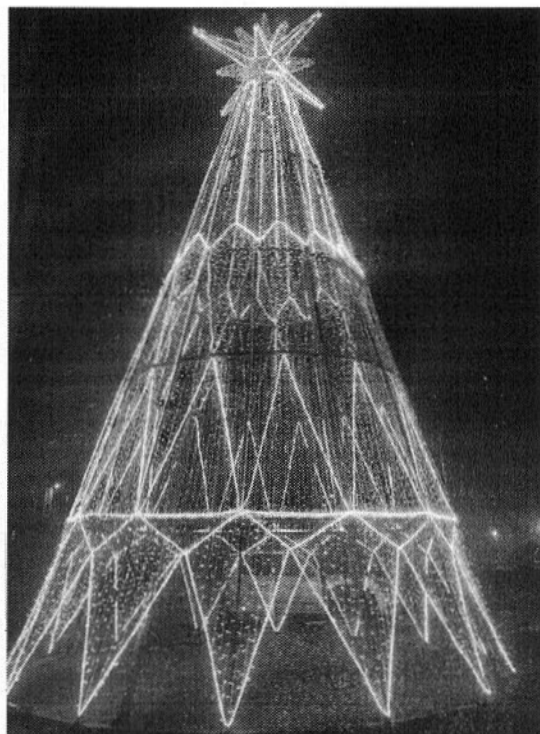


- Glorieta Ciudad Verde



De acuerdo a lo anterior se cumple con los sitios pactados en los cronogramas y con varios sitios de más que estaban para encendidos en días posteriores dejando solo para la semana del 9 la entrega y finalización de los 5 puentes, dejando claro que hubo un par de modificaciones, el cual no se ejecutó el puente de San Mateo que Cambio por puente San Humberto y no se ejecutó puente de calle 22 y cambio por puente de Unisur, a continuación, se dejan evidencias de los puentes iluminados


- Puente San Humberto

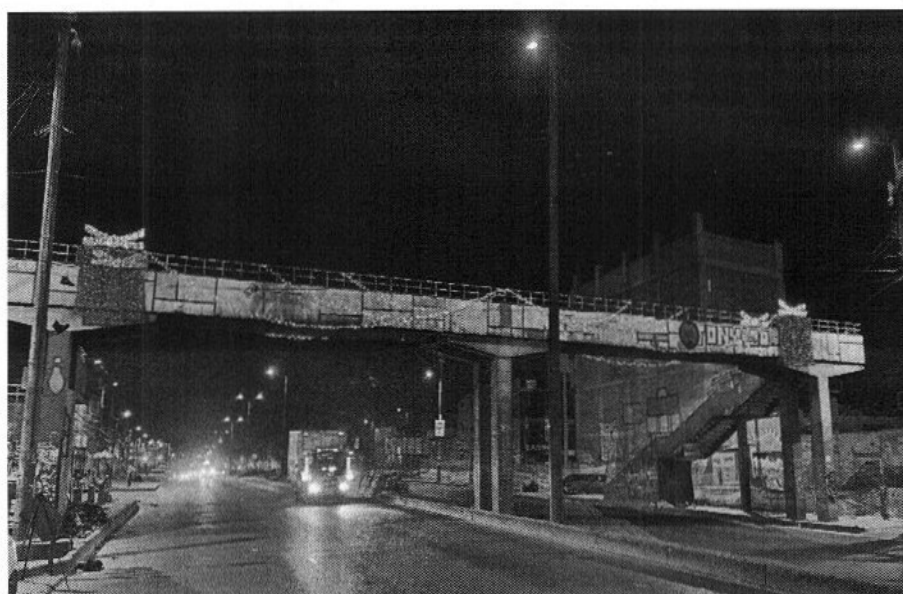


- Puente Ventura



- Puente Mercurio

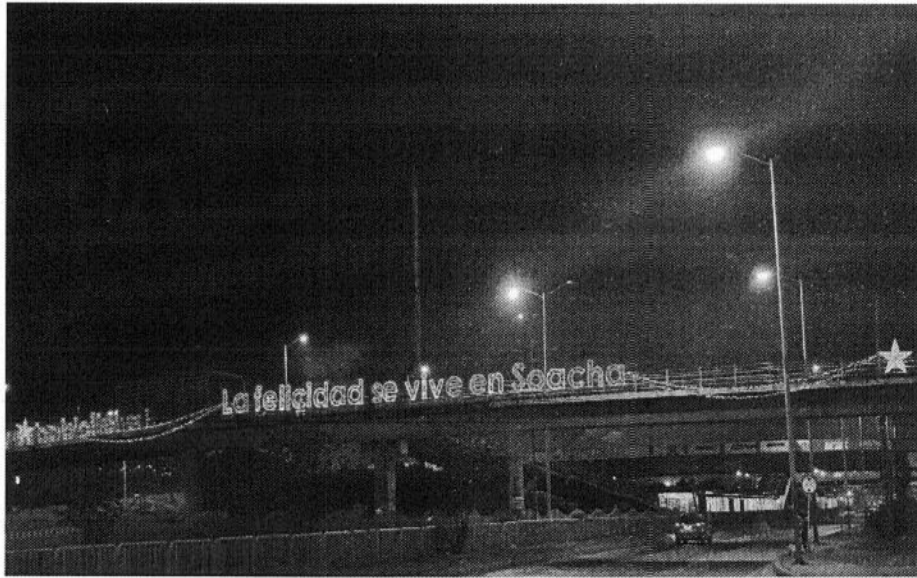

- Puente el Dorado

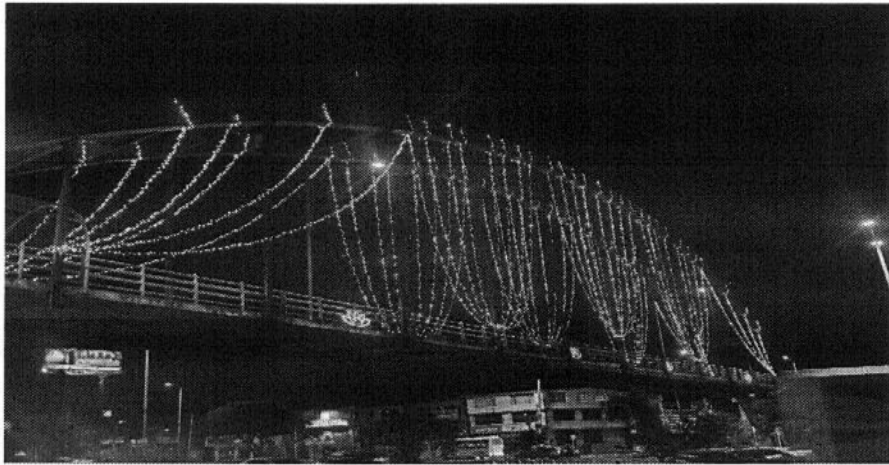

- Puente Unisur



8.2 Salto De Tequendama (Show Laser)

- Locación Para La Instalación De Equipos (Ground Support)




- Montaje De Equipos




- **Montaje Red Suministro Eléctrico**




- **Setup De Equipos Y Programación**

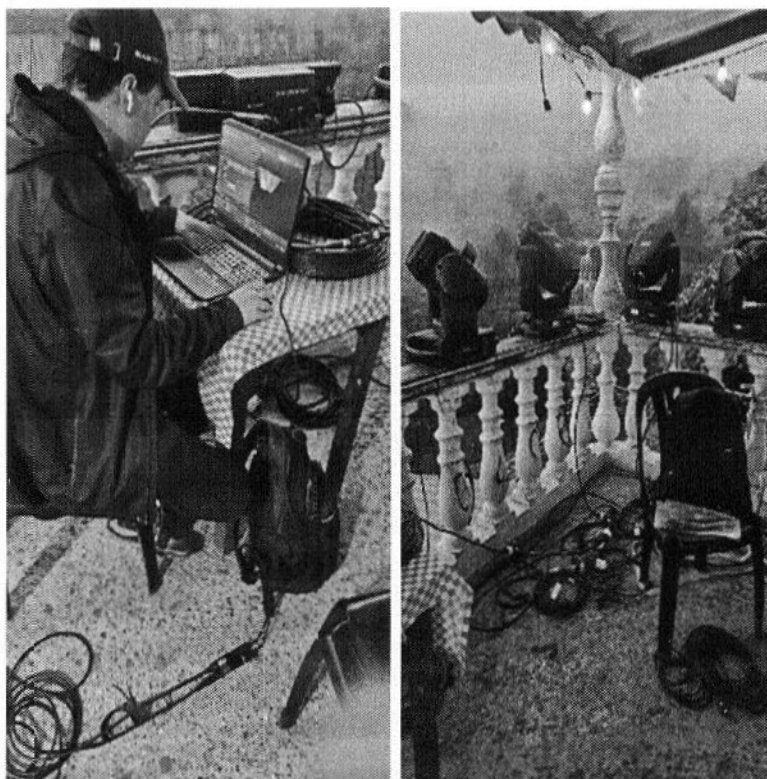

- Instalacion De Cabinas De Sonido

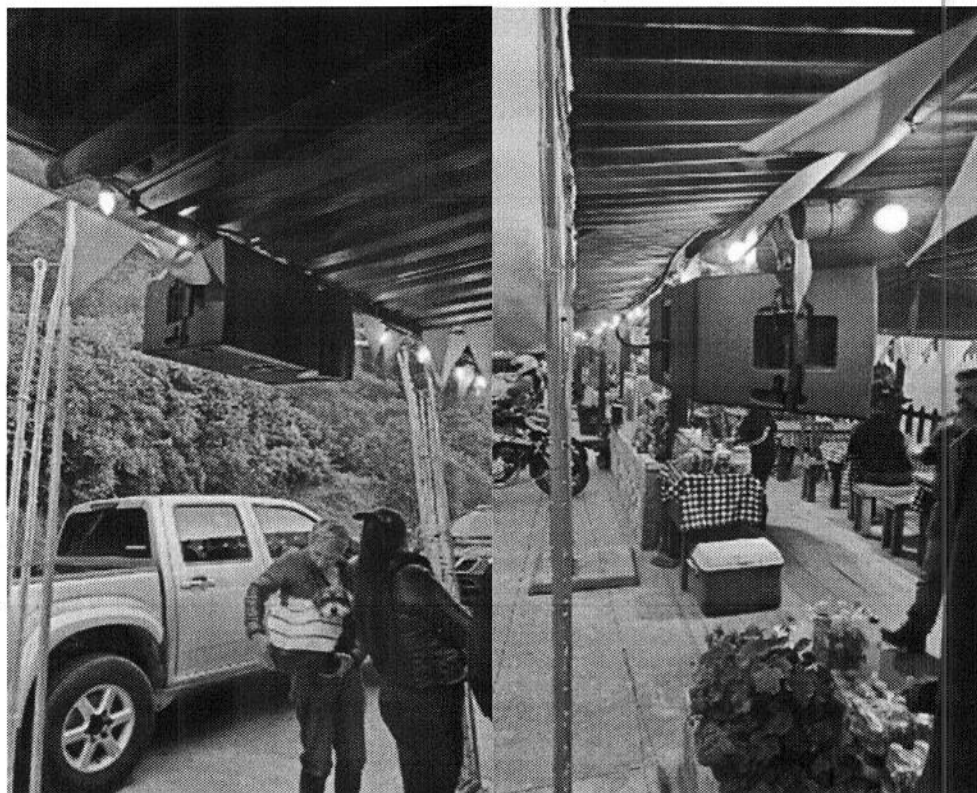


- Ground Support Del Show (Centro De Mando)



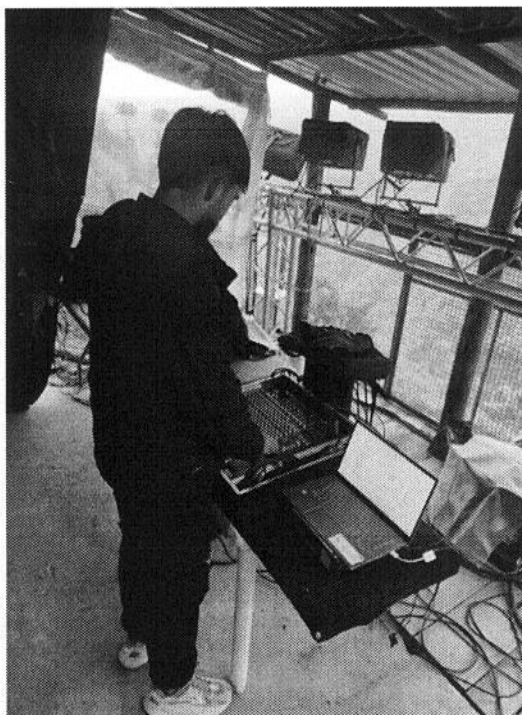




- Planta electrica de respaldo dia de lanzamiento





9. STORY BOARTH INICIAL DEL SHOW, PARA INICIAR LA FASE DE DISEÑO



AUDIO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REF / Animación
	La descripción que se muestra a continuación es sugerida teniendo en cuenta las facilidades de la animación y puede variar dependiendo de transiciones que se necesiten dar entre escena y escena para mayor fluidez)	(Las siguientes imágenes son a modo de ejemplo ya que toda las grafica debe ser en líneas y sin tanto detalle, se busca ejemplificar la composición de la imagen y en algunos casos, si es posible el ángulo de la cámara. No se debe tener en cuenta las texturas pero si las formas).
“HACE MUCHOS AÑOS... CUANDO LA NEBLINA SE LEVANTABA SILENCIOSA SOBRE LOS ABRIGOS RCCOSOS DE LA PLANICIE ANDINA...”	Una onda senoical que cubre toda el área horizontal donde se desarrolla el show laser, se desplaza de abajo hacia arriba, simulando la neblina que se levanta. Con este movimiento se	

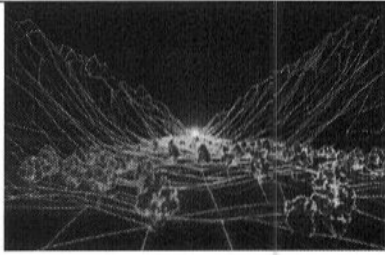


	forma un paisaje de montañas, rocas y arboles. Poco a poco la cámara va en un traveling in para ubicarnos en un pequeño poblado indígena.	
“...SURGIÓ UN PUEBLO QUE VIVÍA EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA Y SUS TESOROS HEREDADOS...”	(transición sembradío de maíz) La cámara atraviesa un sembradío de maíz y se devela una mujer indígena recogiendo maíz, al fondo se observa una choza indígena. La cámara se dirige a la choza en traveling in sacando de plano a la mujer indígena.	 
“...UNA COMUNIDAD QUE APRENDIÓ A CULTIVAR LA TIERRA, A MOLDEARLA CUANDO ESTABA HÚMEDA, PRODUCIENDO CERÁMICAS QUE LES SIVIERON PARA SUS RITUALES Y SU VIDA DIARIA...”	Al llegar a la puerta de la choza se ve un hombre indígena que trabaja con barro, la cámara se sigue acercando hasta llegar a sus manos. Podemos ver como el barro se transforma en	 




	una cerámica pre colombina.	
SUS SUEÑOS E ILUSIONES LOS PLASMARON CON PINTURA SOBRE LAS ROCAS, PEQUEÑOS DIBUJOS QUE REPRESENTARON LOS PAISAJES QUE LOS ENVOLVÍAN. UNA HISTORIA DELINEADA EN UN ARTE RUPESTRE QUE REPRESENTA NUESTROS PRIMEROS PASOS POR EL ALTIPLANO CUNDINAMARQUÉS.	La cámara entra a la cerámica por la parte superior y devela una escena de un indígena pintado sobre una roca, podemos ver como se van formando diferentes figuras sobre la pared. La cámara se mueve de izquierda a derecha haciendo un traveling postrando diferentes dibujos rupestres en donde se ven dibujos de indígenas adorando el sol, cazando y reunidos en medio de una fogata.	  
“...DURANTE ALGÚN TIEMPO, LA COMUNIDAD DESCUIDÓ SU RELACIÓN CON LA NATURALEZA, GENERANDO LA IRA DE LOS DIOSES,	Un trueno sirve como transición para mostrar un valle lluvioso.	


	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

QUIENES LES ENVÍARON COMO CASTIGO DÍAS Y NOCHES DE LLUVIAS INTERMINABLES...”		
”...ARRUINANDO BOHIOS Y CULTIVOS, Y PONIENDO EN PELIGRO TODO EL TERRITORIO MUISCA...”	Un trueno sirve como transición para mostrar una choza y la plantación de maíz inundadas, en frente se ven algunas personas.	
“EL PUEBLO SE REUNIÓ DESESPERADO PARA SUPLICARLE Y PEDIRLE AYUDA A LA GRAN DEIDAD...”	La cámara se “sumerge” para dar paso a una escena en donde vemos a dos indígenas frente a un hombre de barba y un bastón.	
“...QUIEN CON SU BASTÓN GOLPEÓ FUERTEMENTE LA ROCA, ABRIÉNDOLA Y PERMITIENDO CORRER EL AGUA REPRESADA, SALVANDO A TODO UN PUEBLO, Y CREANDO UN LUGAR MÁGICO QUE SE LLAMÓ EL SALTO DEL TEQUENDAMA, UNA DE LAS CAÍDAS DE AGUA NATURAL MÁS HERMOSAS DE LATINOAMÉRICA...”	Vemos como el hombre de barba con un bastón toca el piso, la cámara hace un primer plano del contacto del bastón con el piso y vemos como se forma una grieta. Por corte vemos como desde abajo una montaña empieza a dejar caer agua desde lo alto de la cumbre. La cámara se empieza a hundir poco a poco bajo el agua...	 

	EPUXUA E.I.C.E. INFORME DE SUPERVISIÓN	
“...CON EL PASO DEL TIEMPO, EL PUEBLO MUISCA SE FUE MEZCLANDO CON LA LLEGADA DE COLONIZADORES Y NUEVOS HABITANTES, CREANDO UN PUEBLO QUE EL 31 DE DICIEMBRE DE 1600 SE ESTABLECE CON EL NOMBRE DE SUACHA...”	La cámara surge del agua y vemos unas carabelas navegando...por corte vemos el valle con varias casas y sobre el se devela en texto: “SUACHA 31 de Diciembre de 1600”.	 
“...PRONUNCIADO INICIALMENTE SUACHA, EN HONOR AL NOMBRE INDIGENA “XUA CHA” QUE SIGNIFICABA “VARÓN DEL SOL”. Y ASÍ SE FUE CONFORMANDO UNA PLAZA CENTRAL, PEQUEÑAS CASAS DE BAREQUE QUE REEMPLAZARON A LOS BOHIOS INDÍGENAS, UN CEMENTERIO Y GRANDES HACIENDAS EN LOS ALREDEDORES, QUE FUERON DÁNDOLE VIDA A ESTA MARAVILLOSA Y MÁGICA REGIÓN...”	Se hace un juego con textos 3D en donde se pase del nombre XUA CHA A SUACHA haciendo una posterior transición a un círculo que será el sol, este a su vez se aleja poco a poco y vemos como nos ubicamos en una plaza con una pequeña iglesia y algunas casitas alrededor. La cámara se sigue alejando y una lápida servirá de transición para hacer un corte a un cementerio, la cámara continua en traveling out alejándose del cementerio para perderse en matorrales que a su vez develan una bonita hacienda. En este punto se detiene la cámara.	  

“EL SALTO DEL TEQUENDAMA, CON SUS 160 METROS DE ALTURA SE CONVIRTIÓ EN TESTIGO DEL CRECIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO EMPRENDEDOR Y VALIENTE. LA BELLEZA HIPNOTIZADORA DE SUS PAISAJES, Y EL VALOR AMBIENTAL DE SU BIODIVERSIDAD QUE SE SIGUE PROTEGIENDO...”	Un pájaro que pasa por frente de la cámara nos sirve de transición para observar el salto del Tequendama. Una bandada de pájaros de diferentes colores se dirigen a cámara, transición a ..	
“... CONECTAN EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y CULTURAL DE LA REGIÓN...”	Una locomotora de vapor antigua, por movimiento de cámara vemos la construcción del icónico Hotel, hoy día museo. De repente la cámara se detiene y se pierde con el humo que bota el tren el cual sirve de transición para la siguiente escena.	
“... FUERON MUCHAS LAS PERSONAS QUE LLEGARON A SOACHA EN BÚSQUEDA DE UN LUGAR PARA VIVIR Y CRECER, UNO QUE SE SINTIERA COMO SU VERDADERO HOGAR...”	Vemos varias de personas caminando.	

Y ASÍ CRECIÓ EL PUEBLO CON COLEGIOS, MERCADOS Y PARQUES, LUGARES DONDE SE SIGUEN UNIENDO NUESTRAS TRADICIONES Y RECUERDOS, QUE NUNCA SE LLEVARÁ EL OLVIDO,	Se puede observar la Iglesia representativa de Soacha, la cámara se acerca y podemos ver una cometa.	  
COMO DEGUSTAR UNA BUENA ALMOJÁBANA CON MASATO EN EL PARQUE PRINCIPAL	Vemos una almojábana y un vaso con "masato". entramos por la parte superior del masato con la cámara.	
COMPARTIR UNA BUENA GALLINA CON PIQUETE COMO EXCUSA PARA REUNIR A LA FAMILIA	Después de que pasa el tren de vela la forma de una gallina asada sobre una bandeja mientras gira en su propio eje y se desvaneces por disolvencia poco a poco.	
O REGRESAR SIEMPRE AL SALTO DEL TEQUENDAMA PARA RECORDAR EL	Volvemos a la toma del Salto de Tequendama que usamos anteriormente	

AMOR QUE SENTIMOS POR SOACHA, UNA TIERRA MÁGICA, DISPUESTA A RECIBIRNOS SIEMPRE.	desplazándonos esta vez de abajo hacia arriba con la cámara, vemos como el agua cae. Se ve también el varón del Sol	 
Feliz Navidad y próspero año 2025.	Toda esta frase en texto 3D	

10. PROCESO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Después de 11 días de ejecución para el día 6 de diciembre se contaba con un buen avance de ejecución donde se logró realizar la primera prueba de funcionamiento previo al día de encendido, para lo cual se realizó recorrido en conjunto con personal de Epuxua entre ellos los supervisores del contrato Camilo Torres y Juan Pablo Hernandez entre otros, para la verificación del encendido y el cual se encontrará acorde a lo propuesto.


	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	






- Prueba de funcionamiento 6 de diciembre










Con presencia de entidades contratantes y alcalde de Soacha, este día se recibieron recomendaciones y solicitud de ajustes, los cuales se realizar para inaugurar a público el evento a público el 7 de diciembre de 2024

- Primer día de show

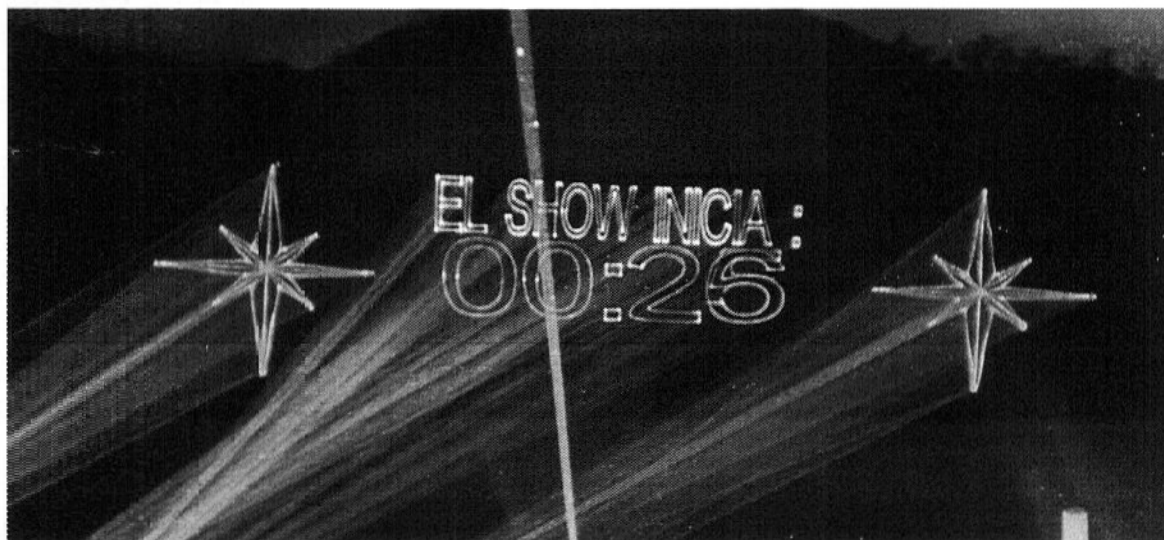









- Lanzamiento oficial del show a prensa y medios





11. PROBLEMAS PRESENTADOS Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS.

Durante la gestión no se presentaron dificultades relevantes para la ejecución del proyecto.

12. ACTIVIDADES Y GESTIONES.

Las actividades proyectadas Vs las ejecutadas se describen, cuantifican, detallan y valorizan en archivo Excel adjunto discriminando el alumbrado tradicional del show lumínico y laser del salto de Tequendama. La diferencias presentadas son menores y en efecto no afectan los precios del presupuesto final toda vez que se reubicaron materiales en los diferentes escenarios sin afectar el paquete global.(informacion ejecucion Soacha Navideño).

12.1 Navidad Tradicional

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	MINI LED IND. C:P 20 EXTENSIONES POR PERGOLA	Un	80	\$ 116.605,00	\$ 9.328.400,00
2	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM	Un	120	\$ 77.009,00	\$ 9.241.080,00

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
			CON EL MATERIAL DE ILUMINACION				
3	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	STROBER NEON C:W E27 6W 15 STROBERS POR FOLLAJE DE ARBOL PARA 10 ARBOLES	Un	150	\$ 46.135,00	\$ 6.920.250,00
4	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	Un	150	\$ 9.505,00	\$ 1.425.750,00
5	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	MINI LED IND. C:P 15 MINI LEDS POR ARBOL, PARA 10 ARBOLES	Un	150	\$ 116.605,00	\$ 17.490.750,00
6	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	3D ANGEL TROMPETA C:WW 2X4,5X2M 33W	M3	1	\$ 18.032.917,00	\$ 18.032.917,00
7	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 2,8M 83W	Un	5	\$ 2.468.228,00	\$ 12.341.140,00
8	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W	Un	5	\$ 2.468.228,00	\$ 12.341.140,00
9	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 5M 350W	Un	5	\$ 4.733.410,00	\$ 23.667.050,00
10	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	ARBOL MAPLE LED 5 M BLAN LED BLAN	Un	5	\$ 4.733.410,00	\$ 23.667.050,00
11	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	16	\$ 225.927,00	\$ 3.614.832,00
12	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	SOPORTE TAPA CONCRETO 1,2X1,2	Un	12	\$ 338.890,00	\$ 4.066.680,00
13	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	2D COLIBRÍ C:WW 2.1X1.46M	M2	6	\$ 986.110,00	\$ 5.916.660,00
14	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	Un	6	\$ 1.154.363,00	\$ 6.926.178,00
15	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja Metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	2	\$ 1.067.073,00	\$ 2.134.146,00
16	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONDUCTORES DE COBRE	ML	2.700	\$ 3.662,00	\$ 9.887.400,00

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TCTAL
			SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).				
17	ALCALDIA	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P CASCADAS CON CAIDA DE 1M Y DE 0.8M DONDE 1 EXTENSION CUBRE 0.80 ML	Un	32	\$ 153.764,00	\$ 4.920.448,00
18	ALCALDIA	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P	Un	2	\$ 153.764,00	\$ 307.528,00
19	ALCALDIA	ALQUILER	MINI LED IND. C:W	Un	6	\$ 152.327,00	\$ 913.962,00
20	ALCALDIA	ALQUILER	STROBER NEON C:W E27 6W	Un	40	\$ 46.135,00	\$ 1.845.400,00
21	ALCALDIA	ALQUILER	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	Un	40	\$ 9.505,00	\$ 380.200,00
22	ALCALDIA	ALQUILER	2D COPITO C:W 1M 17W	M2	4	\$ 301.118,00	\$ 1.204.472,00
23	ALCALDIA	ALQUILER	2D SEMIARCO TRIANGULO C:W 5X1M	M2	2	\$ 1.658.024,00	\$ 3.316.048,00
24	ALCALDIA	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	2	\$ 225.927,00	\$ 451.854,00
25	ALCALDIA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja Metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	0	\$ 1.067.073,00	\$ -
26	ALCALDIA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	900	\$ 3.662,00	\$ 3.295.800,00
27	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	MINI LED IND. C:WW PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	Un	18	\$ 92.207,00	\$ 1.659.726,00
28	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	Un	18	\$ 93.644,00	\$ 1.685.592,00
29	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	MINI LED IND. C:W PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	Un	18	\$ 92.207,00	\$ 1.659.726,00
30	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	2D HOJA PETALOS C:W 0,6X1,2M UBICADOS EN 8 POSTES	M2	9	\$ 216.805,00	\$ 1.951.245,00

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
31	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	Un	6	\$ 1.154.363,00	\$ 6.926.178,00
32	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.067.073,00	\$ 1.067.073,00
33	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1.200	\$ 3.662,00	\$ 4.394.400,00
34	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	STROBER NEON C:W E27 6W 10 STROBERS POR ARBOL PARA 49 ARBOLES	Un	490	\$ 46.135,00	\$ 22.606.150,00
35	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	Un	490	\$ 9.505,00	\$ 4.657.450,00
36	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P 9 EXTENSIONES POR ARBOL	Un	441	\$ 93.644,00	\$ 41.297.004,00
37	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	MINI LED IND. C:WW 5 MINI LEDS POR ARBOL	Un	245	\$ 92.207,00	\$ 22.590.715,00
38	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	M2	294	\$ 77.009,00	\$ 22.640.646,00
39	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W 3 POR CUADRA	M2	64	\$ 655.066,00	\$ 41.924.224,00
40	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	ML	1.798	\$ 8.440,00	\$ 15.175.120,00
41	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER ESTRENE	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	ML	1.274	\$ 8.440,00	\$ 10.752.560,00
42	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	64	\$ 225.927,00	\$ 14.459.328,00

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
43	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	Un	16	\$ 1.154.363,00	\$ 18.469.808,00
44	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	6	\$ 1.067.073,00	\$ 6.402.438,00
45	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	3.500	\$ 3.662,00	\$ 12.817.000,00
46	IGLESIA	ALQUILER	2D COPO DIAMANTES C:W 1,5M 21W	M2	3	\$ 951.588,00	\$ 2.854.764,00
47	IGLESIA	ALQUILER	STROBER NEON C:W E27 6W	Un	30	\$ 46.135,00	\$ 1.384.050,00
48	IGLESIA	ALQUILER	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	Un	30	\$ 9.505,00	\$ 285.150,00
49	IGLESIA	ALQUILER	ROPE LED C:W 21 A 50 M	ML	18	\$ 40.945,00	\$ 737.010,00
50	IGLESIA	ALQUILER	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W FIJADOS EN COLOR FUCSIA	Un	1	\$ 1.234.252,00	\$ 1.234.252,00
51	IGLESIA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.067.073,00	\$ 1.067.073,00
52	IGLESIA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	800	\$ 3.662,00	\$ 2.929.600,00
53	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D FILIGRANA 3 HONDAS C:WW 1,6M	M2	15	\$ 465.825,00	\$ 6.987.375,00
54	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D RENO TIPO 1 C:W 2,5X1,5M 16W	M2	3	\$ 1.272.998,00	\$ 3.818.994,00
55	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D Reno Tipo 3 Blanco 2,5x0,80m 110V 1	M2	3	\$ 678.932,00	\$ 2.036.796,00

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
56	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D ESTRELLA 5 PUNTAS C:W 1,1X1,1M	M2	5	\$ 352.280,00	\$ 1.761.400,00
57	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D MARCO LUZ ALTO C:W 3,7X2M	M2	1	\$ 3.768.075,00	\$ 3.768.075,00
58	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D BASTON C:R 1,5X1M 8W	M2	15	\$ 509.199,00	\$ 7.637.985,00
59	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D ARCO MOSAICO C:B 3,11X3,33M	M2	12	\$ 2.780.390,00	\$ 33.364.680,00
60	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER ESTRENE	ROPE LED C:P PARA 2D ARCO MOSAICO C:B 3,11X3,33M	ML	960	\$ 11.817,00	\$ 11.344.320,00
61	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	M2	2	\$ 763.799,00	\$ 1.527.598,00
62	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA BASTON DE DULCE BLANCO ROJO 0,7x1,5x m 1 DOBLE RECORRIDO	ML	92	\$ 8.440,00	\$ 776.480,00
63	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	MINI LED IND. C:P PARA 2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	Un	16	\$ 47.085,00	\$ 753.360,00
64	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT ROSADO PARA 2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	M2	10	\$ 68.534,00	\$ 685.340,00
65	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	M2	2	\$ 3.055.196,00	\$ 6.110.392,00
66	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	ROPE LED C:W < 20 M PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M DOBLE RECORRIDO	ML	148	\$ 8.440,00	\$ 1.249.120,00
67	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	Un	32	\$ 47.085,00	\$ 1.506.720,00
68	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT ROSADO PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	M2	18	\$ 68.534,00	\$ 1.233.612,00
69	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	M3	2	\$ 2.315.415,00	\$ 4.630.830,00
70	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D SEMIARCO DREAM C:W 4,57M 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	M2	2	\$ 1.281.208,00	\$ 2.562.416,00
71	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	ROPE LED C:P 21 A 50 M PARA 2D SEMIARCO DREAM C:W 4,57M	ML	232	\$ 8.440,00	\$ 1.958.080,00

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
72	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	2	\$ 1.067.073,00	\$ 2.134.146,00
73	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	2.800	\$ 3.662,00	\$ 10.253.600,00
74	SAN CARLOS	ALQUILER	2D COPITO C:W 1M 17W	M2	15	\$ 339.466,00	\$ 5.091.990,00
75	SAN CARLOS	ALQUILER	TUBO REDONDO 2" 4M DIVIDIDO EN 2	Un	10	\$ 18.338,00	\$ 183.380,00
76	SAN CARLOS	ALQUILER	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	M3	6	\$ 2.315.415,00	\$ 13.892.490,00
77	SAN CARLOS	ALQUILER	2D ESTRELLA 5 PUNTAS C:W 1,1X1,1M	M2	6	\$ 352.280,00	\$ 2.113.680,00
78	SAN CARLOS	ALQUILER	2D COPITO C:W 1M 17W	M2	6	\$ 339.466,00	\$ 2.036.796,00
79	SAN CARLOS	ALQUILER	TUBO DE 2 PLGX3M GALVANIZADO	Un	18	\$ 18.338,00	\$ 330.084,00
80	SAN CARLOS	ALQUILER	2D MODULO OLAS C:BCK 2X2M CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	M2	30	\$ 1.164.561,00	\$ 34.933.830,00
81	SAN CARLOS	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	Un	50	\$ 56.815,00	\$ 2.840.750,00
82	SAN CARLOS	ALQUILER	MINI LED IND. C:WW 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	Un	50	\$ 55.378,00	\$ 2.768.900,00
83	SAN CARLOS	ALQUILER	MINI LED IND. C:W 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	Un	50	\$ 55.378,00	\$ 2.768.900,00
84	SAN CARLOS	ALQUILER	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	M2	12	\$ 655.066,00	\$ 7.860.792,00

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
85	SAN CARLOS	ALQUILER	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	ML	288	\$ 8.440,00	\$ 2.430.720,00
86	SAN CARLOS	ALQUILER	ROPE LED C:P > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	ML	288	\$ 8.440,00	\$ 2.430.720,00
87	SAN CARLOS	ALQUILER	2D ESTRELLA C:W 0,5M 6 ESTRELLAS POR COSTADO DE CANCHA, PARA 2 CANCHAS UN TOTAL DE 4 COSTADOS	M2	24	\$ 75.279,00	\$ 1.806.696,00
88	SAN CARLOS	ALQUILER	2D ESTRELLA C:W 0,25M 10 ESTRELLAS POR COSTADO DE CANCHA, PARA 2 CANCHAS UN TOTAL DE 4 COSTADOS	M2	40	\$ 18.820,00	\$ 752.800,00
89	SAN CARLOS	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	2	\$ 1.067.073,00	\$ 2.134.146,00
90	SAN CARLOS	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1.900	\$ 3.662,00	\$ 6.957.800,00
91	SALTO DEL TEQUENDAM A	ALQUILER	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	M2	16	\$ 655.066,00	\$ 10.481.056,00
92	SALTO DEL TEQUENDAM A	ALQUILER	ROPE LED C:P 21 A 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W PARA 8 ARCOS	ML	384	\$ 8.440,00	\$ 3.240.960,00
93	SALTO DEL TEQUENDAM A	ALQUILER	ROPE LED C:W 21 A 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W PARA 8 ARCOS	ML	384	\$ 8.440,00	\$ 3.240.960,00
94	SALTO DEL TEQUENDAM A	ALQUILER	2D RENO TIPO 4 C:W 5X3,5M 102W	M2	2	\$ 5.940.659,00	\$ 11.881.318,00

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
119	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P 3 MINI LEDS POR COLCHA	Un	45	\$ 47.085,00	\$ 2.118.825,00
120	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	2D COLCHA RETAZOS C:B 0,6M	M2	15	\$ 655.066,00	\$ 9.825.990,00
121	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	ROPE LED C:W 21 A 50 M	ML	90	\$ 8.440,00	\$ 759.600,00
122	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	MINI LED IND. C:W 3 MINI LEDS POR COLCHA	Un	45	\$ 45.647,00	\$ 2.054.115,00
123	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	3D ARBOL MODULO C:W	M3	8	\$ 2.468.228,00	\$ 19.745.824,00
124	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	38	\$ 225.927,00	\$ 8.585.226,00
125	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	ARBOL MAPLE LED 5 M BLAN LED BLAN	Un	1	\$ 4.733.410,00	\$ 4.733.410,00
126	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	SOPORTE TAPA CONCRETO 1,2X1,2	Un	1	\$ 338.890,00	\$ 338.890,00
127	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.067.073,00	\$ 1.067.073,00
128	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1.400	\$ 3.662,00	\$ 5.126.800,00
129	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	M2	4	\$ 655.066,00	\$ 2.620.264,00
130	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	EST. ÁRBOL ANILLOS MARCA 12M	Un	1	\$ 52.190.782,00	\$ 52.190.782,00
131	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	3D ESTRELLA VOLUMÉTRICA CON NUC C:W 3M	M3	1	\$ 3.528.084,00	\$ 3.528.084,00
132	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER ESTRENE	ROPE LED C:P > 50 M	ML	411	\$ 41.197,00	\$ 16.931.967,00

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
133	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	MINI LED IND. C:W	Un	350	\$ 116.605,00	\$ 40.811.750,00
134	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	MINI LED IND. C:WW	Un	150	\$ 116.605,00	\$ 17.490.750,00
135	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL ARBOL HASTA UNA ALTURA DE 3 M	Un	140	\$ 77.009,00	\$ 10.781.260,00
136	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER ESTRENE	ROPE LED C:P 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	ML	6.720	\$ 11.817,00	\$ 79.410.240,00
137	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W	M3	2	\$ 2.468.228,00	\$ 4.936.456,00
138	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W	M3	2	\$ 2.468.228,00	\$ 4.936.456,00
139	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	144	\$ 225.927,00	\$ 32.533.488,00
140	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmóste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.067.073,00	\$ 1.067.073,00
141	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmóste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Alambramiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1.800	\$ 3.662,00	\$ 6.591.600,00
142	COLISEO LEON XIII	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 2,3M 83W	M3	2	\$ 2.468.228,00	\$ 4.936.456,00
143	COLISEO LEON XIII	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	5	\$ 225.927,00	\$ 1.129.635,00
144	COLISEO LEON XIII	ALQUILER	2D PESEBRE C:W 4X4M 250W	M2	1	\$ 426.587,00	\$ 426.587,00

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
173	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.067.073,00	\$ 1.067.073,00
174	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1.300	\$ 3.662,00	\$ 4.760.600,00
175	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	EST. ÁRBOL ANILLOS MARCA 12M	M3	1	\$ 52.190.782,00	\$ 52.190.782,00
176	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	3D ESTRELLA VOLUMÉTRICA CON NUC C:W 3M	M3	1	\$ 3.528.084,00	\$ 3.528.084,00
177	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	ROPE LED C:WW > 50 M	ML	411	\$ 29.283,00	\$ 12.035.313,00
178	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	MINI LED IND. C:W	Un	350	\$ 116.605,00	\$ 40.811.750,00
179	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	MINI LED IND. C:WW	Un	150	\$ 116.605,00	\$ 17.490.750,00
180	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL ARBOL HASTA UNA ALTURA DE 3 M	Un	140	\$ 77.009,00	\$ 10.781.260,00
181	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.067.073,00	\$ 1.067.073,00
182	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1.300	\$ 3.662,00	\$ 4.760.600,00
183	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL	ALQUILER ESTRENE	ELEMENTO 2D VIVE LA NAVIDAD EN SOACHA DE 32M	M2	2	\$ 31.092.008,00	\$ 62.184.016,00

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	VENTURA - COMANDC						
134	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDC	ALQUILER	ROPE LED C:P > 50 M < 20 M REMANUFACTURA PARA 2D FELICIDAD C:W 1,52X2,9M	ML	460	\$ 2.817,00	\$ 1.295.820,00
135	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDC	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LETRERO FELIZ NAVIDAD TE DESEA SOACHA C:P C:W 14X1,2M	M2	56	\$ 10.773,00	\$ 603.288,00
136	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDC	ALQUILER	2D COLIBRÍ C:WW 2.1X1.46M	M2	4	\$ 1.444.864,00	\$ 5.779.456,00
137	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDC	ALQUILER	2D ARABESCO TIPO 3 C:W 2X1M 15W J	M2	8	\$ 845.856,00	\$ 6.766.848,00
138	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDC	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	M2	160	\$ 77.009,00	\$ 12.321.440,00
139	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDC	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.067.073,00	\$ 1.067.073,00
140	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1.100	\$ 3.662,00	\$ 4.028.200,00
191	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIC	ALQUILER ESTRENE	ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA	M2	2	\$ 27.637.340,00	\$ 55.274.680,00
192	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIC	ALQUILER ESTRENE	ROPE LED C:P > 50 M < 20 M REMANUFACTURA PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	ML	480	\$ 6.194,00	\$ 2.973.120,00

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
193	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	M2	50	\$ 10.773,00	\$ 538.650,00
194	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:VV 1,5	M3	4	\$ 2.618.321,00	\$ 10.473.284,00
195	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P	Un	48	\$ 118.043,00	\$ 5.666.064,00
196	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	M2	160	\$ 77.009,00	\$ 12.321.440,00
197	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.067.073,00	\$ 1.067.073,00
198	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1.100	\$ 3.662,00	\$ 4.028.200,00
199	SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	ALQUILER	2D REGALO PEQUEÑO C:R 1,66X1,6M 25W	M2	4	\$ 1.526.769,00	\$ 6.107.076,00
200	SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P	Un	60	\$ 118.043,00	\$ 7.082.580,00
201	SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	M2	160	\$ 77.009,00	\$ 12.321.440,00
202	SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución	Un	1	\$ 1.067.073,00	\$ 1.067.073,00

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
			de circuitos y control de encendido				
203	SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1.100	\$ 3.662,00	\$ 4.028.200,00
204	SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	ALQUILER	2D HOJA PETALOS C:W 0,6X1,2M	M2	8	\$ 304.508,00	\$ 2.436.064,00
205	SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P	Un	100	\$ 118.043,00	\$ 11.804.300,00
206	SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	ALQUILER	MINI LED IND. C:WW	Un	64	\$ 191.505,00	\$ 12.256.320,00
207	SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	ALQUILER	MINI LED IND. C:W	Un	64	\$ 191.505,00	\$ 12.256.320,00
208	SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.067.073,00	\$ 1.067.073,00
209	SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1.300	\$ 3.662,00	\$ 4.760.600,00
210	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER	2D ESTRELLA ARABESCO C:M 1,9X1,9M TODOS LOS ELEMENTOS EN POSTES VAN DISTRIBUIDOS EN UN RECORRIDO LINEAL DE 6.500 ML APROX. COMO CADA 160 M APROX.	M2	4	\$ 1.526.769,00	\$ 6.107.076,00
211	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER ESTRENE	ELEMENTO 2D SOACHA COMPARTE LA NAVIDAD	M2	2	\$ 29.611.436,00	\$ 59.222.872,00

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
212	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER ESTRENE	ROPE LED C:P > 50 M < 20 M REMANUFACTURA PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	ML	480	\$ 6.194,00	\$ 2.973.120,00
213	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	M2	60	\$ 10.773,00	\$ 646.380,00
214	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	M2	160	\$ 77.009,00	\$ 12.321.440,00
215	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.067.073,00	\$ 1.067.073,00
216	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1.100	\$ 3.662,00	\$ 4.028.200,00

PROYECTO NAVIDAD TRADICIONAL SOACHA


Subtotal antes de IVA de la Proyección estimada de costos	\$ 1.843.419.635,00
Valor IVA del 19%	\$ 350.249.730,65
TOTAL Proyección estimada de costos incluido IVA	\$ 2.193.669.366




13. ILUMINACION SALTO DE TEQUENDAMA

SITIO	Descripción	Cantidad Contratada	Cantidad Instalada
Salto del Tequendama	SHOW LASER: Consiste en un show de proyección láser sobre los paredones del salto del Tequendama y cascada por un periodo de 24 días consecutivos durante la temporada decembrina del 2024, el show consta de: diseño, producción y reproducción de una pieza audio visual, la cual encajara y coordinará con la estructura física del salto del Tequendama , esta pieza tendrá un espacio de introducción y menciones según lineamientos del cliente, así como una pieza temática con animaciones en vectores y líneas, texturas, de más o menos 8 minutos, la edición y musicalización y diseño sonoro se realizan en función de la animación vectorial realizado a partir de una cocreacion del guion con el cliente esta no incluye el derecho de pago de sayco y acimpro si se desea el uso de piezas con derechos de autor. Para el desarrollo de este se usarán 7 equipos de láser de 40 watts, los cuales se interconectarían con un sistema de audio con amplificación para un aforo aproximado de 200 personas por espectáculo, controlados desde una consola digital. Todo el montaje contará con un sistema de elevación en estructura scaffold o trust recubierto con poli sombra negra al 80%. Este espectáculo incluye todos los técnicos de montaje, jefe de producción como los técnicos de soporte y reproducción, así como el servicio de seguridad privada durante 24 horas por la	1	1

	duración de todo el montaje y reproducción. El espectáculo se puede repetir el número de veces que se establezca con el cliente, se recomienda que este funcione cada 20 min o 30 min entre espectáculos y desde las 6:30 pm hasta las 10:00 pm de lunes a jueves y hasta las 11:00 pm de viernes a domingo. La propuesta NO incluye tramite de permisos, plan de control logístico o plan de control de emergencias o aforo, el cual deberá estar a cargo del cliente.	
--	--	--

14. PROYECCION LASER SALTO DE TEQUENDAMA

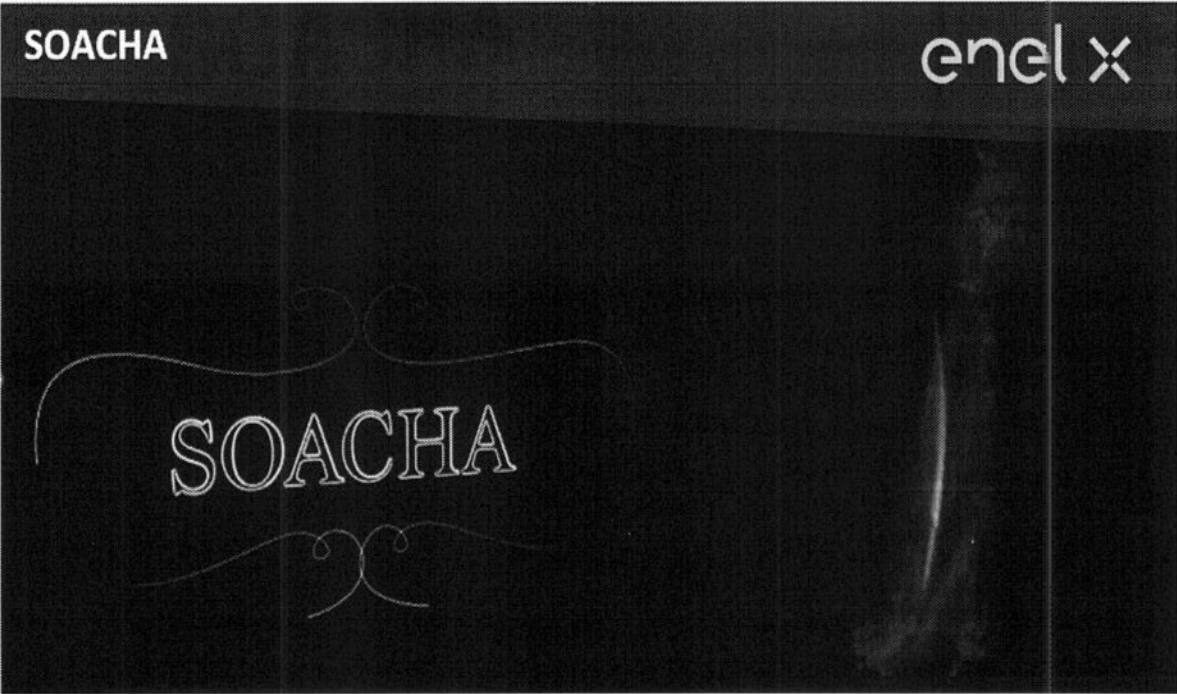

Show de proyección laser	Equipos de laser	Pieza audio visual efectos gráficos y vectores	Sistema de sonido
Consiste en un show de proyección láser sobre los paredones del salto del Tequendama y cascada por un periodo de 24 días consecutivos durante la temporada decembrina del 2024, iniciando el día 07 de diciembre de 2024 y finalizando el 30 de diciembre de 2024, sin operación el día 24 de diciembre de 2024, el show consta de: diseño, producción y reproducción de una pieza audio visual, la cual encajara y coordinará con la estructura física del salto del Tequendama , esta pieza tendrá un espacio de introducción y menciones según lineamientos del cliente, así como		Efectos texturas  Efectos vectores 	 


una pieza temática con animaciones en vectores y líneas, texturas, de más o menos 8 minutos, la edición y musicalización y diseño sonoro se realizan en función de la animación vectorial realizado a partir de una co-creacion del guion con el cliente esta no incluye el derecho de pago de sayco y acimpro si se desea el uso de piezas con derechos de autor. Para el desarrollo de este se usarán 7equipos de láser de 40 watts y 12 barras led para efectos de luz, los cuales se interconectarían con un sistema de audio con amplificación para un aforo aproximado de 200 personas por show, controlados desde una consola digital. Todo el montaje contará con un

sistema de elevación en estructura scaffold o trust recubierto con poli sombra negra al 80%.

Este show incluye todos los técnicos de montaje, jefe de producción como los técnicos de soporte y reproducción, así como el servicio de seguridad privada durante 24 horas por la duración de todo el montaje y reproducción.

El show se puede repetir el número de veces que se establezca con el cliente, se recomienda que este funcione cada 20 min o 30 min entre shows y desde las 6:30 pm hasta las 10:00 pm de lunes a jueves y hasta las 11:00 pm de viernes a domingo.

La propuesta NO incluye trámite de permisos, plan de control logístico o plan de control de emergencias o aforo, el cual

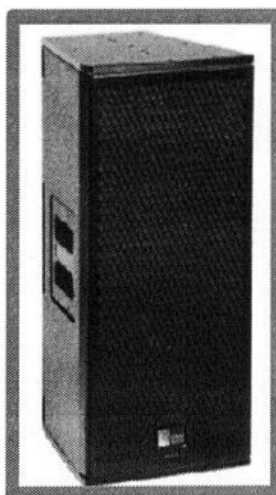

deberá estar a cargo del cliente.		
-----------------------------------	--	--


PROYECTO NAVIDAD PROYECCIÓN LASER SOACHA

Subtotal antes de IVA de la Proyección estimada de costos	\$ 818.484.464,00
Valor IVA del 19%	\$ 155.512.049,00
TOTAL Proyección estimada de costos incluido IVA	\$ 973.996.513,00

15. ILUMINACIÓN GRÁFICA Y DINÁMICA



	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

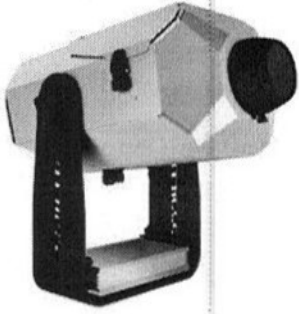Proyección de iluminación gráfica y dinámica	Equipos de Gobo proyección
la oferta contempla el Alquiler y puesta en marcha para el alquiler de sistema de iluminación decorativa para la Iglesia del Municipio de Soacha, el montaje contempla 4 proyectores de Gobos, gráficos y dinámicos, con imágenes y texturas asociadas a la temporada navideña. incluye la instalación, asesoría y acompañamiento al cliente en el desarrollo grafico del proyecto. las imágenes se realizarán con imágenes del catálogo de la tecnología propuesta	

PROYECTO NAVIDAD ILUMINACIÓN MAPEADA SOACHA

Subtotal antes de IVA de la Proyección estimada de costos	\$ 327.251.167,00
Valor IVA del 19%	\$ 62.177.722,00
TOTAL, Proyección estimada de costos incluido IVA	\$ 389.428.889,00

Subtotal antes de IVA de la Proyección	\$ 2.988.155.266,00
Valor IVA del 19%	\$ 567.939.500,54
Total, proyección estimada incluido IVA	\$ 3.557.094.767,00

16. ENTREGA DE PROYECTOS Y CONTEO DE MATERIALES

Por último se realizó el pasado 13 de Diciembre visita en conjunto con la persona designada por Epuxua, para realizar conteo de materiales en sitio de las cantidades contratadas vs las instaladas de 10 de los 21 sitios, encontrando en términos general las cantidades acordes, excepto con unas pequeñas observaciones de movimientos adicionales solicitados, o pendientes como los del parque que se ejecutaran una vez desmonten la tarima, también estaba pendiente la instalación de 12 cajas de publicidad que se ejecutarían el fin de semana y la instalación de las

miniled que fueron reubicadas de sitio, puntualmente del parque campestre. A continuación, se muestran las notas del acta de recorrido realizada este día

PARKER PRINCIPAL

1. Pendiente Vestir Arbol delos de Tarima principal q' se realizara una vez Retirada y
- 2º) Pendiente Instl de tres cajas de publicidad. se realizara en el transcurso del día 13 dic.
- 3 Como novedad se instalaban 2 venos (frente al cal) q' se trajeron del splto por sugerencia del Alcalde.
- 4º En Edificio alcaldia se retiraron dos Areas Entradas y se instalaron en Glorieta C.V. (se monto control Indep.)
- 5) pendiente Reinstalacion de proyector y sobre en Iglesia

ACERCA DE
SECR. GOB
 SIN Novedades
 Cra 7 entre Calles 13 y 15
 Pendientes tres cajas de publicidad. (se instalan 13 dic.)
CASA CULTURA
 S.N.
 Cra 7 Entre Calle 15 y 22
 El material sobrante de miniled sobrante y Estrober se reubica en: la arena, San Carlos, fachada Alcaldia y Leon XIII, Tibanica, Arboles de S. Mateo y H.S.

17. PERSONAL INVOLUCRADO Y NOVEDADES

El recurso utilizado para la ejecución del proyecto cumplió con lo definido del contrato y en las condiciones indicadas a continuación, se relaciona el personal dispuesto para la ejecución del proyecto, con la relación de vehiculos y se anexan los pagos de los parafiscales respectivos.

17.1 Iluminacion Tradicional

CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	# MOVIL	VEHICULO	TURN O	TIPO
79974666	GARCES VARGAS GUSTAVO WILSON	Líder	M51	WLT691	TURN O A	LIVIANO
7723182	ROJAS SERRANO DIEGO ANDRES	Operario				
1030570278	JHEISON FERNANDO CASTILLO PARDO	Líder	M130	GKV789	TURN O A	CANASTA
79831641	FREDY ALFONSO CASTRO CASTILLO	Operario				
80145451	OTALORA PORRAS JIMMY ANGEL	Líder	M30	WNS597	TURN O C	LIVIANO
1122119344	CHRISTIAN CAMILO CUINTACO BARBOSA	Operario				
1096188104	GABRIEL ARBOLEDA PINZON	Líder	M55	GKV789	TURN O C	CANASTA
1090392595	JOSE FERNANDO CIFUENTEZ PEREZ	Operario				
79245662	FREDY QUIJANO	Líder	M35	WCU301	TURN O C	LIVIANO


17.2 Show Laser Salto De Tequendama






		EQUIPO BASE EN TEMPORADA		
N o.	Cargo	ACTIVIDAD	tipo de permanencia	Horario
1	Encargado	productor del evento	Acceso esporádico	4:30 pm - 12:00 pm
2	Líder equipo	líder de producción	Acceso de control	4:30 pm - 12:00 pm
3	Técnico operador	Manejo de equipo laser	fijo de planta turno 1	4:30 pm - 12:00 pm
4	Técnico operador	Manejo de equipo laser	fijo de planta turno 2	4:30 pm - 12:00 pm
5	Técnico operador	Manejo de equipo laser	Back up a necesidad	4:30 pm - 12:00 pm
6	Técnico operador	Manejo de sonido	fijo de planta turno 1	4:30 pm - 12:00 pm
7	Técnico operador	Manejo de sonido	fijo de planta turno 2	4:30 pm - 12:00 pm
8	Técnico operador	Manejo de sonido	Back up a necesidad	4:30 pm - 12:00 pm
9	Vigilancia	Personal de seguridad	fijo de planta	6:00 pm - 6:00 pm
10	SISO	personal de seguridad industrial	Acceso de control	4:30 pm - 12:00 pm

18. PROCESO DE DESMONTE.

Para dar cumplimiento a los cronogramas se inicia desmonte el día 7 de enero con el apagado de los sitios e inicio del desmonte de todos los elementos instalados,

finalizando en los tiempos establecidos, a continuación, se relacionan algunas evidencias de las actividades realizadas en los diferentes sitios:

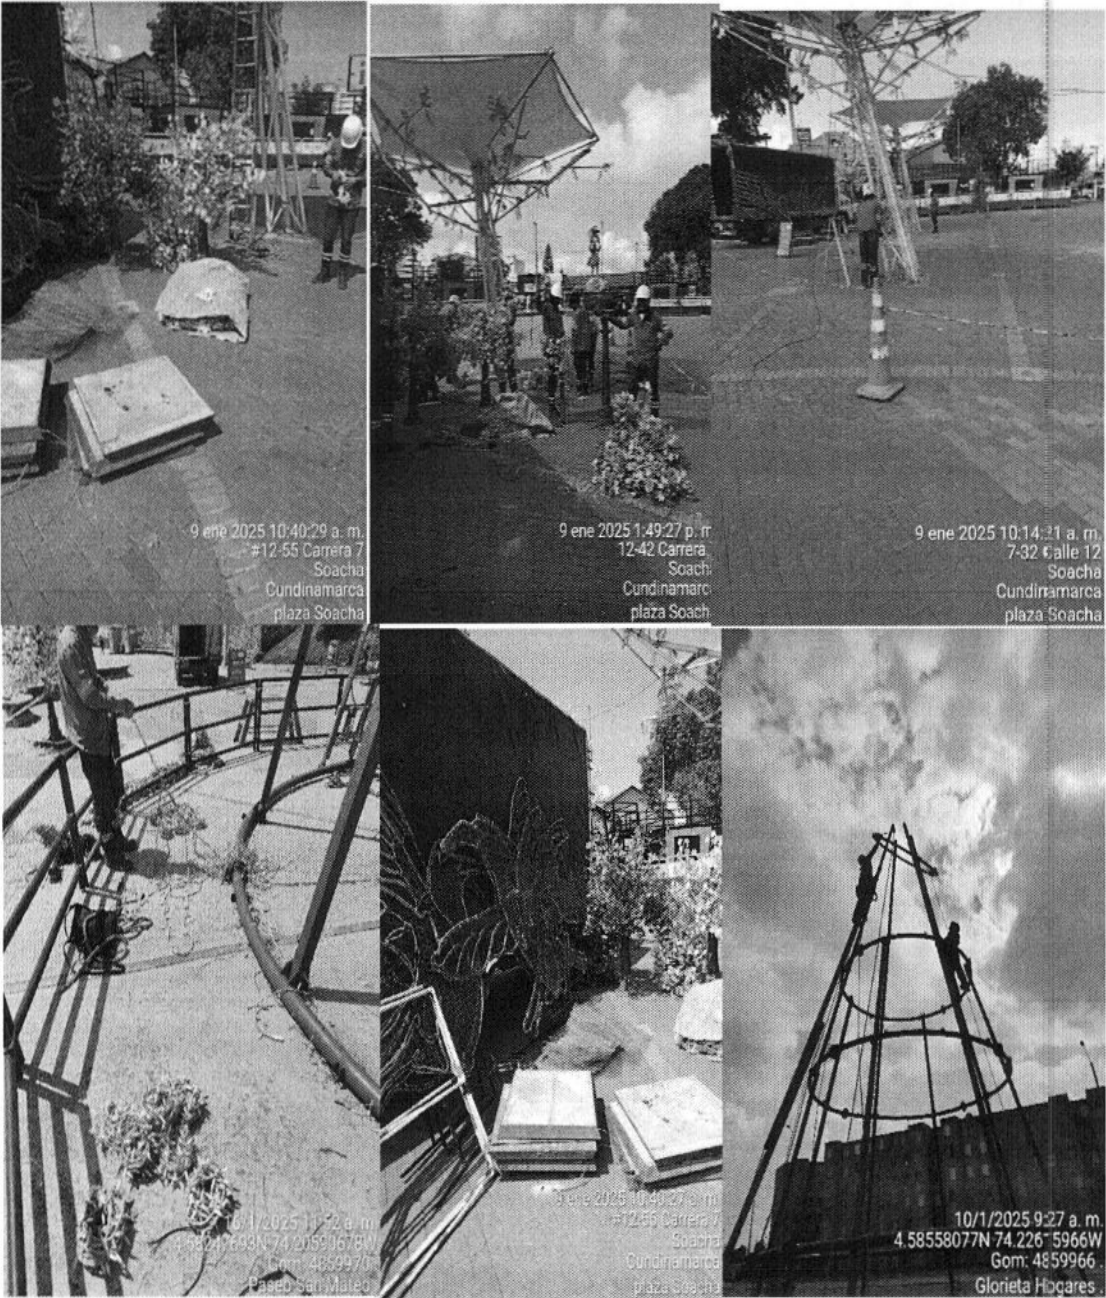

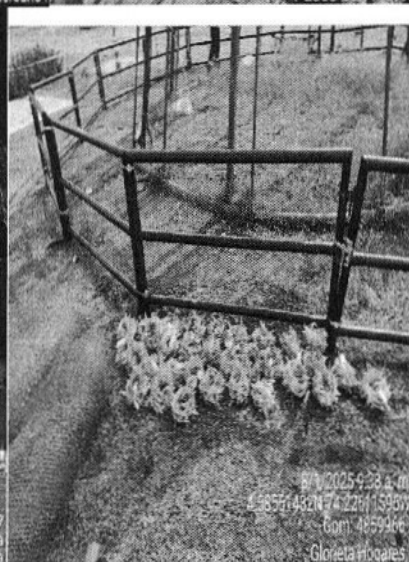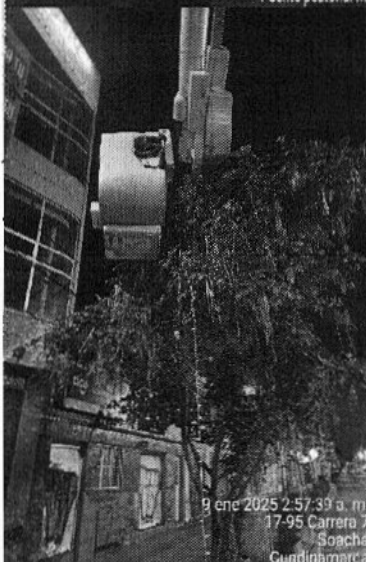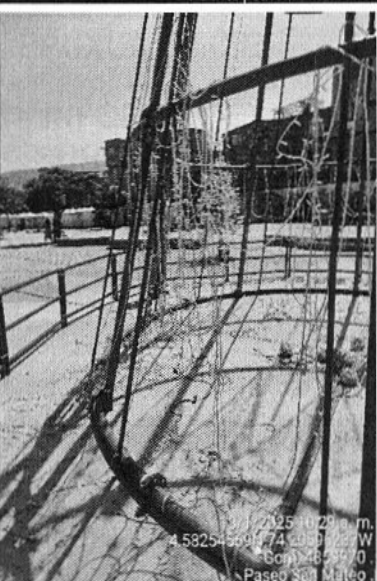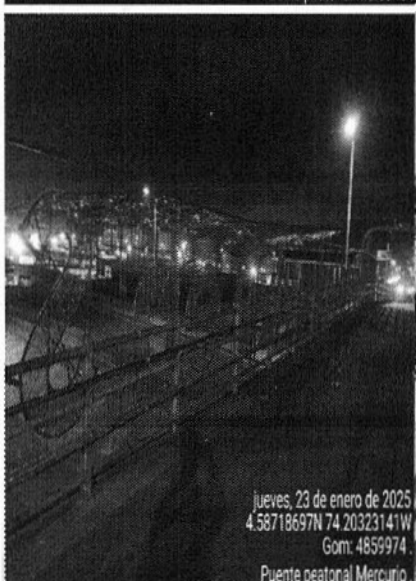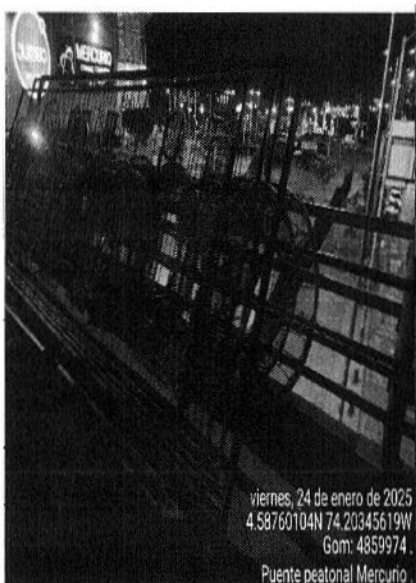



19. ESTADO FINAL

A continuación, se detalla sitio por sitio como quedaron las condiciones de los espacios en los cuales se realizó la iluminación, de nuestra parte no se evidencio ninguna novedad en los sitios después de realizar el desmonte:

- Parque Principal





- Fachada Alcaldía




- Fachada Iglesia



• Fachada Secretaria de Gobierno




- Fachada Casa de la Cultura

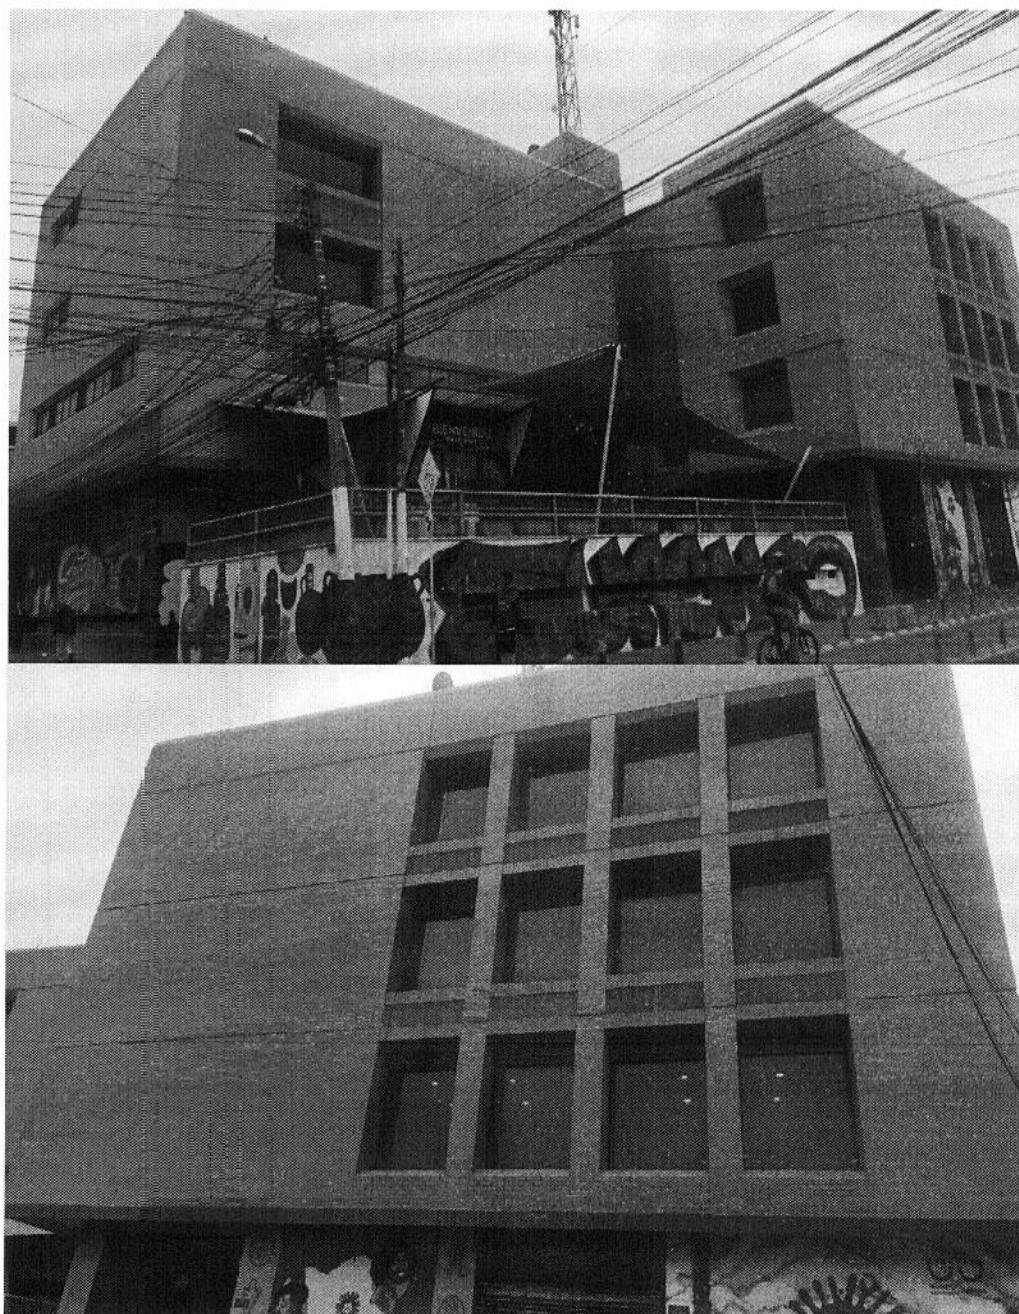

- Carrera 7 entre Cll 13 y 22



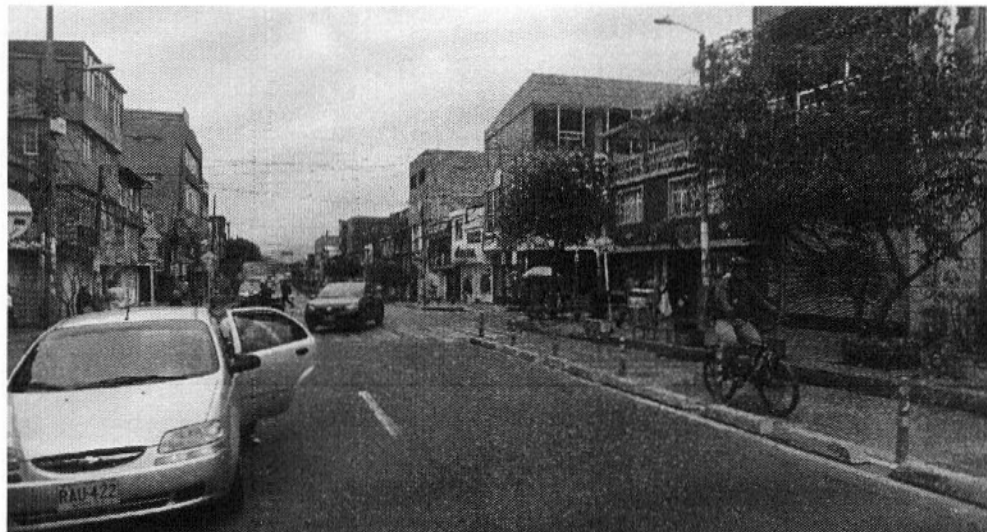

- Salto del Tequendama:



- Parque La Arenosa



- Coliseo León XIII







- Parque Tibanica





- Parque San Carlos

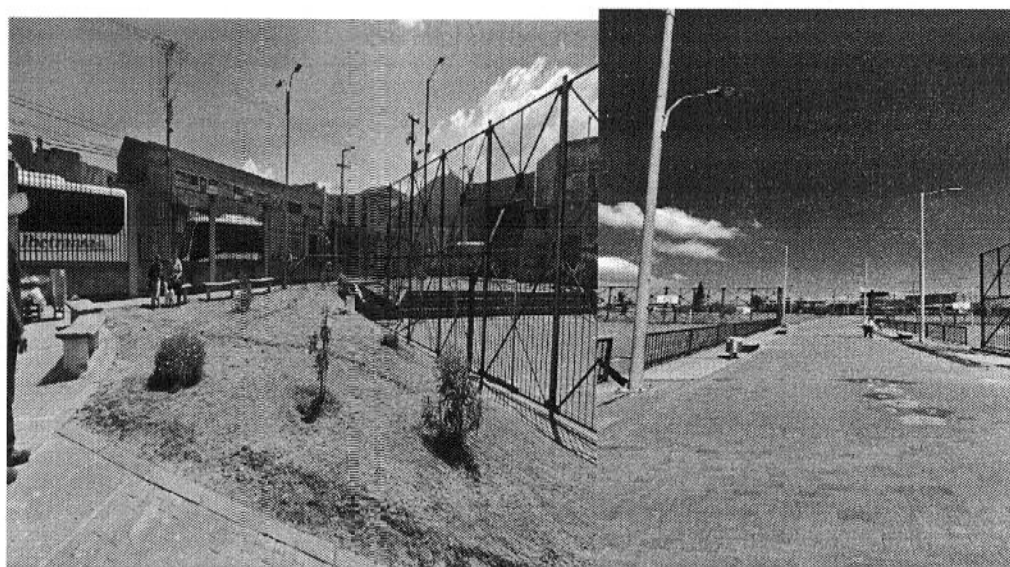


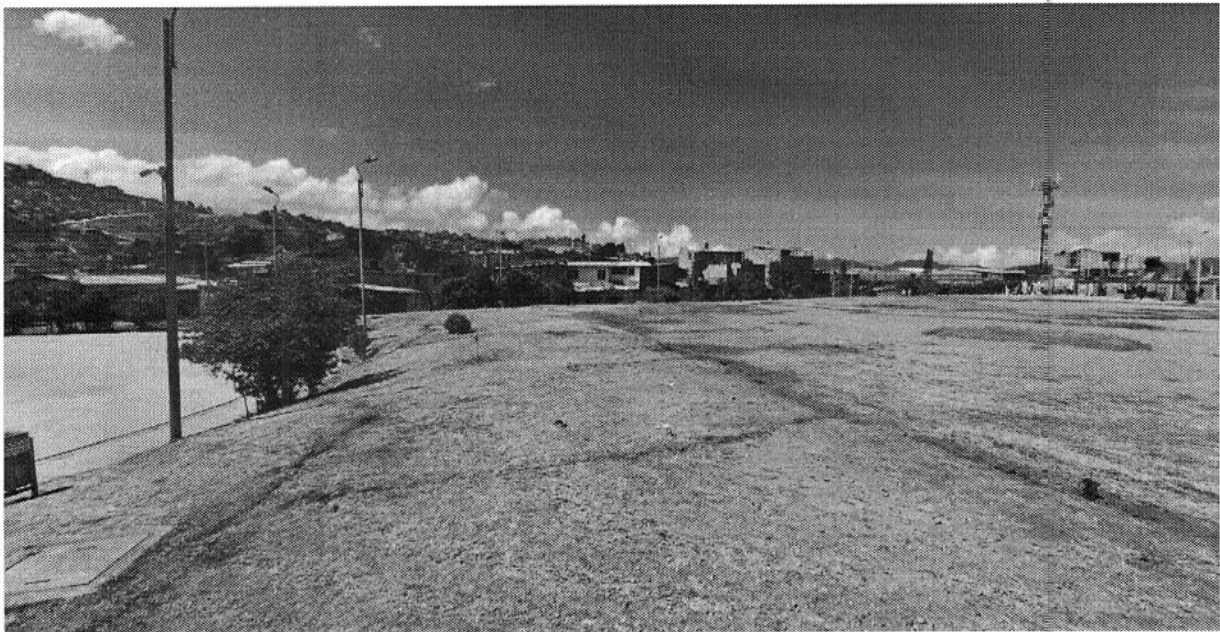

- Paseo San Mateo



- Parque Campestre

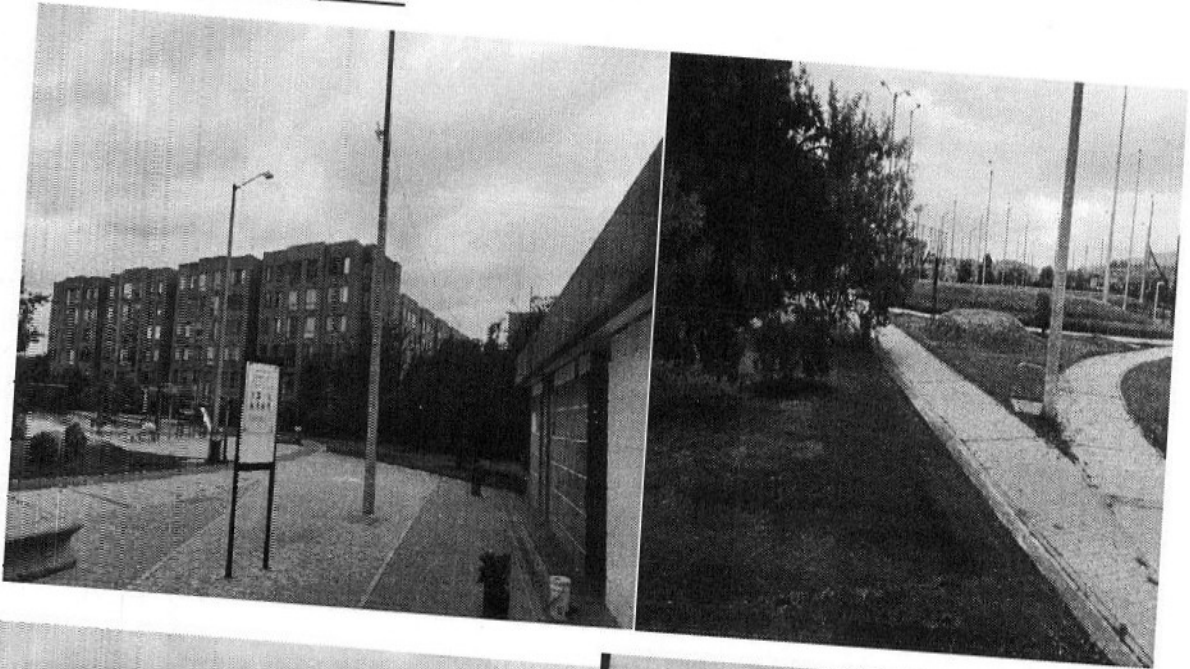

- Glorieta Hogares de Soacha



- Glorieta Ciudad Verde





- Puente San Humberto





XUÁ
Empresa Pública de Soacha

EPUXUA E.I.C.E.

INFORME DE
SUPERVISIÓN



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA





• Puente Ventura




- Puente Mercurio



- Puente el Dorado

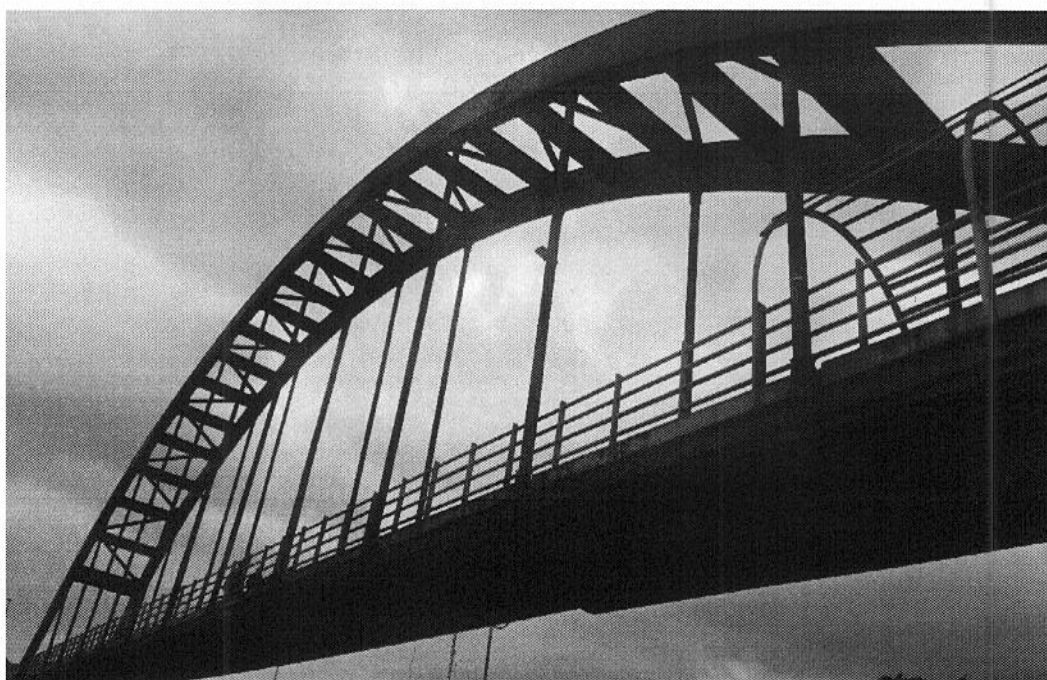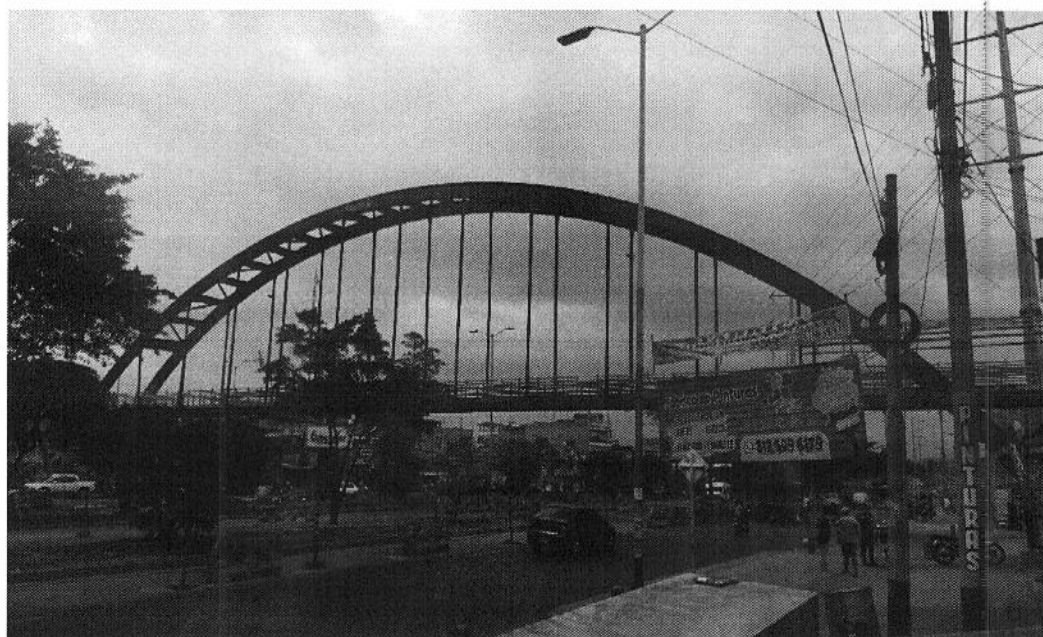

- Puente Unisur

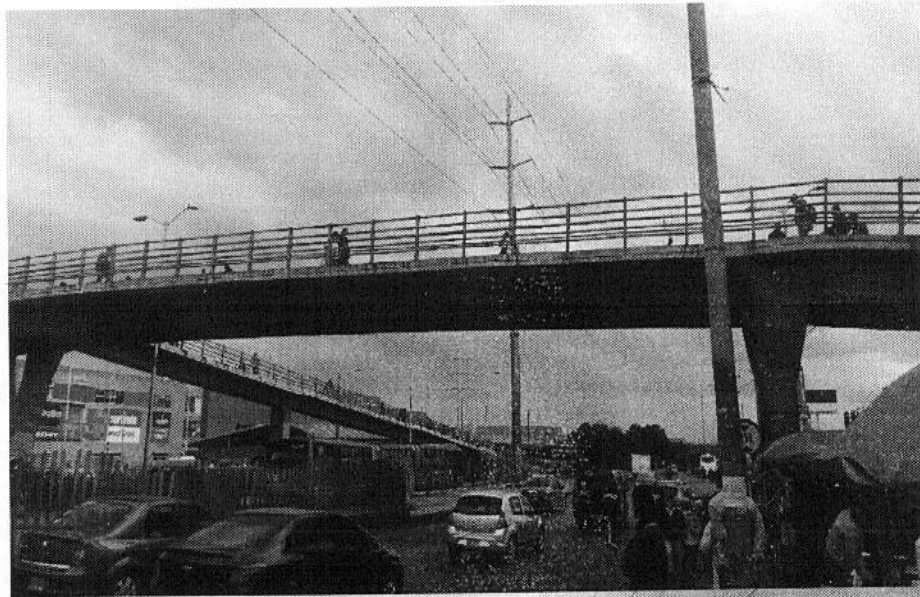

20. POLIZAS

Como respaldo a la ejecución del contrato, se cuenta con las siguientes pólizas:

20.1 Póliza de Cumplimiento

Característica	Condición															
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.															
Asegurado/ beneficiario	EPUXUA AVANZA E.I.C.E con NIT 901.511.522-4 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA CUNDINAMARCA, identificada con NIT 890.680.378-4															
Amparos, vigencia y valores asegurados	<table><tr><th>AMPARO</th><th>SUFICIENCIA</th><th>VIGENCIA</th></tr><tr><td>Cumplimiento del Contrato</td><td>20% del valor del Contrato</td><td>Vigencia igual al plazo del contrato, más seis (6) meses más.</td></tr><tr><td>Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>5% del valor del Contrato</td><td>Vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, más tres años.</td></tr><tr><td>Calidad de los servicios</td><td>10% del valor del contrato</td><td>Vigencia igual al plazo del contrato, más seis (6) meses más.</td></tr><tr><td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</td><td>10% del valor del contrato</td><td>Vigencia igual al plazo del contrato, y un (1) año más.</td></tr></table>	AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA	Cumplimiento del Contrato	20% del valor del Contrato	Vigencia igual al plazo del contrato, más seis (6) meses más.	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor del Contrato	Vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, más tres años.	Calidad de los servicios	10% del valor del contrato	Vigencia igual al plazo del contrato, más seis (6) meses más.	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% del valor del contrato	Vigencia igual al plazo del contrato, y un (1) año más.
AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA														
Cumplimiento del Contrato	20% del valor del Contrato	Vigencia igual al plazo del contrato, más seis (6) meses más.														
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor del Contrato	Vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, más tres años.														
Calidad de los servicios	10% del valor del contrato	Vigencia igual al plazo del contrato, más seis (6) meses más.														
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% del valor del contrato	Vigencia igual al plazo del contrato, y un (1) año más.														
Tomador	- Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. - No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. - Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo															
	cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.															

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

20.2 Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., identificado con NIT 901.511.522-4 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA CUNDINAMARCA, identificada con NIT 890680373-4
Tomador	- Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. - No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. - Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	No debe ser inferior a: - Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. - Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. - Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. - Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. - El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.
Vigencia	Igual al periodo de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados, EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., identificado con NIT 901.511.522-4, ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA CUNDINAMARCA, identificada con NIT 890680373-4
Amparos	

Característica	Condición
	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

21. ANEXOS

- Informe de gestión nov-dic navidad 2024 (Factura 1)
- Informe de gestión dic-ene navidad 2024 (Factura 2)
- Informe de gestión nov-dic navidad 2024 – show laser (Factura 2)
- Informe de desmonte navidad (factura 3)
- Informe ejecución Soacha navideño.xlxs
- Presentación Alumbrado Navideño (render). pdf

ELABORADO	APROBADO
	
JUAN HERNANDEZ Director AP CTO. 121-2024	LUIS CAMILO TORRES Supervisor del CTO 121-2024.
