



CONTRATO 147-2024

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO
NAVIDEÑO EN SOACHA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA**

Contratista: ENEL COLOMBIA S.A. ESP.



INFORME MENSUAL No. 1

16 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024

SOACHA, CUNDINAMARCA

INDICE

- I. Información del contrato**
- II. Descripción del proyecto**
- III. Localización del proyecto**
- IV. Desarrollo y avance del programa de actividades**
- V. Problemas presentados y las soluciones planteadas**
- VI. Actividades y gestiones**
- VII. Entrega de proyectos y conteo materiales**
- VIII. Personal involucrado y novedades**
- IX. Anexos**

I. Información del contrato

ENEL COLOMBIA S.A ESP. NIT: 860.063.875-8	CONTRATO 147-2024	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	
	Fecha inicio: 15-11-2024	Fecha de finalización: 31-12-2024
	Valor: \$ 3.557.094.768.00 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE) INCLUIDO EL IVA	
	Plazo de ejecución: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	

II. Descripción del proyecto

El proyecto tiene como objetivo el diseño, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño 2024 en Soacha - Cundinamarca. Este proyecto se llevará a cabo con la instalación del alumbrado navideño en los puntos o sectores más emblemáticos del municipio. Este proyecto se llevará a cabo con la instalación del alumbrado navideño en los puntos o sectores más emblemáticos del municipio de BT y MT, a su vez el alumbrado de las luminarias existentes correspondientes a cada centro de distribución para su energización.

III. Localización del proyecto

El proyecto se realiza en el casco urbano del municipio de Soacha Cundinamarca.



IV. Desarrollo y avance del programa de actividades.

A continuación, se presentan las evidencias de la ejecución de los sitios aprobados por Soacha, los cuales se relacionan a continuación donde se realizó el traslado, alistamiento e instalación del material navideño según los renders aprobados.


1. Sitios aprobados:

ALCALDIA
 CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22
 CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15
 CASA DE LA CULTURA
 COLISEO LEON XIII
 GLORIETA CIUDAD VERDE
 GLORIETA HOGARES SOACHA
 IGLESIA
 PARQUE CAMPESTRE
 PARQUE LA ARENOSA
 PARQUE TIBANICA
 PASEO DE SAN MATEO
 SALTO DEL TEQUENDAMA
 SAN CARLOS

SECRETARIA DE GOBIERNO
 SOACHA PLAZA PRINCIPAL
 SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO
 SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO
 SOACHA PUENTE 5 PEATONAL SAN HUMBERTO
 SOCHA PUENTE 3 CURVO EL DORADO
 SOACHA PUENTE 4 PEATONAL UNISUR

2. Etapa Ejecución:

Para dar cumplimiento a los cronogramas se inicia ejecución el día 15 de noviembre para entrega el 6 de diciembre como fecha de encendido, a continuación, se relaciona algún registro fotográfico el proceso de ejecución en los diferentes sitios ejecutados:

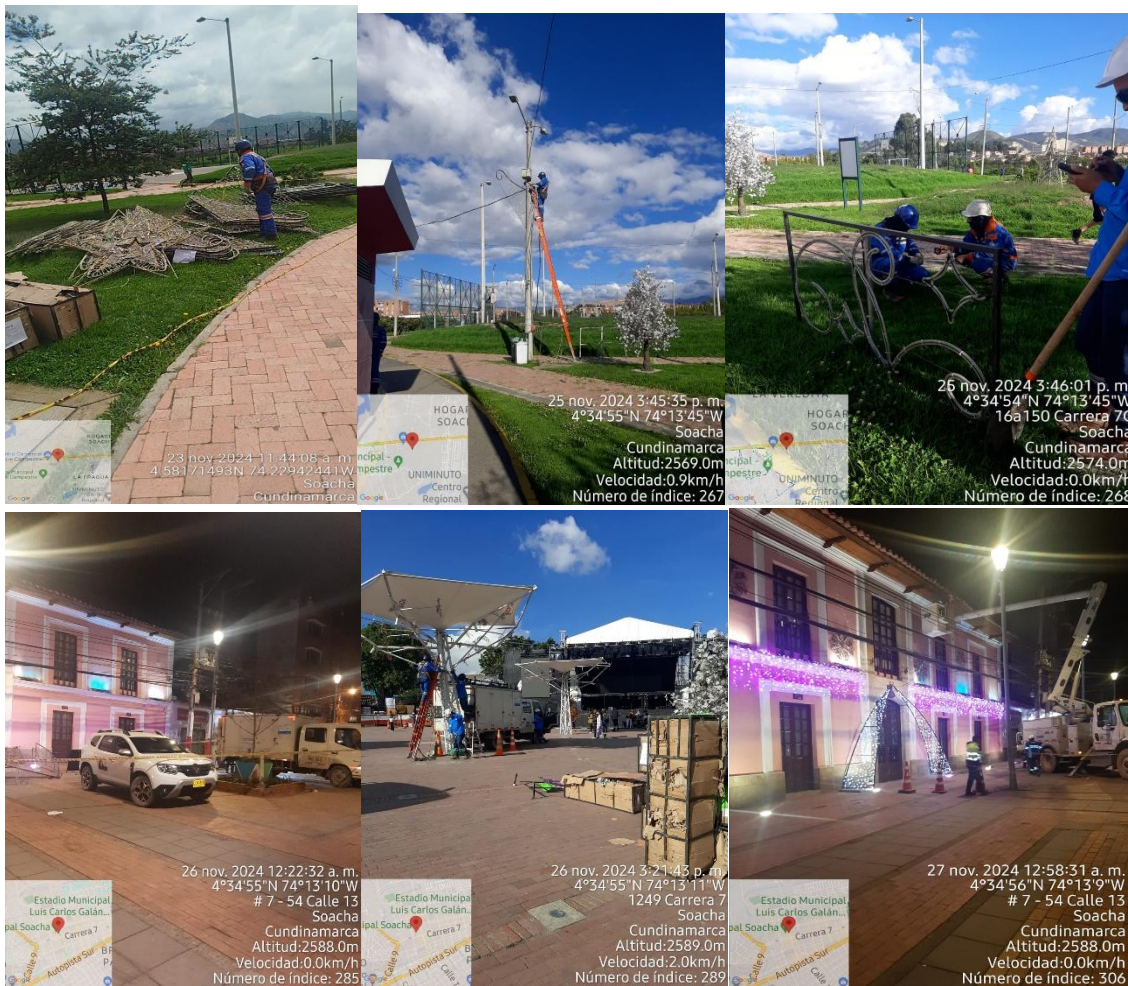






3. Proceso de Pruebas de Funcionamiento

Después de 20 días de ejecución para el día 5 de diciembre se contaba con un buen avance de ejecución donde se logró avanzar y finalizar la ejecución de 16 de los 21 sitios pactados previo al día de encendido, para lo cual se realizó recorrido en conjunto con personal de Epuxua entre ellos los supervisores del contrato Camilo Torres y Juan Pablo Hernandez entre otros, para la verificación del encendido y el cual se encontrara acorde a los render propuestos, este día se visitaron en conjunto los siguientes sitios, Parque Principal, carrera 7, las fachadas de Alcaldía, Iglesia, Secretaria de Gobierno y casa de la Cultura, Salto del Tequendama y Parque la Arenosa, a continuación se presentan algunas fotos de los sitios recorridos:

Parque Principal

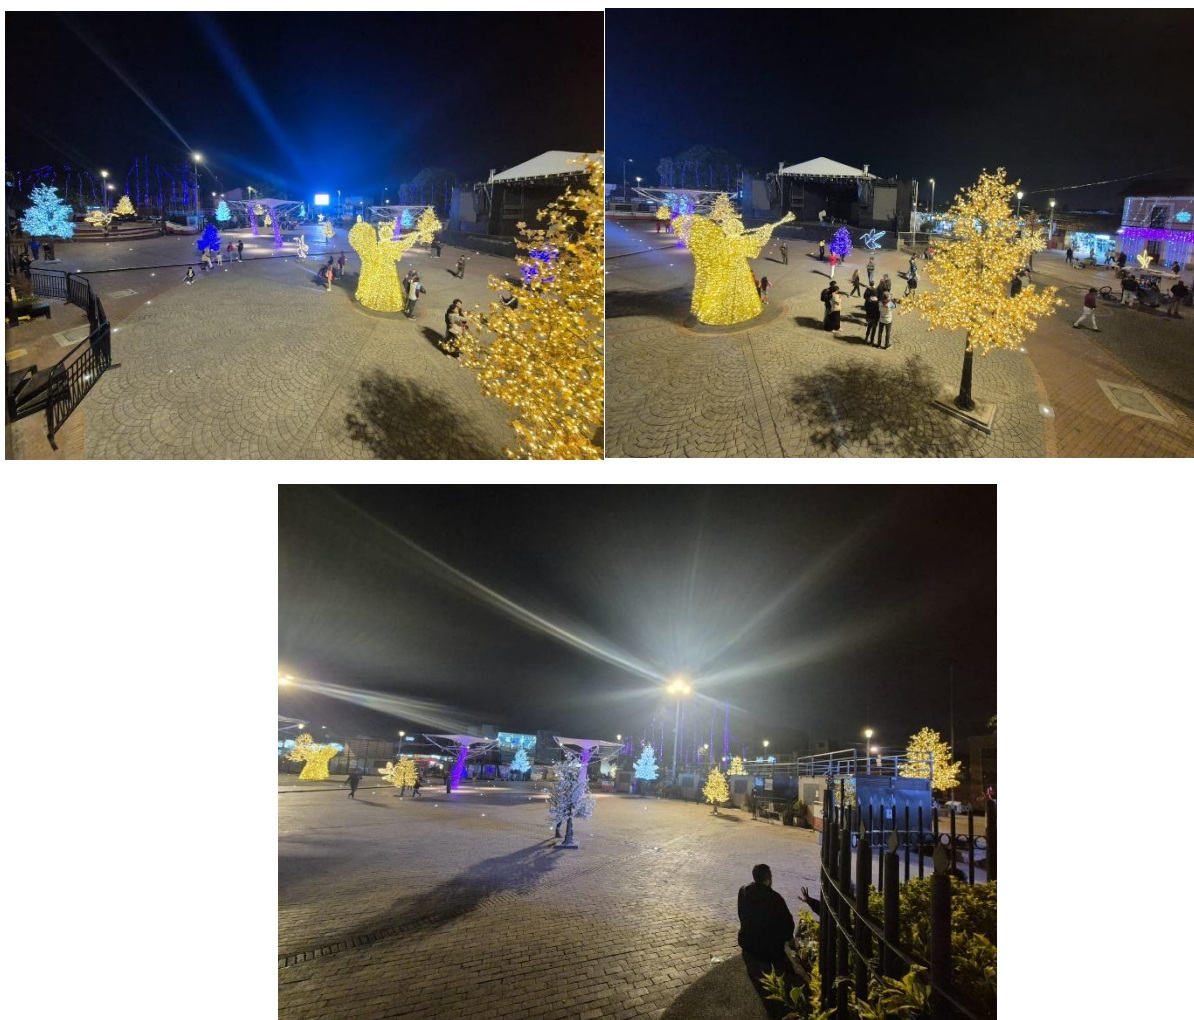


Fachada Alcaldía



Fachada Iglesia




Fachada Secretaria de Gobierno

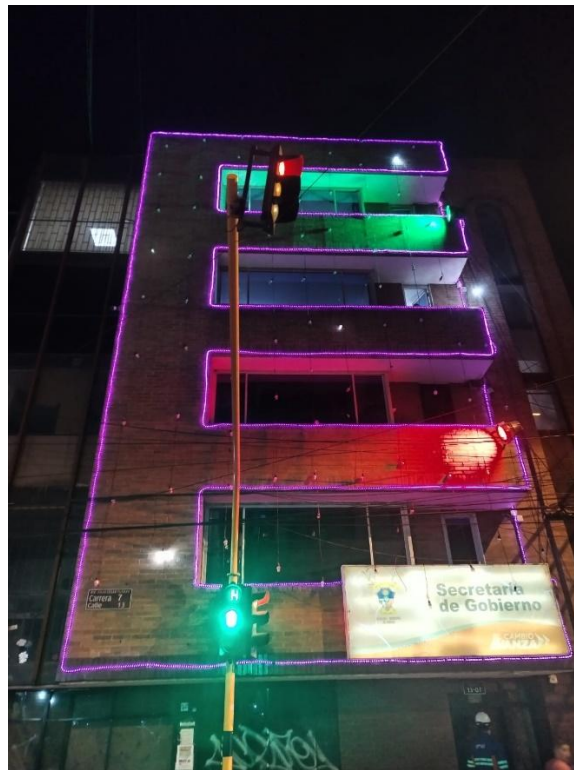

Fachada Casa de la Cultura



Carrera 7 entre Cll 13 y 22

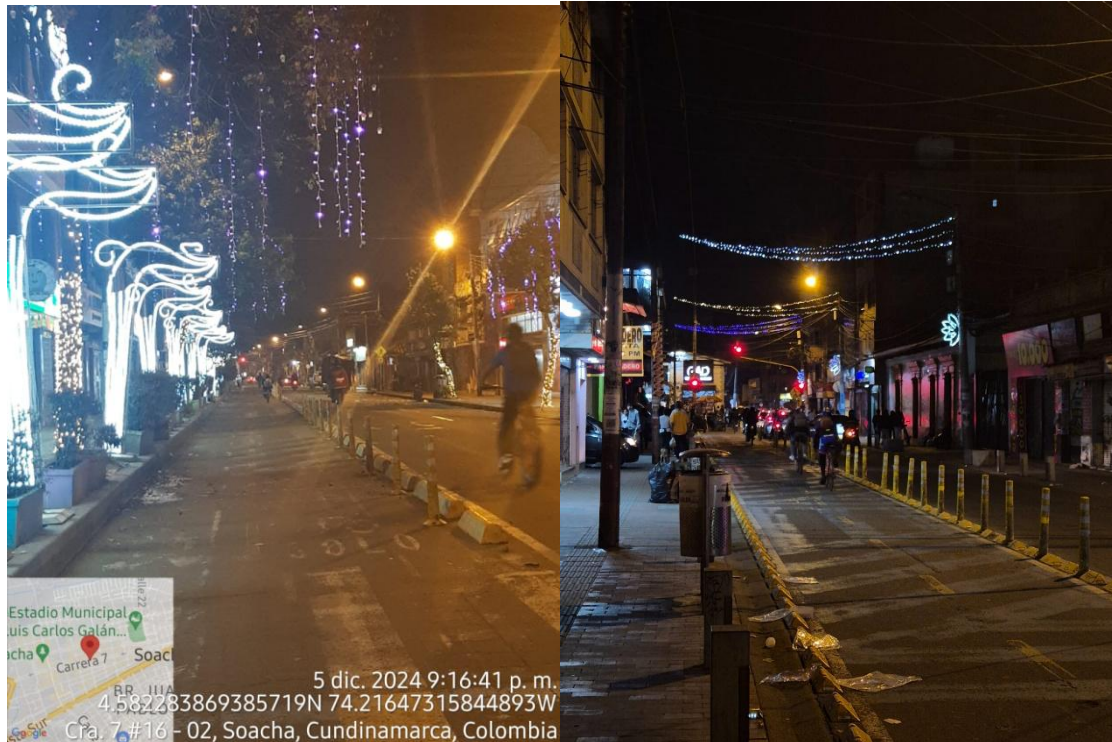

Salto del Tequendama:



Parque La Arenosa



Por parte de Enel, se realizó la verificación de los sitios restantes y que fueron encendidos el día 6 sin novedad los cuales fueron, Coliseo Leon de XIII, Parque Tibanica, Parque San Carlos, Paseo San Mateo, Parque Campestre, Glorieta Hogares de Soacha y Glorieta Ciudad Jardín

Coliseo Leon XIII



Parque Tibanica




Parque San Carlos



Paseo San Mateo



Parque Campestre

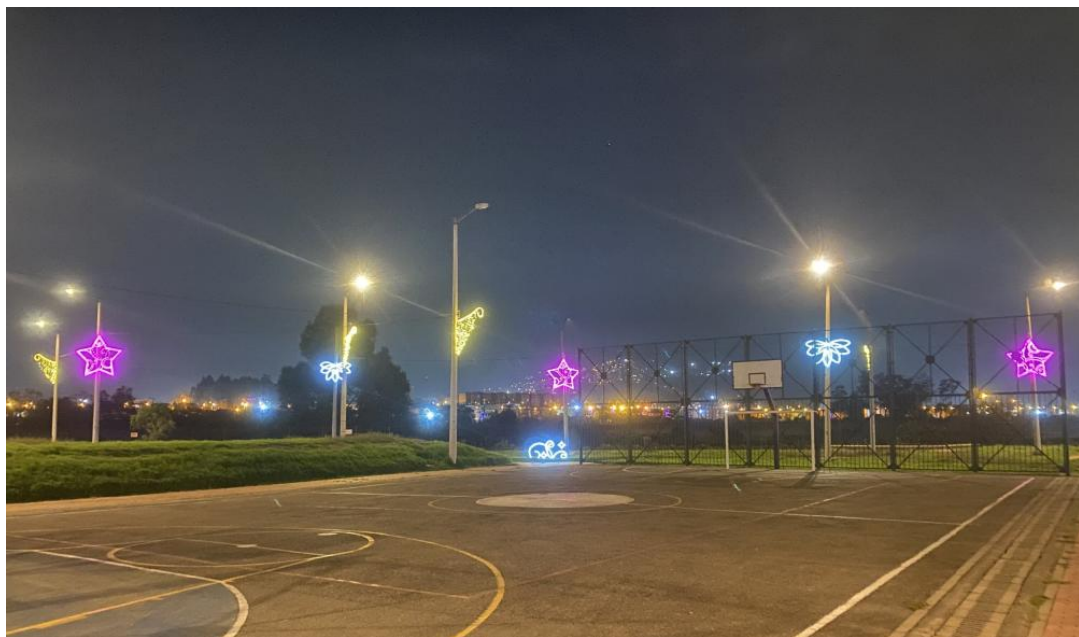

Glorieta Hogares de Soacha



Glorieta Ciudad Verde




De acuerdo a lo anterior se cumple con los sitios pactados en los cronogramas y con varios sitios de más que estaban para encendidos en días posteriores dejando solo para la semana del 9 la entrega y finalización de los 5 puentes, dejando claro que hubo un par de modificaciones, el cual no se ejecutó el puente de San Mateo que Cambio por puente San Humberto y no se ejecutó puente de calle 22 y cambio por puente de Unisur, a continuación, se dejan evidencias de los puentes iluminados

Puente San Humberto



Puente Ventura

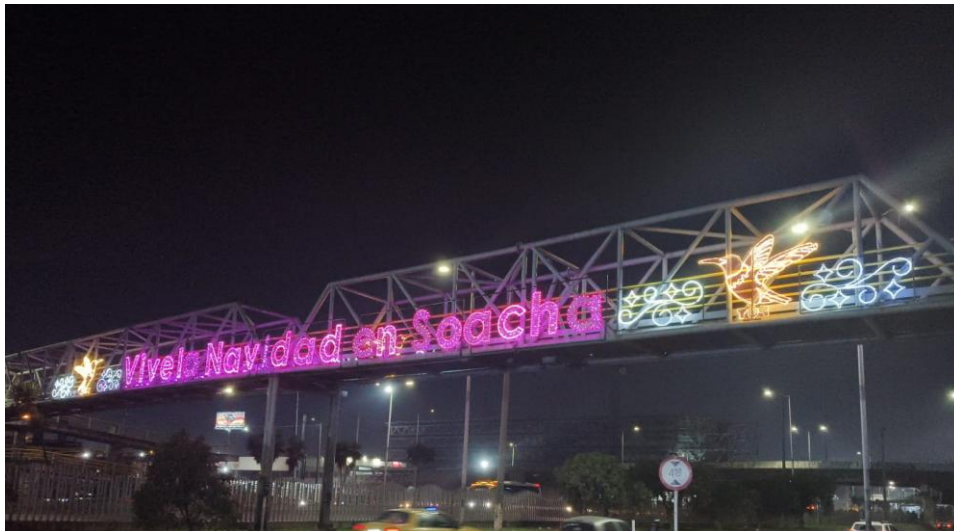

Puente Mercurio



Puente el Dorado



Puente Unisur



V. Problemas presentados y las soluciones planteadas.

Durante la gestión no se presentaron dificultades relevantes para la ejecución del proyecto.

VI. Actividades y gestiones.

En el siguiente cuadro se relacionan las cantidades contratadas y las cantidades finalmente instaladas, teniendo en cuenta que hubo sobrantes de material en Cra 7 y los Árboles de Hogares de Soacha y San Matero y que se reubico a otros sitios como fueron San Carlos, Tibanica, Campestre y la Arenosa:

SITIO	Descripción	Cantidad Contratada	Cantidad Instalada
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	MINI LED IND. C:P 20 EXTENSIONES POR PERGOLA	80	80
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	120	120
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	STROBER LED C: W E27 6W 15 STROBERS POR FOLLAJE DE ARBOL PARA 10 ARBOLES	150	150
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	150	150
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	MINI LED IND. C:P 15 MINI LEDS POR ARBOL, PARA 10 ARBOLES	150	150
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	3D ANGEL TROMPETA C: WW 2X4,5X2M 33W	1	1
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 2,8M 83W	5	5
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W	5	5
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 5M 350W	5	5
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ARBOL MAPLE LED 5 M BLAN LED BLAN	5	5
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	16	16
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	TAPA CONCRETO 1.3X0.8M CAJA INSPECCION	12	12

SOACHA PLAZA PRINCIPAL	2D COLIBRÍ C:WW 2.1X1.46M	6	6
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	6	6
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	2	2
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	2500	2500
ALCALDIA	MINI LED IND. BRILLO C:P CASCADAS CON CAIDA DE 1M Y DE 0.8M DONDE 1 EXTENSION CUBRE 0.80 ML	32	32
ALCALDIA	MINI LED IND. BRILLO C:P	2	4
ALCALDIA	MINI LED IND. C:W	6	91
ALCALDIA	STROBER LED C:W E27 6W	40	46
ALCALDIA	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	40	46
ALCALDIA	2D COPITO C:W 1M 17W	4	4
ALCALDIA	2D SEMIARCO TRIANGULO C:W 5X1M	2	2
ALCALDIA	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	2	2
ALCALDIA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	0	1
ALCALDIA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	600	600
CASA DE LA CULTURA	MINI LED brillos IND. C:P	24	24
CASA DE LA CULTURA	ROPE LED C:W 21 A 50 M	220	220
CASA DE LA CULTURA	STROBER LED C:W E27 6W	150	150
CASA DE LA CULTURA	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	150	150
CASA DE LA CULTURA	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5	4	4

CASA DE LA CULTURA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	0	1
CASA DE LA CULTURA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	600	600
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	MINI LED IND. C:WW PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	18	18
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	MINI LED IND. BRILLO C:P PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	18	18
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	MINI LED IND. C:W PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	18	18
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	2D HOJA PETALOS C:W 0,6X1,2M UBICADOS EN 8 POSTES	9	9
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	6	6
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1200	1200
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	STROBER LED C:W E27 6W 10 STROBERS POR ARBOL PARA 49 ARBOLES	490	230
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	490	230
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	MINI LED IND. BRILLO C:P 9 EXTENSIONES POR ARBOL	441	110
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	MINI LED IND. C:WW 5 MINI LEDS POR ARBOL	245	127
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA PARA ARBOLES	294	294
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W 8 POR CUADRA	64	64

CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	1798	1798
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	1274	1274
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	64	64
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	16	16
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	6	6
CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	3500	3500
IGLESIA	2D COPO DIAMANTES C:W 1,5M 21W	3	3
IGLESIA	STROBER LED C:W E27 6W	30	30
IGLESIA	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	30	30
IGLESIA	ROPE LED C:W 21 A 50 M	18	18
IGLESIA	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W FIJADOS EN COLOR FUCSIA	1	1
IGLESIA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	2
IGLESIA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
PARQUE LA ARENOSA	2D FILIGRANA 3 HONDAS C:WW 1,6M	15	15
PARQUE LA ARENOSA	2D RENO TIPO 1 C:W 2,5X1,5M 16W	3	3
PARQUE LA ARENOSA	2D Reno Tipo 3 Blanco 2,5x0,80m 110V 1	3	3
PARQUE LA ARENOSA	2D ESTRELLA 5 PUNTAS C:W 1,1X1,1M	5	5
PARQUE LA ARENOSA	2D MARCO LUZ ALTO C:W 3,7X2M	1	1

PARQUE LA ARENOSA	2D BASTON C:R 1,5X1M 8W	15	15
PARQUE LA ARENOSA	MINI LED IND. C:W	0	215
PARQUE LA ARENOSA	MINI LED IND. C:WW	0	215
PARQUE LA ARENOSA	2D ARCO MOSAICO C:B 3,11X3,33M	12	12
PARQUE LA ARENOSA	ROPE LED C:P PARA 2D ARCO MOSAICO C:B 3,11X3,33M	960	960
PARQUE LA ARENOSA	2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	2	2
PARQUE LA ARENOSA	ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA BASTON DE DULCE BLANCO ROJO 0,7x1,5x m 1 DOBLE RECORRIDO	92	92
PARQUE LA ARENOSA	MINI LED IND. BRILLO C:P ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	16	16
PARQUE LA ARENOSA	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT ROSADO PARA 2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	10	10
PARQUE LA ARENOSA	2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	2	2
PARQUE LA ARENOSA	ROPE LED C:W < 20 M PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M DOBLE RECORRIDO	148	148
PARQUE LA ARENOSA	MINI LED IND. BRILLO C:P PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	32	32
PARQUE LA ARENOSA	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT ROSADO PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	18	18
PARQUE LA ARENOSA	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	2	2
PARQUE LA ARENOSA	2D SEMIARCO DREAM C:W 4,57M 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	2	2
PARQUE LA ARENOSA	ROPE LED C:P 21 A 50 M PARA 2D SEMIARCO DREAM C:W 4,57M	232	232
PARQUE LA ARENOSA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	2	2

PARQUE LA ARENOSA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	2800	2800
SAN CARLOS	2D COPITO C:W 1M 17W	15	15
SAN CARLOS	TUBO REDONDO 2" 4M DIVIDIDO EN 2	10	10
SAN CARLOS	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	6	6
SAN CARLOS	2D ESTRELLA 5 PUNTAS C:W 1,1X1,1M	6	6
SAN CARLOS	2D COPITO C:W 1M 17W	6	6
SAN CARLOS	TUBO DE 2 PLGX3M GALVANIZADO	18	18
SAN CARLOS	MINI LED C:WW	0	32
SAN CARLOS	2D MODULO OLAS C:BCK 2X2M CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	28	28
SAN CARLOS	MINI LED IND. BRILLO C:P 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	50	50
SAN CARLOS	MINI LED IND. C:WW5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	45	45
SAN CARLOS	MINI LED IND. C:W 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	45	45
SAN CARLOS	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	12	12
SAN CARLOS	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	288	288
SAN CARLOS	ROPE LED C:P > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	288	288
SAN CARLOS	2D ESTRELLA C:W 0,5M 6 ESTRELLAS POR COSTADO DE CANCHA, PARA 2 CANCHAS UN TOTAL DE 4 COSTADOS	24	24
SAN CARLOS	2D ESTRELLA C:W 0,25M 10 ESTRELLAS POR COSTADO DE CANCHA, PARA 2 CANCHAS UN TOTAL DE 4 COSTADOS	40	40
SAN CARLOS	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	2	2

SAN CARLOS	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1900	1900
SALTO DEL TEQUENDAMA	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	16	16
SALTO DEL TEQUENDAMA	ROPE LED C:P 21 A 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W PARA 8 ARCOS	384	384
SALTO DEL TEQUENDAMA	ROPE LED C:W 21 A 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W PARA 8 ARCOS	384	384
SALTO DEL TEQUENDAMA	2D RENO TIPO 4 C:W 5X3,5M 102W	2	2
SALTO DEL TEQUENDAMA	2D RENO TIPO 6 C:W 5X2M 65W	1	1
SALTO DEL TEQUENDAMA	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	19	19
SALTO DEL TEQUENDAMA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SALTO DEL TEQUENDAMA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	700	700
PARQUE CAMPESTRE	2D ARPA C:WW 2X0,86M 33W 10 ELEMENTOS POR CUADRA	30	30
PARQUE CAMPESTRE	2D HOJA PETALO C:W 2,2X1,3M 19W 3 ELEMENTOS POR CUADRA	9	9
PARQUE CAMPESTRE	2D ESTTELLA ARABESCO C:G 1,9X1,9M 3 ELEMENTOS POR CUADRA	9	9
PARQUE CAMPESTRE	ROPE LED C:P > 50 M PARA 2D ESTTELLA ARABESCO C:G 1,9X1,9M	396	396
PARQUE CAMPESTRE	2D ARABESCO TIPO 1 C:W 2X1M 15W 5 ELEMENTOS POR CUADRA	15	15
PARQUE CAMPESTRE	ESTRELLA CON DESFASE DORADA BLANCO CÁLID 1 ELEMENTOS POR CUADRA	3	3
PARQUE CAMPESTRE	2D PESEBRE C:W 4X4M 250W UBICADO EN LA CUADRA CENTRAL DEL PARQUE	1	1
PARQUE CAMPESTRE	MINI LED IND. C:W	0	152

PARQUE CAMPESTRE	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W 2 POR CUADRA	3	3
PARQUE CAMPESTRE	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W 2 POR CUADRA	3	3
PARQUE CAMPESTRE	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	7	7
PARQUE CAMPESTRE	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	3	3
PARQUE CAMPESTRE	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	2800	2800
SECRETARIA DE GOBIERNO	STROBER LED C:W E27 6W	100	100
SECRETARIA DE GOBIERNO	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	100	100
SECRETARIA DE GOBIERNO	ROPE LED BRILLO C:P > 50 M	337	337
SECRETARIA DE GOBIERNO	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W	2	2
SECRETARIA DE GOBIERNO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SECRETARIA DE GOBIERNO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	980	980
PARQUE TIBANICA	2D COLCHA RETAZOS C:M 0,25M	15	15
PARQUE TIBANICA	ROPE LED C:P 21 A 50 M PARA COLCHA	89	89
PARQUE TIBANICA	MINI LED IND. BRILLO C:P 3 MINI LEDS POR COLCHA	45	45
PARQUE TIBANICA	2D COLCHA RETAZOS C:B 0,6M	15	15
PARQUE TIBANICA	ROPE LED C:W 21 A 50 M	90	90
PARQUE TIBANICA	MINI LED IND. C:W 3 MINI LEDS POR COLCHA	45	45

PARQUE TIBANICA	3D ARBOL MODULO C:W	8	8
PARQUE TIBANICA	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	38	38
PARQUE TIBANICA	MINI LED IND. C:W	0	110
PARQUE TIBANICA	MINI LED IND. C:WW	0	30
PARQUE TIBANICA	ARBOL MAPLE LED 5 M BLAN LED BLAN	1	1
PARQUE TIBANICA	TAPA CONCRETO 1.3X0.8M CAJA INSPECCION	1	1
PARQUE TIBANICA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
PARQUE TIBANICA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1400	1400
PASEO DE SAN MATEO	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	4	4
PASEO DE SAN MATEO	EST. ÁRBOL ANILLOS MARCA 12M	1	1
PASEO DE SAN MATEO	3D ESTRELLA VOLUMÉTRICA CON NUC C:W 3M	1	1
PASEO DE SAN MATEO	ROPE LED C:P > 50 M	411	411
PASEO DE SAN MATEO	MINI LED IND. C:W	350	88
PASEO DE SAN MATEO	MINI LED IND. C:WW	150	97
PASEO DE SAN MATEO	MINI LED IND. C:P	0	78
PASEO DE SAN MATEO	STROBER LED C:W E27 6W	0	140
PASEO DE SAN MATEO	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	0	160
PASEO DE SAN MATEO	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL ARBOL HASTA UNA ALTURA DE 3 M	38	38

PASEO DE SAN MATEO	ROPE LED C:P 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	192	192
PASEO DE SAN MATEO	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W	2	2
PASEO DE SAN MATEO	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W	2	2
PASEO DE SAN MATEO	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	42	42
PASEO DE SAN MATEO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
PASEO DE SAN MATEO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1800	1800
COLISEO LEON XIII	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 2,8M 83W	2	2
COLISEO LEON XIII	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	5	5
COLISEO LEON XIII	2D PESEBRE C:W 4X4M 250W	1	1
COLISEO LEON XIII	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W 4 PROYECTORES FIJADOS EN COLOR MAGENTA (ROSADO)	4	4
COLISEO LEON XIII	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W 2 PROYECTORES FIJADOS EN COLOR BLANCO	2	2
COLISEO LEON XIII	MINI LED SILICON C:W	6	14
COLISEO LEON XIII	MINI LED SILICON C:W	0	6
COLISEO LEON XIII	2D RENO TIPO 1 C:W 2,5X1,5M 16W	2	2
COLISEO LEON XIII	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
COLISEO LEON XIII	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1200	1200
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Jose pesebre vol C:n/a 4,5 m F	1	1

GLORIETA CIUDAD VERDE	MINI LED IND. C:WW	49	49
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Maria 4,5m	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	MINI LED IND. C:WW	49	49
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Niño Jesus 1,9m	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	MINI LED IND. C:WW	11	11
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D ANGEL 4.5M	3	3
GLORIETA CIUDAD VERDE	MINI LED IND. C:WW 50 EXTENSIONES POR CADA ANGEL	150	150
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Accesorios rey mago 1 Negro	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Accesorios rey mago 2 Negro	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D Accesorios rey mago 3 Negro	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W	3	3
GLORIETA CIUDAD VERDE	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	3	3
GLORIETA CIUDAD VERDE	2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	4	4
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	80	80
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA ROSADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	20	20
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA DORADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	12	12
GLORIETA CIUDAD VERDE	2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	4	4
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	80	80

GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA ROSADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	20	20
GLORIETA CIUDAD VERDE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA DORADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	60	60
GLORIETA CIUDAD VERDE	3D RENO 1,2X2,5M 27W	4	4
GLORIETA CIUDAD VERDE	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
GLORIETA CIUDAD VERDE	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1300	1300
GLORIETA HOGARES SOACHA	EST. ÁRBOL ANILLOS MARCA 12M	1	1
GLORIETA HOGARES SOACHA	3D ESTRELLA VOLUMÉTRICA CON NUC C:W 3M	1	1
GLORIETA HOGARES SOACHA	ROPE LED C:WW > 50 M	411	411
GLORIETA HOGARES SOACHA	MINI LED IND. C:W	350	111
GLORIETA HOGARES SOACHA	MINI LED IND. C:WW	150	15
GLORIETA HOGARES SOACHA	MINI LED IND. C:P	0	225
GLORIETA HOGARES SOACHA	STROBER LED C:W E27 6W	0	140
GLORIETA HOGARES SOACHA	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	0	160
GLORIETA HOGARES SOACHA	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL ARBOL HASTA UNA ALTURA DE 3 M	38	38

GLORIETA HOGARES SOACHA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
GLORIETA HOGARES SOACHA	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ELEMENTO 2D VIVE LA NAVIDAD EN SOACHA DE 32M	2	2
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ROPE LED C:P > 50 M < 20 M REMANUFACTURA PARA 2D FELICIDAD C:W 1,52X2,9M	460	460
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LETRERO FELIZ NAVIDAD TE DESEA SOACHA C:P C:W 14X1,2M	56	56
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	2D COLIBRÍ C:WW 2.1X1.46M	4	4
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	2D ARABESCO TIPO 3 C:W 2X1M 15W J	8	8
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	160	160
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA	2	2


SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ROPE LED C:P > 50 M < 20 M REMANUFACTURA PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	480	480
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	50	50
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5	4	4
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	MINI LED IND. BRILLO C:P	48	48
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	160	160
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	2D REGALO PEQUEÑO C:R 1,66X1,6M 25W	4	4
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	MINI LED IND. BRILLO C:P	60	60
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	160	160
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SOACHA PUENTE 3 VEHICULAR SAN MATEO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	2D HOJA PETALOS C:W 0,6X1,2M	8	8

SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	MINI LED IND. BRILLO C:P	100	100
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	MINI LED IND. C:WW	64	64
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	MINI LED IND. C:W	64	64
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	2D ESTRELLA ARABESCO C:M 1,9X1,9M TODOS LOS ELEMENTOS EN POSTES VAN DISTRIBUIDOS EN UN RECORRIDO LINEAL DE 6.500 ML APROX. COMO CADA 160 M APROX.	4	4
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ELEMENTO 2D SOACHA COMPARTE LA NAVIDAD	2	2
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ROPE LED C:P > 50 M REMANUFACTURA PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	420	420
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	60	60
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	160	160
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	1
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	500

Se anexa cuadro en Excel con el detalle de cantidades y costos.

VII. Entrega de Proyectos y conteo de materiales

Por último se realizó el pasado 13 de Diciembre visita en conjunto con la persona designada por Epuxua, para realizar conteo de materiales en sitio de las cantidades contratadas vs las instaladas de 10 de los 21 sitios, encontrando en términos general las cantidades acordes, excepto con unas pequeñas observaciones de movimientos adicionales solicitados, o pendientes como los del parque que se ejecutaran una vez desmonten la tarima, también estaba pendiente la instalación de 12 cajas de publicidad que se ejecutarían el fin de semana y la instalación de las miniled que fueron reubicadas de sitio, puntualmente del parque campestre. A continuación, se muestran las notas del acta de recorrido realizada este día

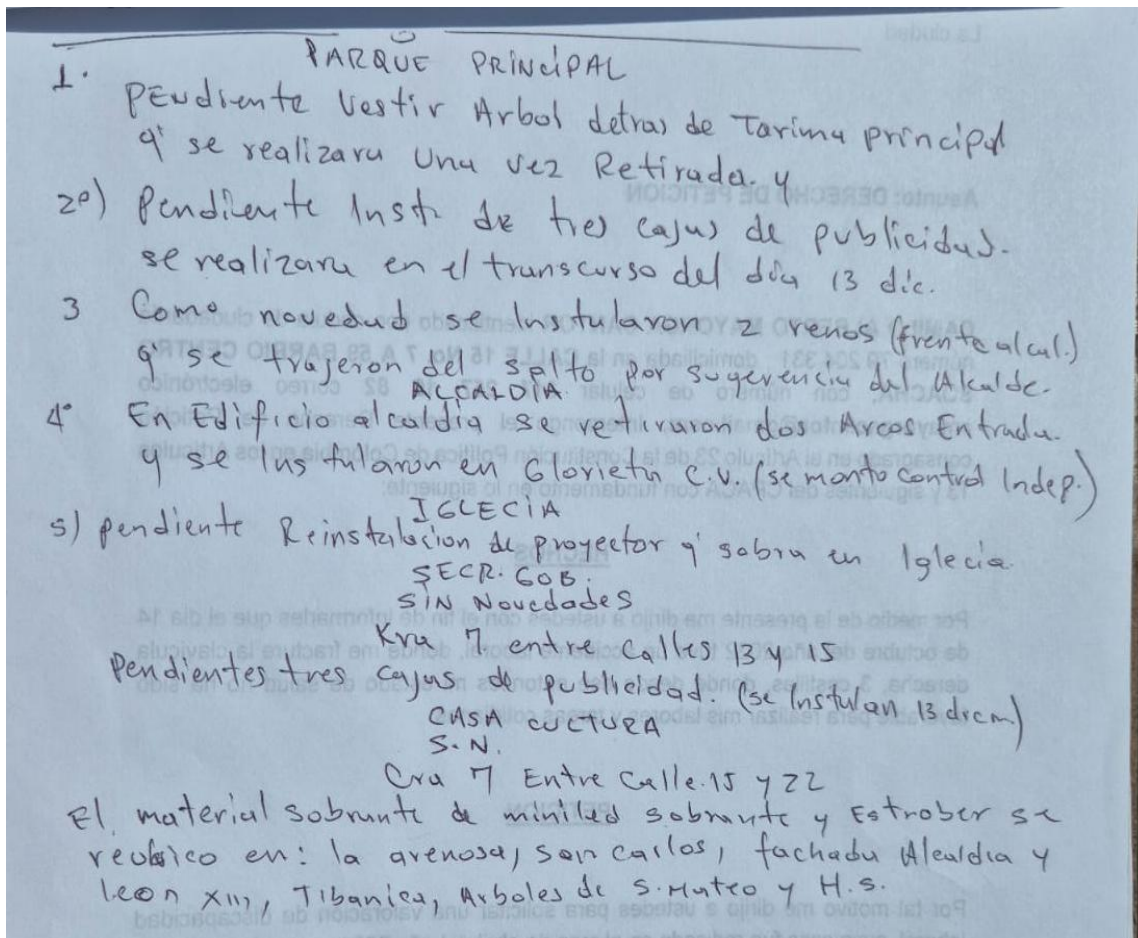

VIII. Personal involucrado y novedades

El recurso utilizado para la ejecución del proyecto cumplió con lo definido del contrato y en las condiciones indicadas a continuación, se relaciona el personal dispuesto para la ejecución del proyecto, con la relación de vehículos y se anexan los pagos de los parafiscales respectivos

CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	# MOVIL	VEHICULO	TURNO	TIPO
79974666	GARCES VARGAS GUSTAVO WILSON	Líder	M51	WLT691	TURNO A	LIVIANO
7723182	ROJAS SERRANO DIEGO ANDRES	Operario				
1030570278	JHEISON FERNANDO CASTILLO PARDO	Líder	M130	GKV789	TURNO A	CANASTA
79831641	FREDY ALFONSO CASTRO CASTILLO	Operario				
80145451	OTALORA PORRAS JIMMY ANGEL	Líder	M30	WNS597	TURNO C	LIVIANO
1122119344	CHRISTIAN CAMILO CUINTACO BARBOSA	Operario				
1096188104	GABRIEL ARBOLEDA PINZON	Líder	M55	GKV789	TURNO C	CANASTA
1090392595	JOSE FERNANDO CIFUENTEZ PEREZ	Operario				
79245662	FREDY QUIJANO	Líder	M35	WCU301	TURNO C	LIVIANO

IX. Anexos

- Parafiscales
- Cuadro Excel cantidades y precios
